

Ver Res. N° 671/80
- - - 1128/81

RESOLUCION N° 1097 /79.

REF. N° 9 del EXPTE. N° 5006/64
-SUPERINTENDENCIA-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1979.-

Visto el presente expediente N° // // //
263.332/79 y su agregado N° 266.875/79 del registro de
la Subsecretaría de Administración, por los que se tra
mita la construcción de los Tribunales Federales de San
tiago del Estero; y

Considerando:

Que por Resolución N° 901/75 se adju
dicó a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Cons
tructora S.C." la construcción de que se trata, con un /
plazo de ejecución de treinta y seis meses -iniciado el
5 de octubre de 1976- y fecha de terminación el 5 de oc
tubre de 1979.

Que mediante Resolución N° 83/78 fue
aprobada el acta suscripta por representantes del Servi
cio Nacional de Arquitectura y de la empresa contratista,
mediante la cual se fijó como fecha de iniciación de las
obras el 1º de junio de 1977, reduciéndose el plazo con
tractual de ejecución de los trabajos a treinta y cuatro
(34) meses y fijándose en consecuencia como fecha de ter
minación el 31 de marzo de 1980.-

Que, posteriormente, fue aprobado el
plan de trabajo presentado por la firma de referencia
(Resolución N° 240 bis/78).-

Que por Resolución N° 1006/78 se acor
////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
dó a la firma contratista una prórroga de 150 días corri-
dos para la terminación de las obras quedando como nueva
fecha de finalización de las mismas el 28 de agosto de
1980 (art. 2º de la citada Resolución), aprobándose (art.
3º) el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones pre-
sentados en la oportunidad.-

Que por las presentes actuaciones, el Ser-
vicio Nacional de Arquitectura solicita una nueva prórro-
ga por 167 días corridos y la aprobación del nuevo plan
de trabajo y curva de inversiones concordante con el pla-
zo de ejecución de la obra, señalando a fs. 1/2 las cau-
sas que originan tal requerimiento.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
por la Subsecretaría de Administración a fs. 24 y por el
Departamento de Arquitectura a fs. 26,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo plan de trabajo y cur-
va de inversiones presentados por la firma "Hugo y Juan
Carlos Enrico, Empresa Constructora S.C.", contratista de
la obra de referencia.-

2º) Acordar a la citada empresa una prórro-
ga del plazo contractual de ciento sesenta y siete (167)
días corridos, fijándose como nueva fecha de terminación
de los trabajos de que tratan estas actuaciones, el día

////////////////////////////////////

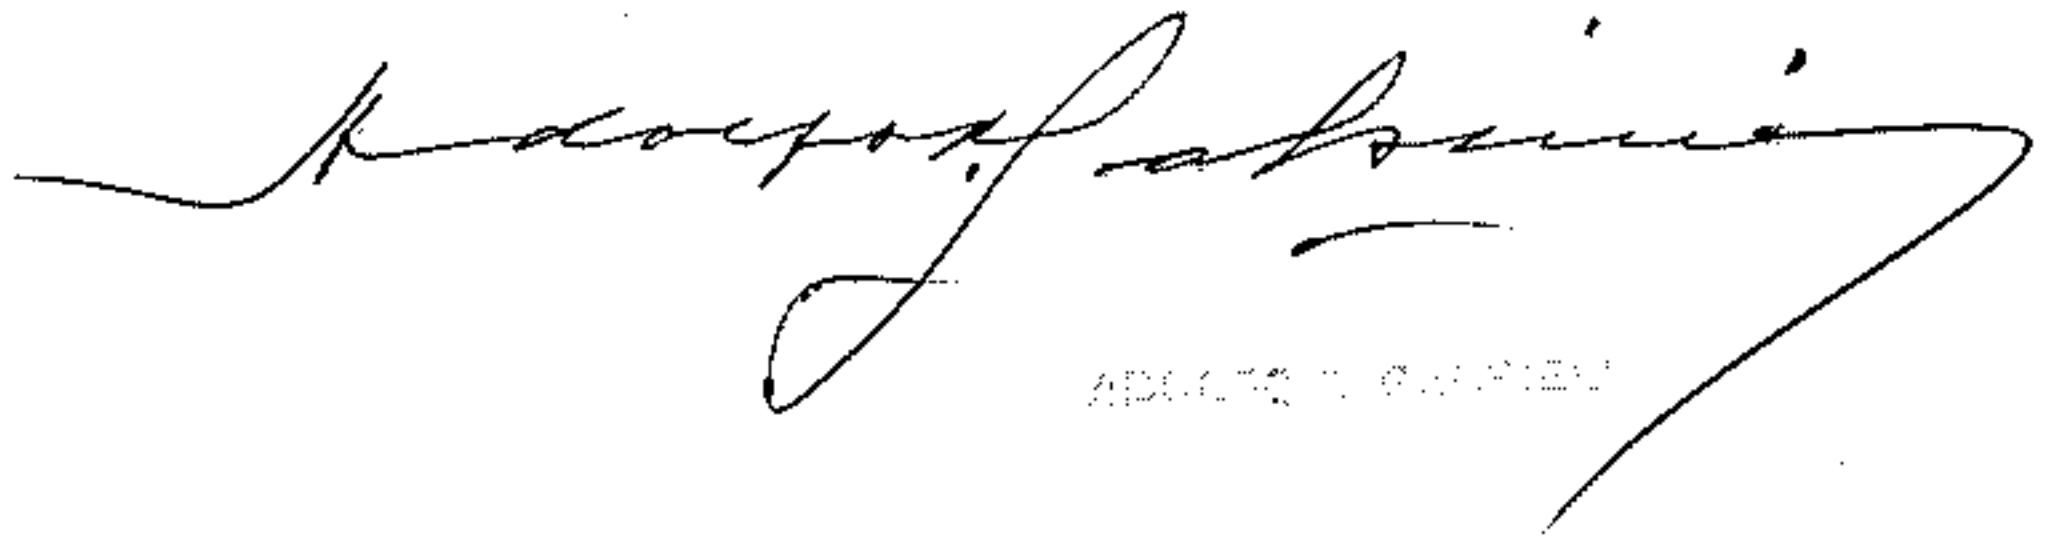
REF. Nº 9 del EXPTE. Nº 5006/64
-SUPERINTENDENCIA-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

////////////////////////////////////

11 de febrero de 1981.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-


ADOLFO S. GAGLIARDI
