



*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1997.

Visto y considerando que la firma Unisys Sudamericana S.A., adjudicataria de la Licitación n° 1/97, ha presentado con fecha 26 de diciembre ppdo. el cronograma detallado de las tareas del proyecto de informatización contratado, con las modificaciones sugeridas por la Dirección de Informática; y teniendo en cuenta lo informado por esta dependencia el día 29 del mismo mes;

SE RESUELVE:

Aprobar el cronograma precedentemente señalado, el cual integra como Anexo I la presente resolución, aclarándose que a las fechas que se indican para la entrega de los sistemas a migrar, por parte de la Dirección de Informática, se sumarán los días que mediaron hasta su presentación definitiva por la co-contratante, y que las tareas de actualización de sistemas son comunes a ambas partes.

Regístrese y notifíquese a la firma Unisys Sudamericana S.A.-

*[Firma manuscrita]*

EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR  
VICE-PRESIDENTE DE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION


W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

**NISYS**

Unisys  
Sudamericana S.A.  
Maipú 267  
1084 Buenos Aires  
Argentina

Teléfonos  
326-4021  
326-5641  
Fax: Interno 604  
<http://www.unisys.com>

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Corte Suprema de Justicia de la Nación	128d	19/12/97	17/07/98
2	Etapas I - Definición y Planificación	12d	19/12/97	04/02/98
3	Entrega Versión inicial Plan, Sub-planes y Cronogramas	1d	22/12/97	22/12/97
4	Revisión PAP, Sub-Planes y Cronogramas	5d	23/12/97	29/12/97
5	Conformidad PAP, Sub-planes y Cronogramas	0d	29/12/97	29/12/97
6	Finalización PAP, Sub-planes y Cronogramas	8d	19/12/97	30/12/97
7	Entrega de Plan, Sub-planes definitivos	2d	31/12/97	02/02/98
8	Aceptación de Plane y Sub-planes	2d	03/02/98	04/02/98
9	Etapas II - Desarrollo de las actividades	129d	19/12/97	17/07/98
10	Instalación	116d	19/12/97	30/06/98
546	Solución Documental	102d	19/12/97	10/06/98
767	Migración	116.5d	19/12/97	30/06/98
862	Capacitación	128d	22/12/97	17/07/98
1130	Etapas III - Puesta en Marcha	18d	24/06/98	17/07/98
1131	Final. de la impi. de los sist. migrados	4d	24/06/98	29/06/98
1132	Final. de la implant. del sist. doc.	4d	24/06/98	29/06/98
1133	Coordinación adm. y técnica interna	4d	30/06/98	03/07/98
1134	Migración de Datos Aplicativos	4d	30/06/98	03/07/98
1136	Actualización Datos Documentales	4d	30/06/98	03/07/98
1136	Arranque Operativo	5d	06/07/98	10/07/98
1137	Aceptación definitiva del sistema	5d	13/07/98	17/07/98

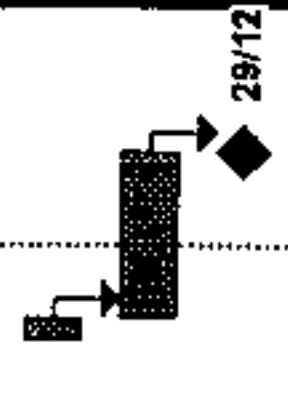


**NISYS**

Unisys  
Sudamericana S.A.  
Maipú 267  
1084 Buenos Aires  
Argentina

Teléfonos  
326-4021  
326-5641  
Fax: Interno 604  
<http://www.unisys.com>

W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32

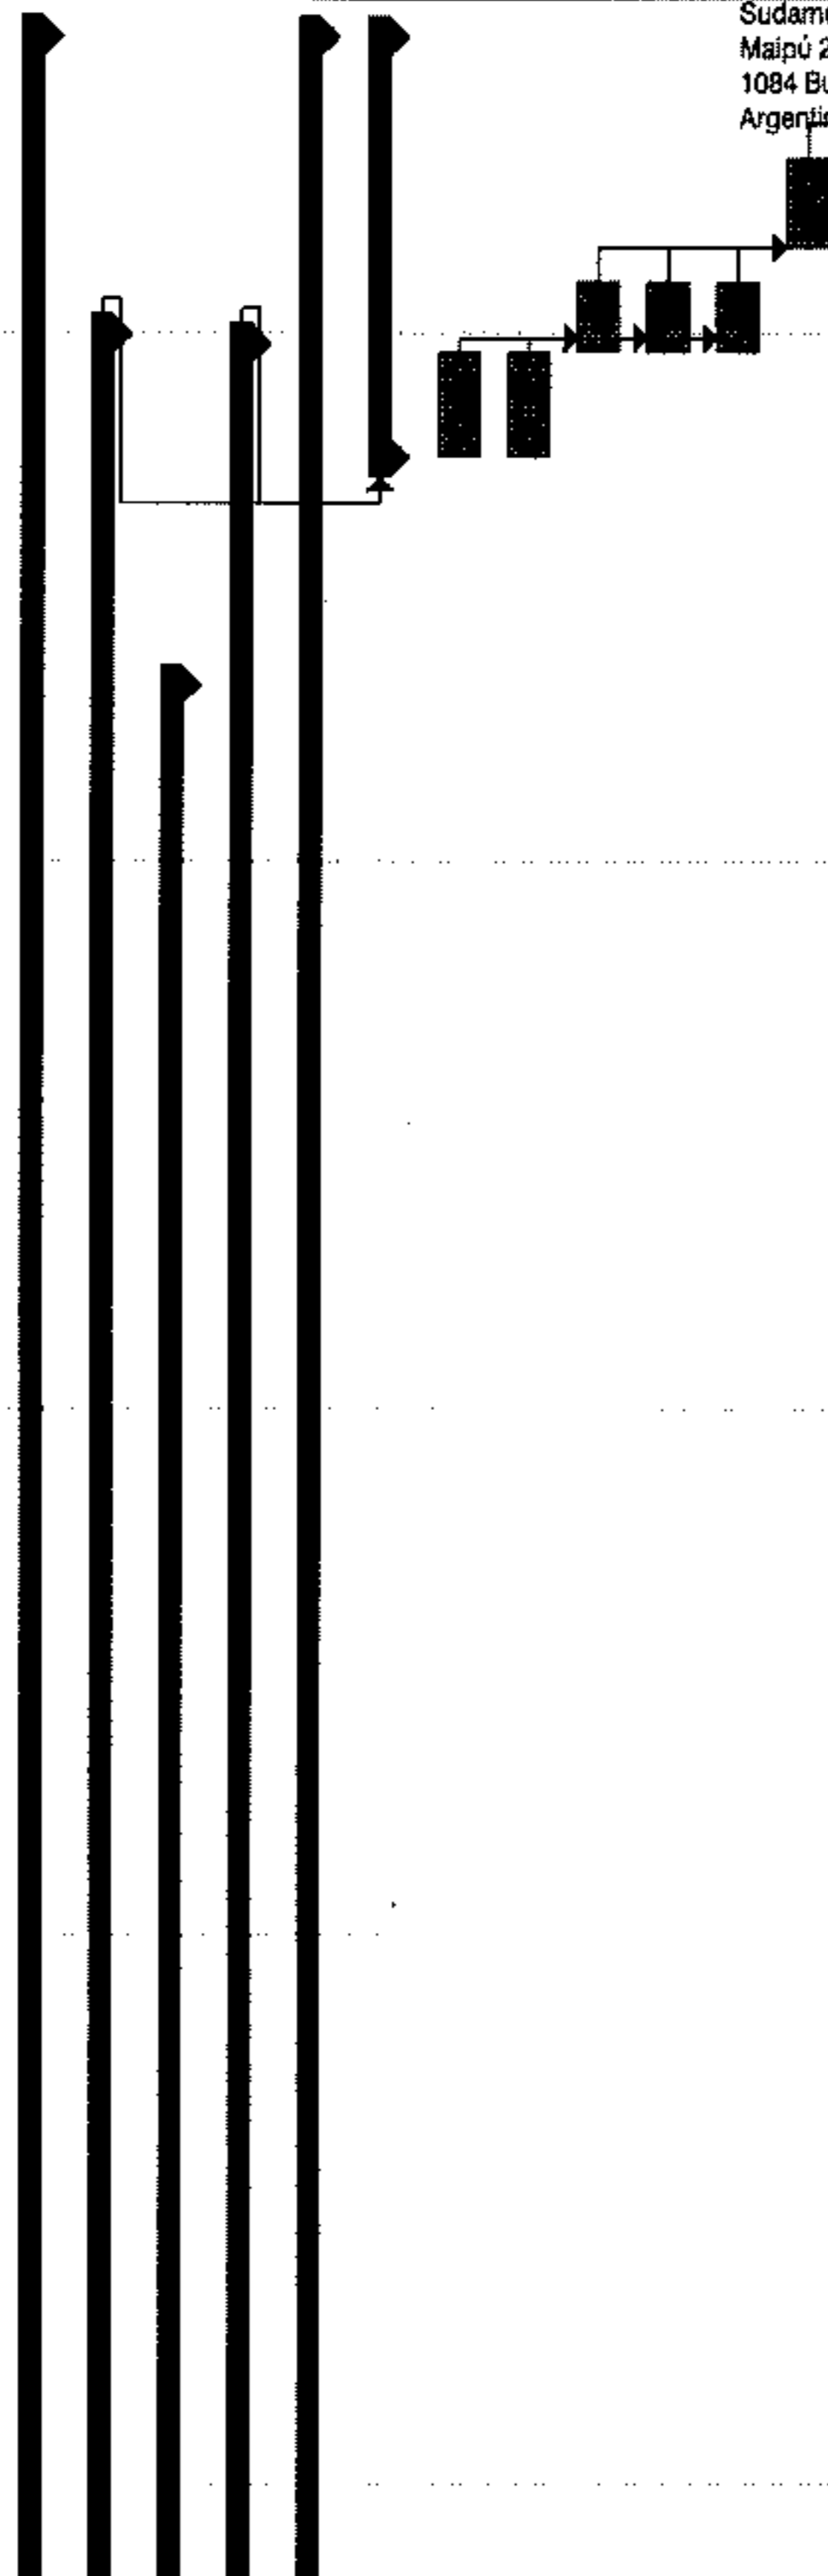


Project: Date: 26/12/97	Task	Summary	Rolled Up Progress
	Task	Summary	Rolled Up Progress
	Progress	Rolled Up Task	
	Milestone	Rolled Up Milestone	



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Corte Suprema de Justicia de la Nación	129d	19/12/97	17/07/98
2	Etapla I - Definición y Planificación	12d	19/12/97	04/02/98
3	Entrega Versión Inicial Plan, Sub-planes y Cronogram	1d	22/12/97	22/12/97
4	Revisión PAP, Sub-Planes y Cronogramas	5d	23/12/97	29/12/97
5	Conformidad PAP, Sub-planes y Cronogramas	0d	29/12/97	29/12/97
6	Finalización PAP, Sub-planes y Cronogramas	8d	19/12/97	30/12/97
7	Entrega de Plan, Sub-planes definitivos	2d	31/12/97	02/02/98
8	Aceptación de Plane y Sub-planes	2d	03/02/98	04/02/98
9	Etapla II - Desarrollo de las actividades	129d	19/12/97	17/07/98
10	Instalación	116d	19/12/97	30/06/98
11	Inicio del sub-proyecto	1d	19/12/97	19/12/97
12	Entrega de Información Técnica, Logística y	1d	22/12/97	22/12/97
25	Solicitud y Aprobación de Pemisos	2d	22/12/97	23/12/97
28	Generación del Master	11,6d	22/12/97	06/02/98
29	Obtención del Software	1d	22/12/97	22/12/97
30	Obtención PC's & Impresoras	1d	22/12/97	22/12/97
31	Instalación Site de prueba (PC's e impresor)	1d	23/12/97	23/12/97
32	Carga de softw. y generación de Rutinas Et	3d	24/12/97	26/12/97
33	Prueba general	4h	29/12/97	29/12/97
34	Grabación del Disco	4h	29/12/97	29/12/97
35	Testeo	1d	30/12/97	30/12/97
36	Rework	4h	31/12/97	31/12/97
37	Aprobación del Master	3d	31/12/97	04/02/98
41	Envío de Máster a Planta	1d	04/02/98	05/02/98
42	Generales	44d	22/12/97	23/03/98
47	Adecuación del Centro de Cómputos	39d	02/02/98	26/03/98

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
48	Obra civil	15d	20/02/98	12/03/98										
49	Pintura	10d	13/03/98	26/03/98										
50	Electricidad	14d	02/02/98	19/02/98										
51	Pruebas	5d	20/02/98	26/02/98										
52	Documentación	10d	27/02/98	12/03/98										
53	Aceptación	5d	13/03/98	19/03/98										
57	Instalación y cableado Capital Federal	110d	22/12/97	23/06/98										
58	GRUPO 1	110d	22/12/97	23/06/98										
59	Talcahuano 660	110d	22/12/97	23/06/98										
78	GRUPO 2	95d	29/12/97	09/06/98										
79	Comodoro Py 2002	73d	29/12/97	08/06/98										
100	Inmigrantes 1950	56d	24/03/98	09/06/98										
112	Lavalle 1638	33d	30/03/98	13/05/98										
124	GRUPO 3	107d	24/12/97	22/06/98										
125	Sarmiento 877	43d	24/12/97	24/03/98										
139	Roque Saenz Peña 1190	72d	02/02/98	12/05/98										
153	Roque Saenz Peña 1211	64d	25/03/98	22/06/98										
167	GRUPO 4	73d	02/02/98	13/05/98										
168	25 de Mayo	33d	02/02/98	18/03/98										
182	Viamonte 1147/1156	60d	02/02/98	24/04/98										
196	Guido 1677 (Procuracion)	48d	09/03/98	13/05/98										
207	GRUPO 6	98d	22/12/97	05/06/98										
208	Lavalle 1171	42d	25/12/97	24/03/98										
226	Lavalle 1288	67d	02/02/98	06/06/98										
240	Lavalle 1220	67d	17/02/98	20/06/98										
254	Lavalle 1564	65d	09/03/98	05/06/98										

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
268	Cerrito 550	1d	22/12/97	22/12/97										
269	Cerrito 536	1d	22/12/97	22/12/97										
270	Libertad 731	1d	22/12/97	22/12/97										
271	Uruguay 714	1d	22/12/97	22/12/97										
272	Uruguay 643	1d	22/12/97	22/12/97										
273	Tucuman 1353	1d	22/12/97	22/12/97										
274	MT Alvear 1840	1d	22/12/97	22/12/97										
275	JD Peron 2455	1d	22/12/97	22/12/97										
276	Instalación y Cableado Interior del país	95d	02/02/98	12/06/98										
277	GRUPO I/1	62d	02/02/98	28/04/98										
278	SAN MARTIN (100)	39d	02/02/98	26/03/98										
294	LA PLATA ( 130)	39d	05/03/98	28/04/98										
319	GRUPO I/2	95d	02/02/98	12/06/98										
320	JUJUY (55)	30d	02/02/98	13/03/98										
356	SALTA (60)	22d	04/03/98	02/04/98										
368	TUCUMAN (36)	29d	23/03/98	30/04/98										
391	SANTIAGO DEL ESTERO (45)	41d	17/04/98	12/06/98										
403	GRUPO I/3	93d	02/02/98	10/06/98										
404	CATAMARCA (36)	33d	02/02/98	18/03/98										
427	LA RIOJA (36)	22d	06/03/98	06/04/98										
450	CORDOBA (120)	64d	27/03/98	10/06/98										
473	GRUPO I/4	89d	02/02/98	04/06/98										
474	PARANA (80)	42d	02/02/98	31/03/98										
508	SANTA FE (75)	54d	23/03/98	04/06/98										
542	Aceptación Cableado/Instalación	6d	24/06/98	30/06/98										
546	Solución Documental	102d	19/12/97	10/06/98										

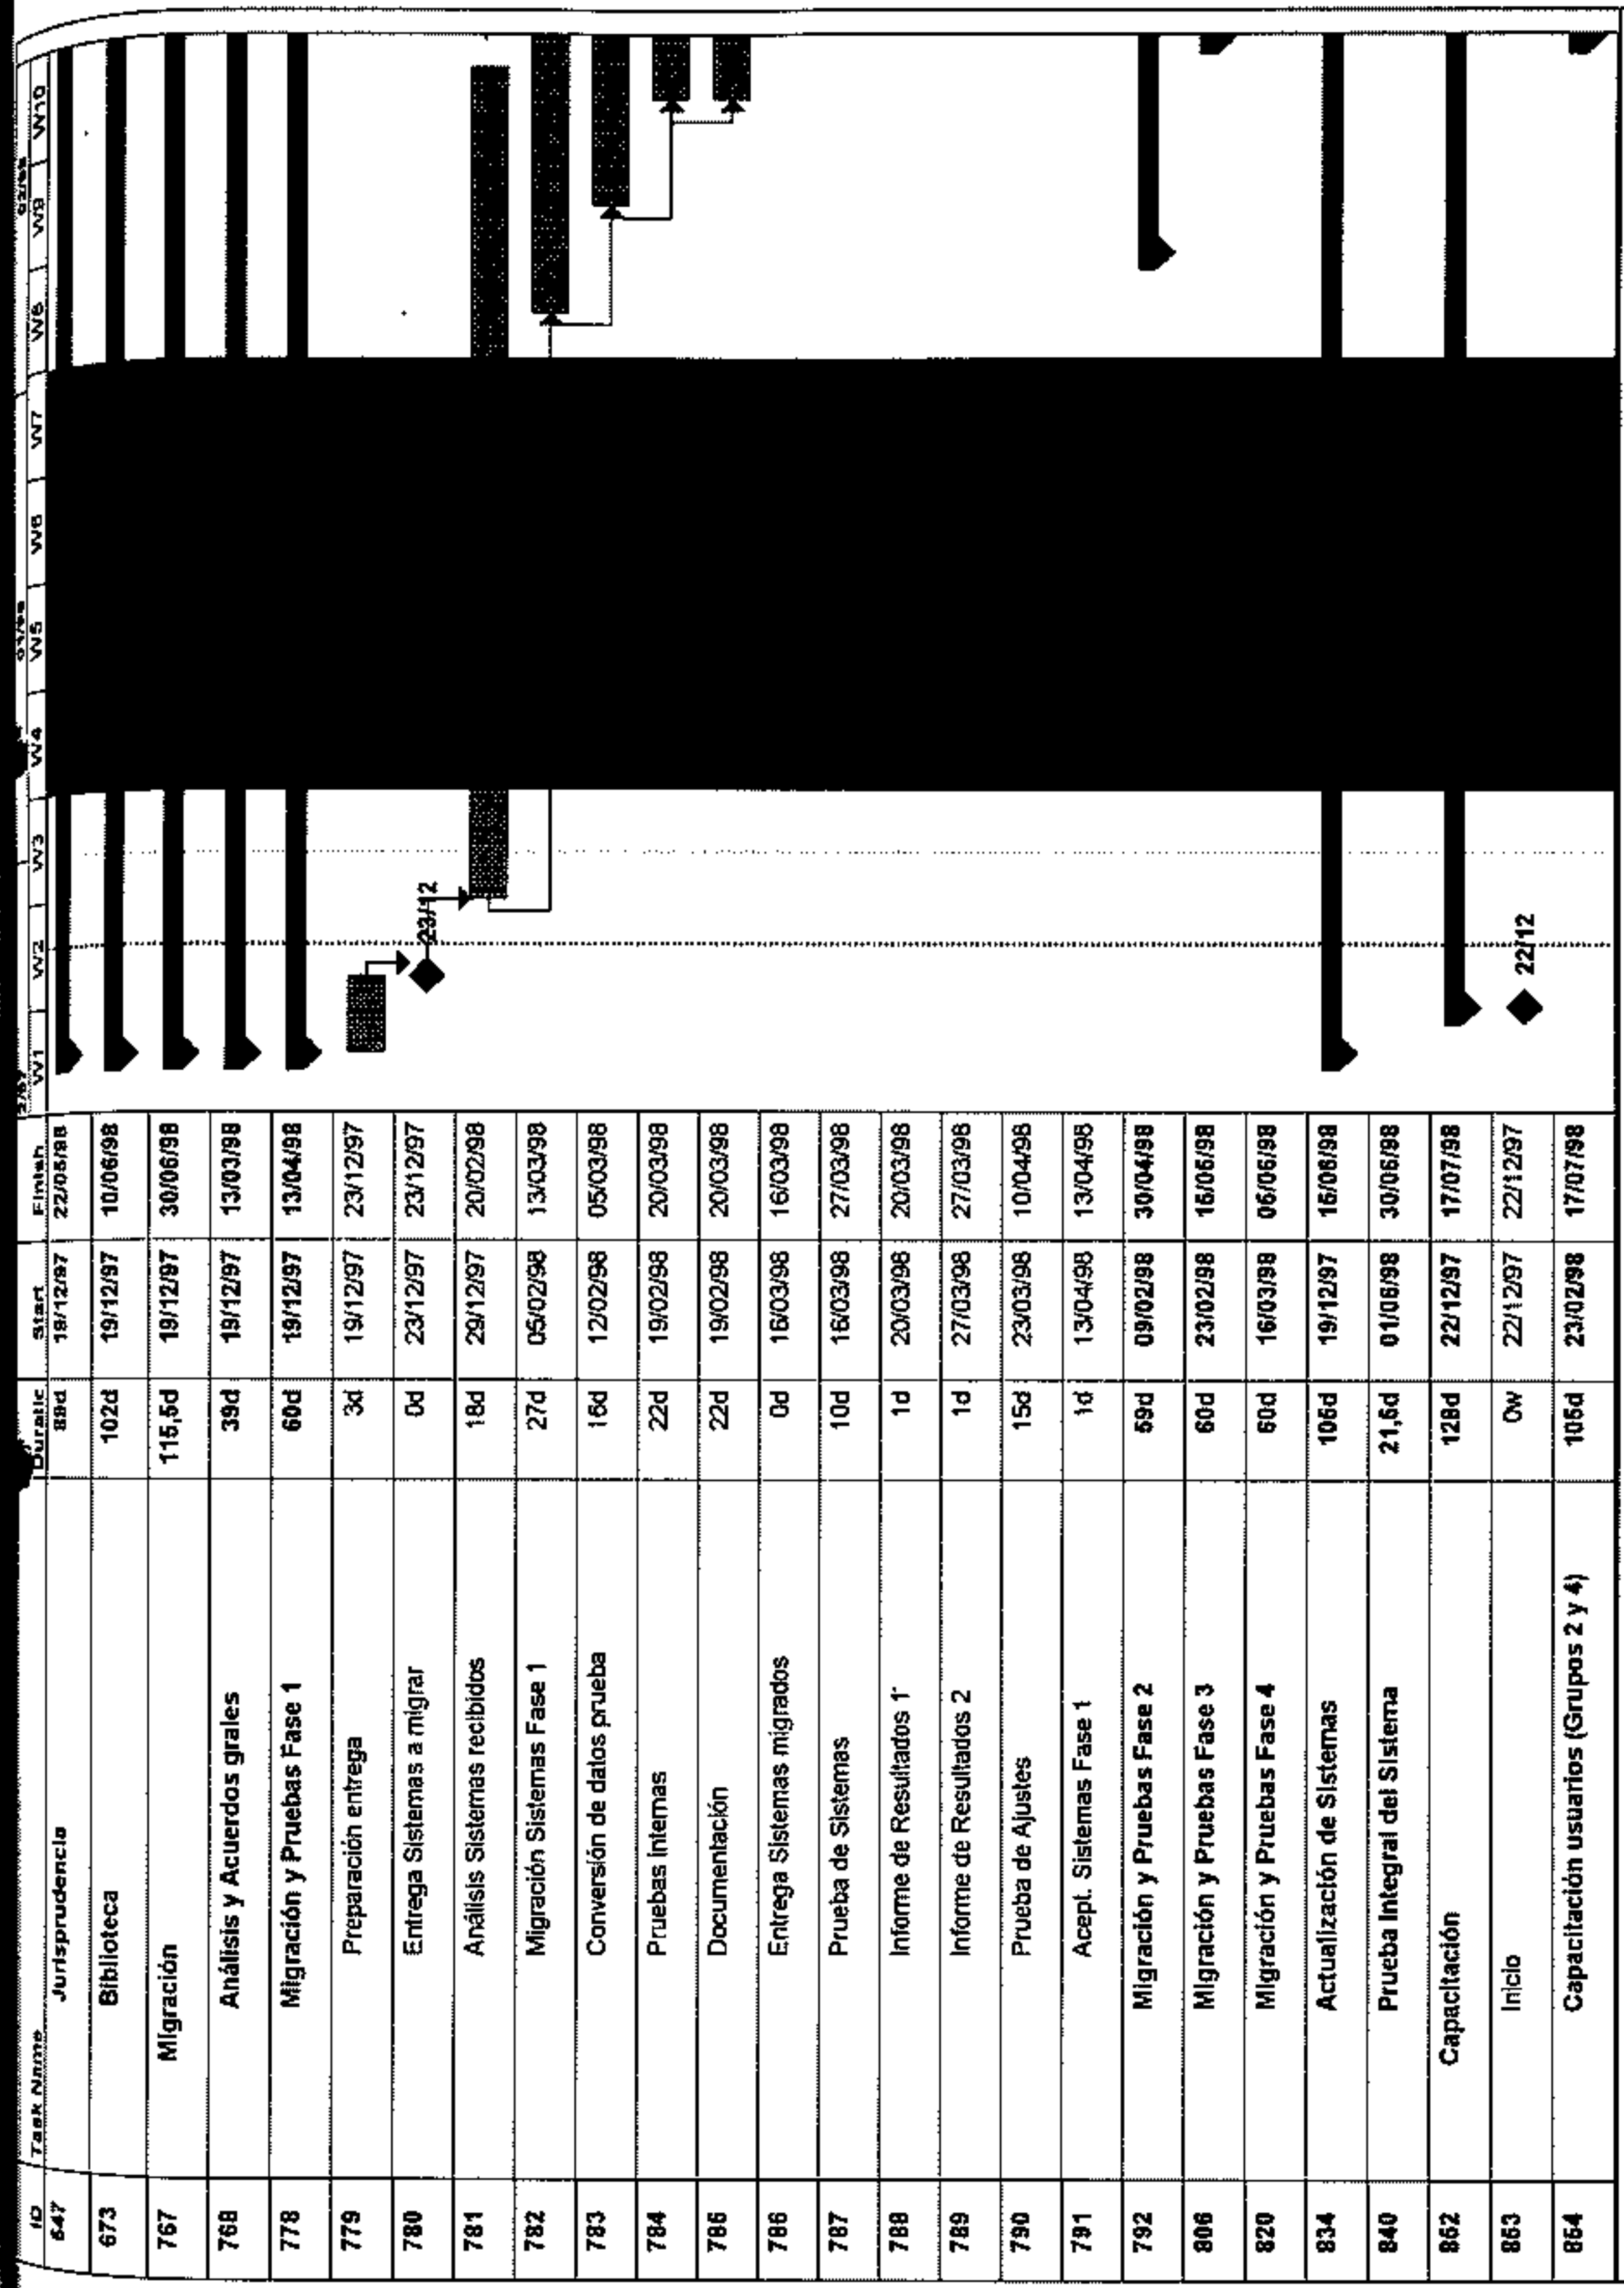

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
647	Jurisprudencia	88d	18/12/97	22/05/98
673	Biblioteca	102d	19/12/97	10/06/98
767	Migración	115,5d	19/12/97	30/06/98
768	Análisis y Acuerdos gales	39d	19/12/97	13/03/98
778	Migración y Pruebas Fase 1	60d	19/12/97	13/04/98
779	Preparación entrega	3d	19/12/97	23/12/97
780	Entrega Sistemas a migrar	0d	23/12/97	23/12/97
781	Análisis Sistemas recibidos	18d	29/12/97	20/02/98
782	Migración Sistemas Fase 1	27d	05/02/98	13/03/98
783	Conversión de datos prueba	16d	12/02/98	05/03/98
784	Pruebas internas	22d	19/02/98	20/03/98
786	Documentación	22d	19/02/98	20/03/98
786	Entrega Sistemas migrados	0d	16/03/98	16/03/98
787	Prueba de Sistemas	10d	16/03/98	27/03/98
788	Informe de Resultados 1	1d	20/03/98	20/03/98
789	Informe de Resultados 2	1d	27/03/98	27/03/98
790	Prueba de Ajustes	15d	23/03/98	10/04/98
791	Acept. Sistemas Fase 1	1d	13/04/98	13/04/98
792	Migración y Pruebas Fase 2	59d	09/02/98	30/04/98
806	Migración y Pruebas Fase 3	60d	23/02/98	16/06/98
820	Migración y Pruebas Fase 4	60d	16/03/98	06/06/98
834	Actualización de Sistemas	106d	19/12/97	16/06/98
840	Prueba Integral del Sistema	21,6d	01/06/98	30/06/98
862	Capacitación	128d	22/12/97	17/07/98
863	Inicio	0w	22/12/97	22/12/97
864	Capacitación usuarios (Grupos 2 y 4)	105d	23/02/98	17/07/98




ID	Task Name	Inicio	Duración	Start	Finish	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
856				23/02/98	23/02/98										
856	Interior/La Plata/San Martin		105d	23/02/98	17/07/98										
857	Jujuy-PC's		10d	30/03/98	10/04/98										
860	Jujuy - BRS/Search		6d	13/04/98	17/04/98										
862	Paraná - PC's		15d	27/04/98	15/05/98										
866	Parana' - BRS/Search		6d	18/05/98	22/05/98										
868	Catamarca - PC's		6d	04/05/98	08/05/98										
870	Catamarca - BRS/Search		6d	11/05/98	15/05/98										
872	San Martin (Bs. As) PC's		25d	02/03/98	03/04/98										
883	San Martin - BRS/Search		5d	06/04/98	10/04/98										
886	Salta PC's		6d	25/05/98	29/05/98										
887	Salta BRS/Search		5d	01/06/98	05/06/98										
889	La Plata PC's		35d	20/04/98	05/06/98										
897	La Plata BRS/Search		10d	08/06/98	19/06/98										
900	La Rioja PC's		5d	15/06/98	19/06/98										
902	La Rioja BRS/Search		5d	22/06/98	26/06/98										
904	Tucumán PC's		20d	23/02/98	20/03/98										
909	Tucuman BRS/Search		6d	23/03/98	27/03/98										
911	Santa Fé PC's		10d	01/06/98	12/06/98										
914	Santa Fé BRS/Search		6d	15/06/98	19/06/98										
916	Córdoba PC's		30d	23/02/98	03/04/98										
923	Cordoba BRS/Search		10d	06/04/98	17/04/98										
926	Santiago del Estero PC's		10d	29/06/98	10/07/98										
929	S. del Estero BRS/Search		6d	13/07/98	17/07/98										
931	CAPITAL		95d	23/02/98	03/07/98										
932	PC's		80d	23/02/98	25/06/98										

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
961	BRS/Search	80d	16/03/98	03/07/98										
969	Capacitación - Grupo I	95d	23/02/98	03/07/98										
970	Personal de Sistemas	95d	23/02/98	03/07/98										
971	Grupo A - Buenos Aires	25d	23/02/98	27/03/98										
977	Grupo B - Buenos Aires	25d	23/03/98	24/04/98										
983	La Plata	20d	27/04/98	22/06/98										
988	Grupo C-Buenos Aires	25d	26/05/98	26/06/98										
994	Jujuy	20d	26/05/98	19/06/98										
999	Paraná	20d	23/02/98	20/03/98										
1004	Tucuman	20d	06/04/98	01/05/98										
1009	Córdoba	20d	08/06/98	03/07/98										
1014	Capacitación -Grupo 3-	100d	09/02/98	26/06/98										
1015	Personal de Sistemas	5d	04/05/98	08/05/98										
1016	BRS/Search	5d	04/05/98	08/05/98										
1017	Interior/La Plata/San Martín	100d	09/02/98	26/06/98										
1018	Jujuy-PC's	10d	30/03/98	10/04/98										
1021	Jujuy - BRS/Search	5d	13/04/98	17/04/98										
1023	Paraná - PC's	15d	20/04/98	08/06/98										
1027	Parana - BRS/Search	5d	11/05/98	16/05/98										
1029	Catamarca - PC's	5d	27/04/98	01/05/98										
1031	Catamarca - BRS/Search	5d	04/06/98	08/06/98										
1033	San Martín (Bs. As) PC's	60d	02/03/98	22/06/98										
1044	San Martín - BRS/Search	5d	25/05/98	29/06/98										
1046	Salta PC's	5d	18/06/98	22/06/98										
1048	Salta BRS/Search	5d	25/06/98	29/06/98										
1050	La Plata PC's	35d	09/02/98	27/03/98										


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
1068	La Plata BRS/Search	10d	30/03/98	10/04/98										
1061	La Rioja PC's	5d	08/06/98	12/06/98										
1063	La Rioja BRS/Search	5d	15/06/98	19/06/98										
1065	Tucumán PC's	20d	16/02/98	13/03/98										
1070	Tucuman BRS/Search	5d	16/03/98	20/03/98										
1072	Santa Fé PC's	10d	25/05/98	05/06/98										
1075	Santa Fé BRS/Search	5d	08/06/98	12/06/98										
1077	Córdoba PC's	30d	16/02/98	27/03/98										
1084	Cordoba BRS/Search	10d	30/03/98	10/04/98										
1087	Santiago del Estero PC's	10d	08/06/98	19/06/98										
1090	S. del Estero BRS/Search	5d	22/06/98	26/06/98										
1092	CAPITAL	95d	16/02/98	26/06/98										
1093	PC's	90d	16/02/98	19/06/98										
1112	BRS/Search	75d	16/03/98	26/06/98										
1130	Etapas III - Puesta en Marcha	18d	24/06/98	17/07/98										
1131	Final. de la impl. de los sist. migrados	4d	24/06/98	29/06/98										
1132	Final. de la implant. del sist. doc.	4d	24/06/98	29/06/98										
1133	Coordinación adm. y técnica interna	4d	30/06/98	03/07/98										
1134	Migración de Datos Aplicativos	4d	30/06/98	03/07/98										
1135	Actualización Datos Documentales	4d	30/06/98	03/07/98										
1136	Arranque Operativo	5d	06/07/98	10/07/98										
1137	Aceptación definitiva del sistema	5d	13/07/98	17/07/98										


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31

03/98 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 07/98 W31

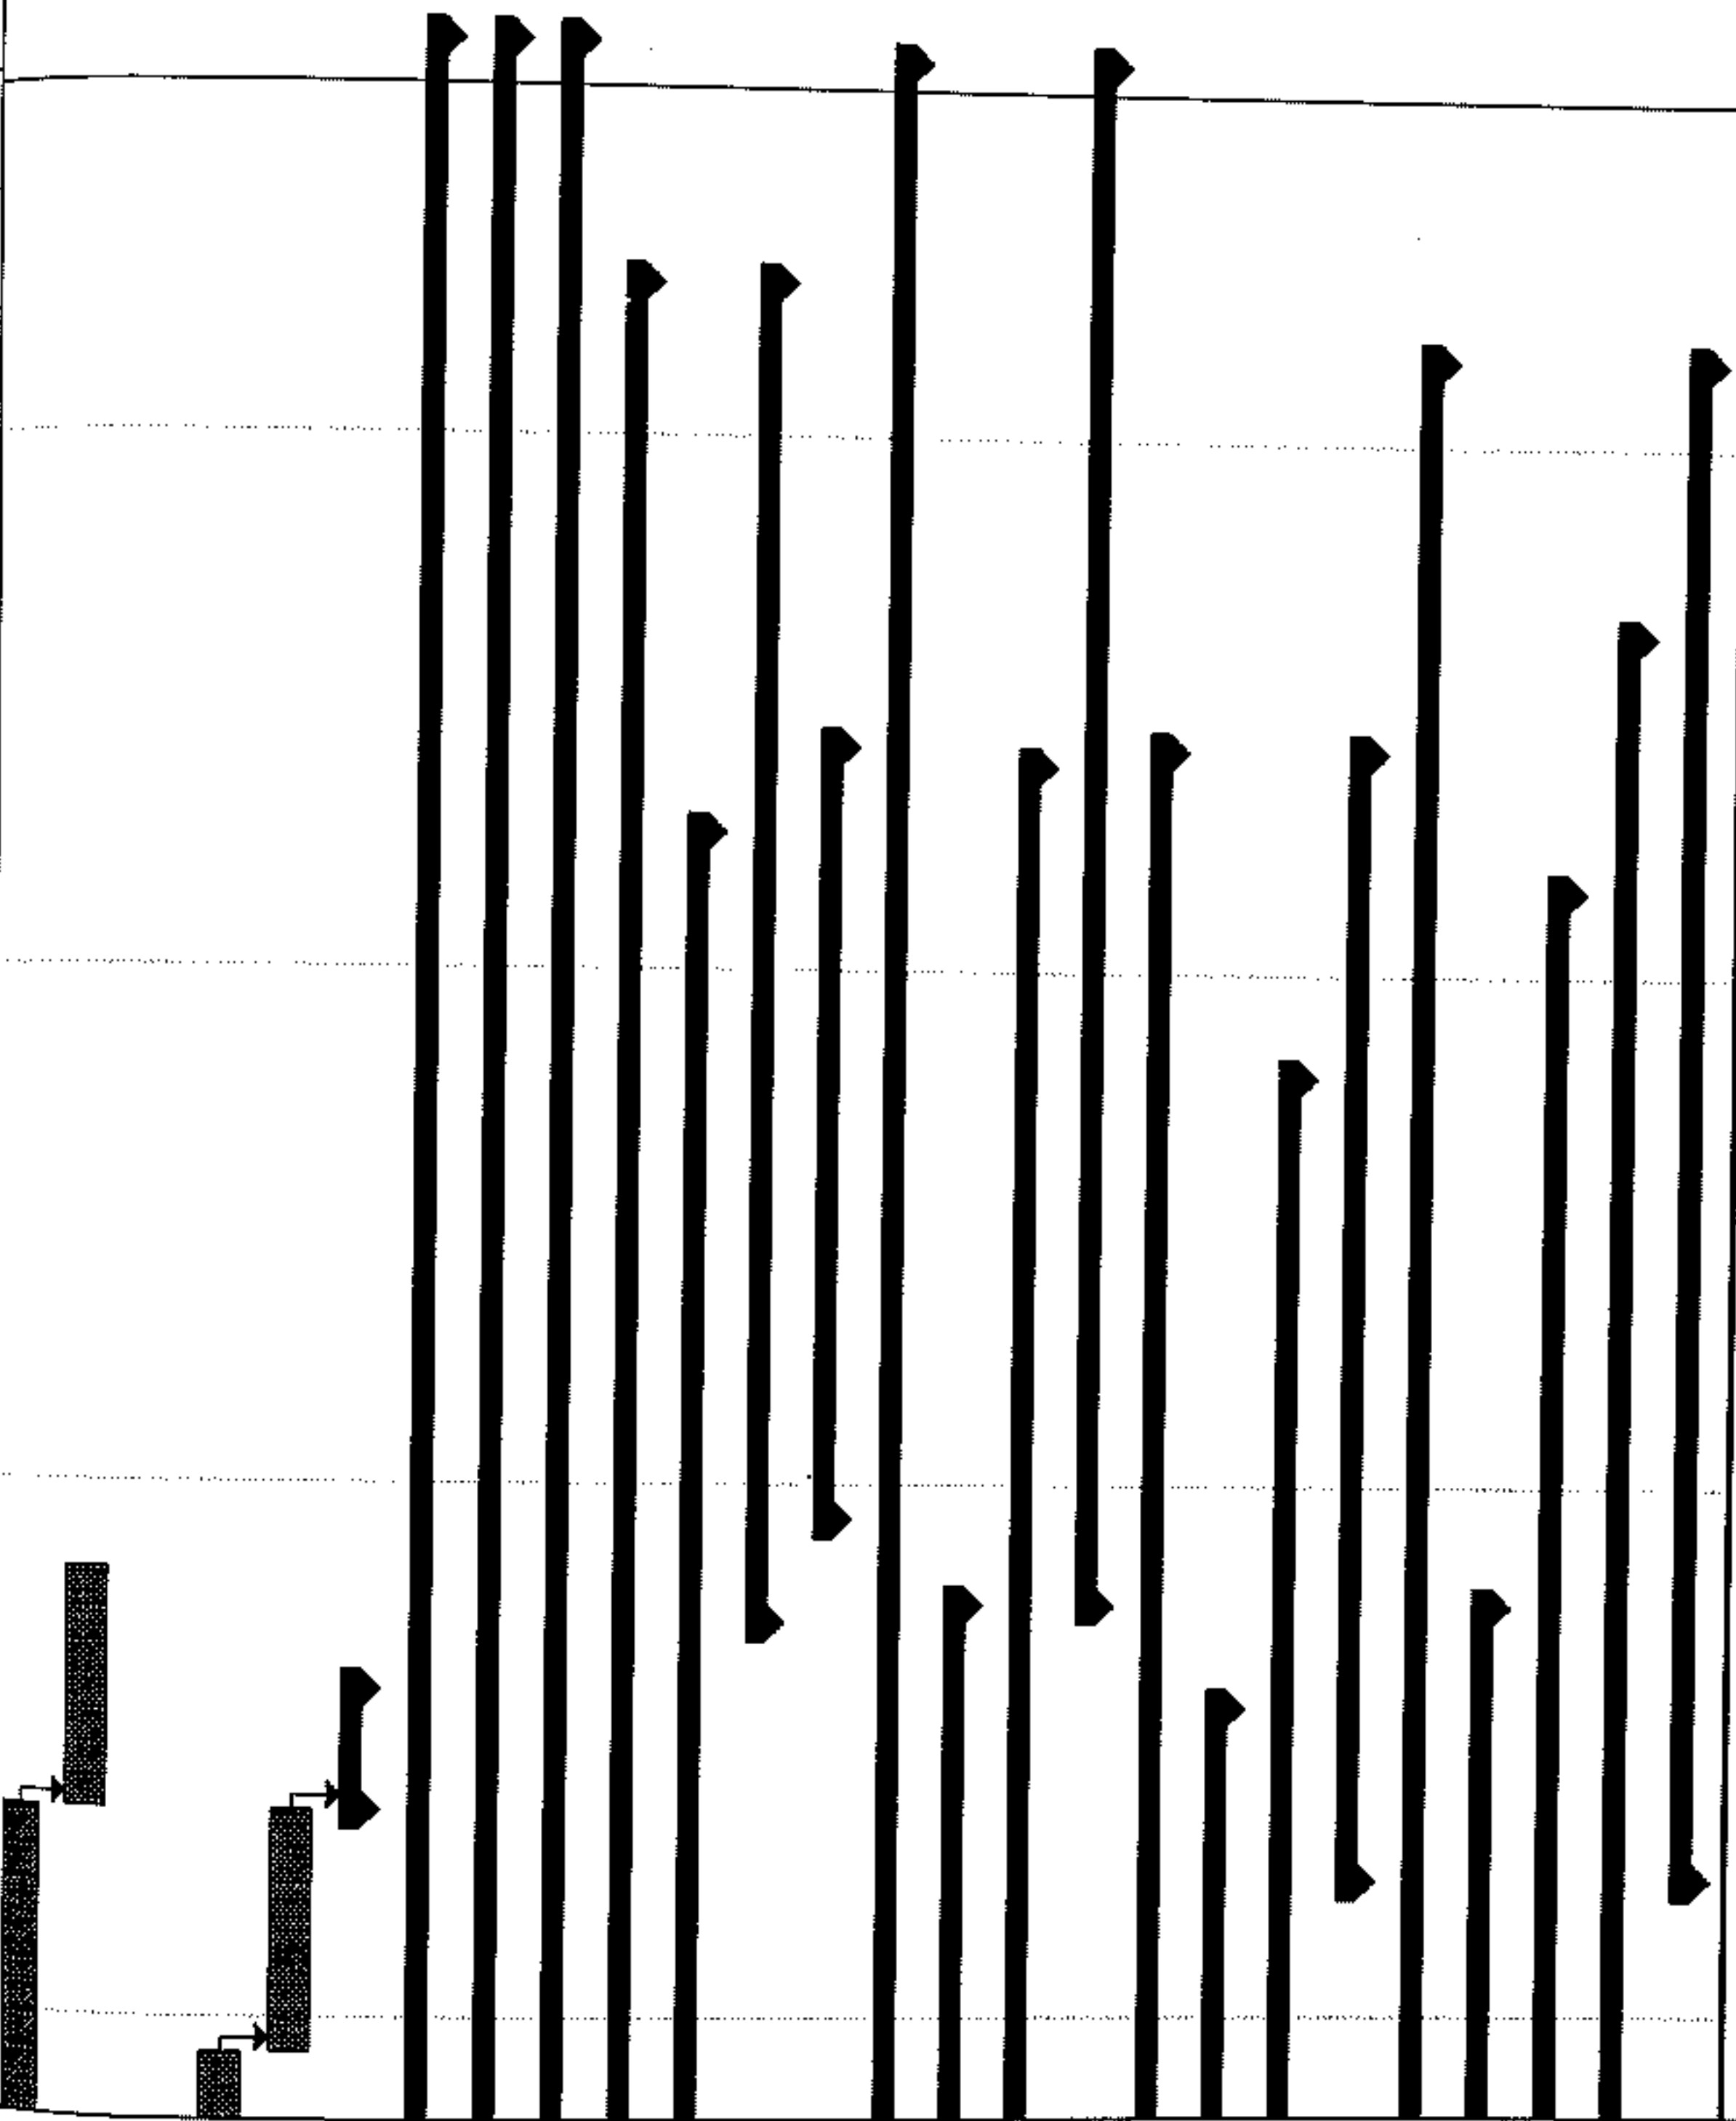


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31

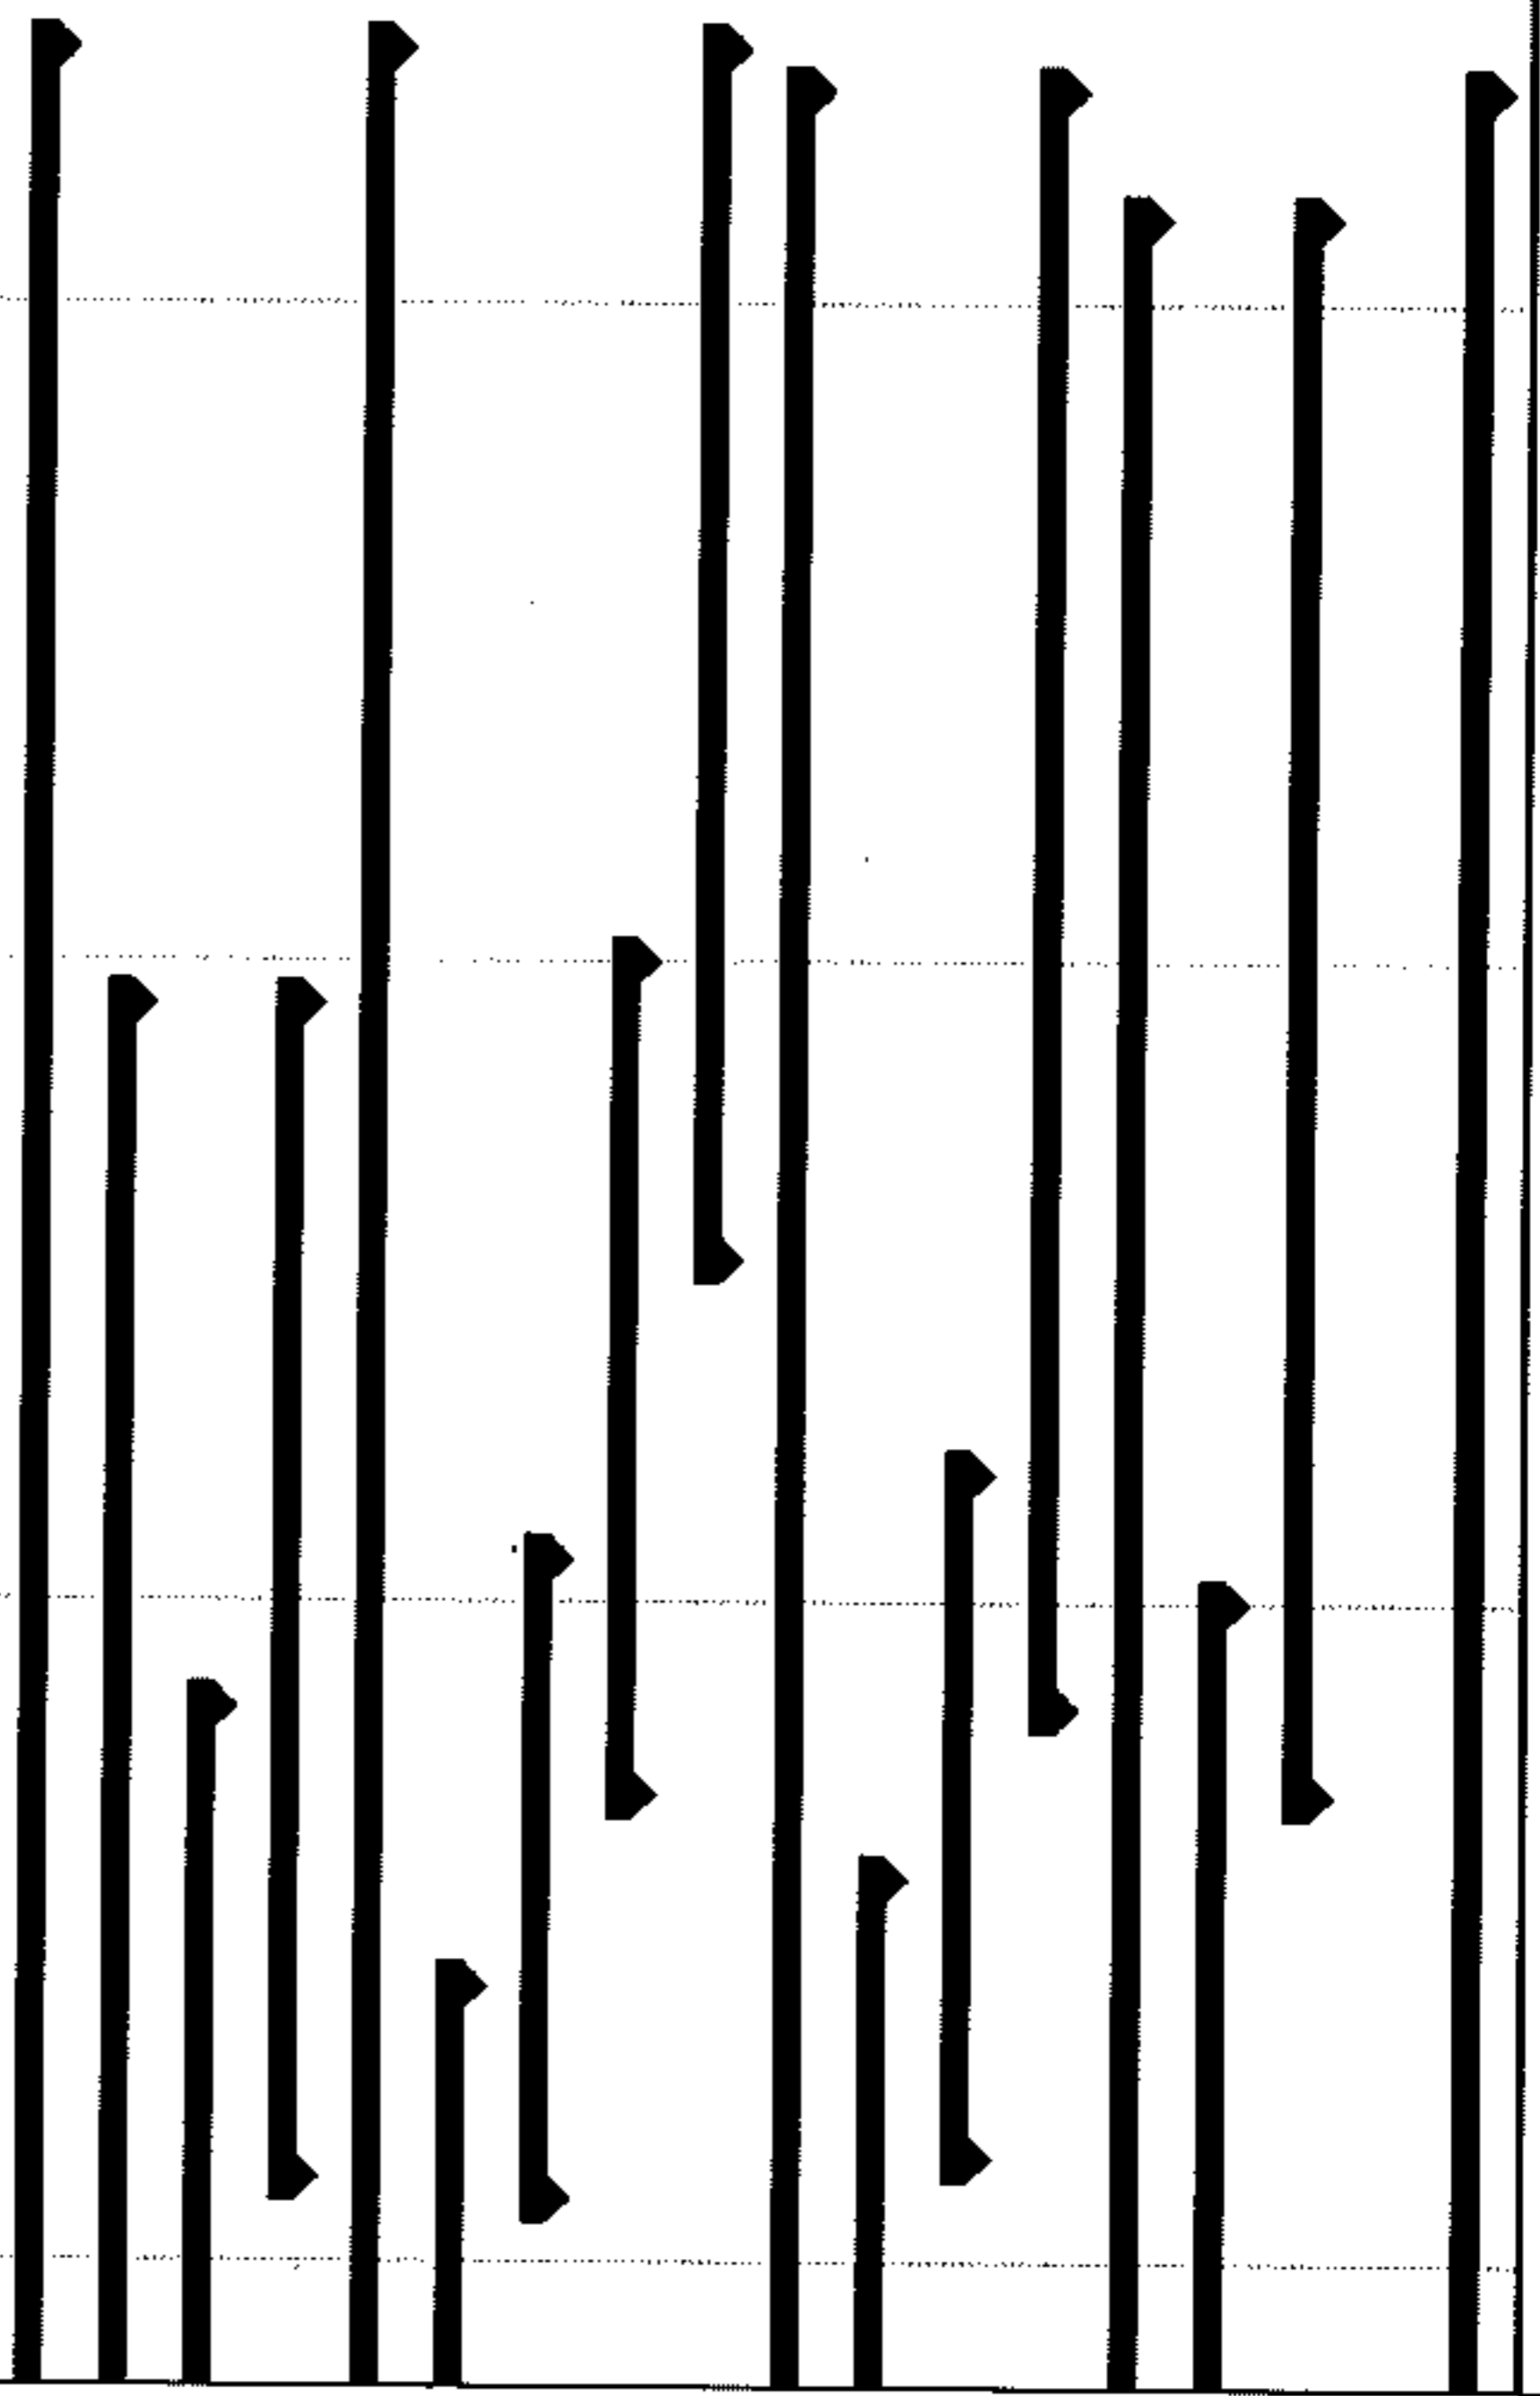

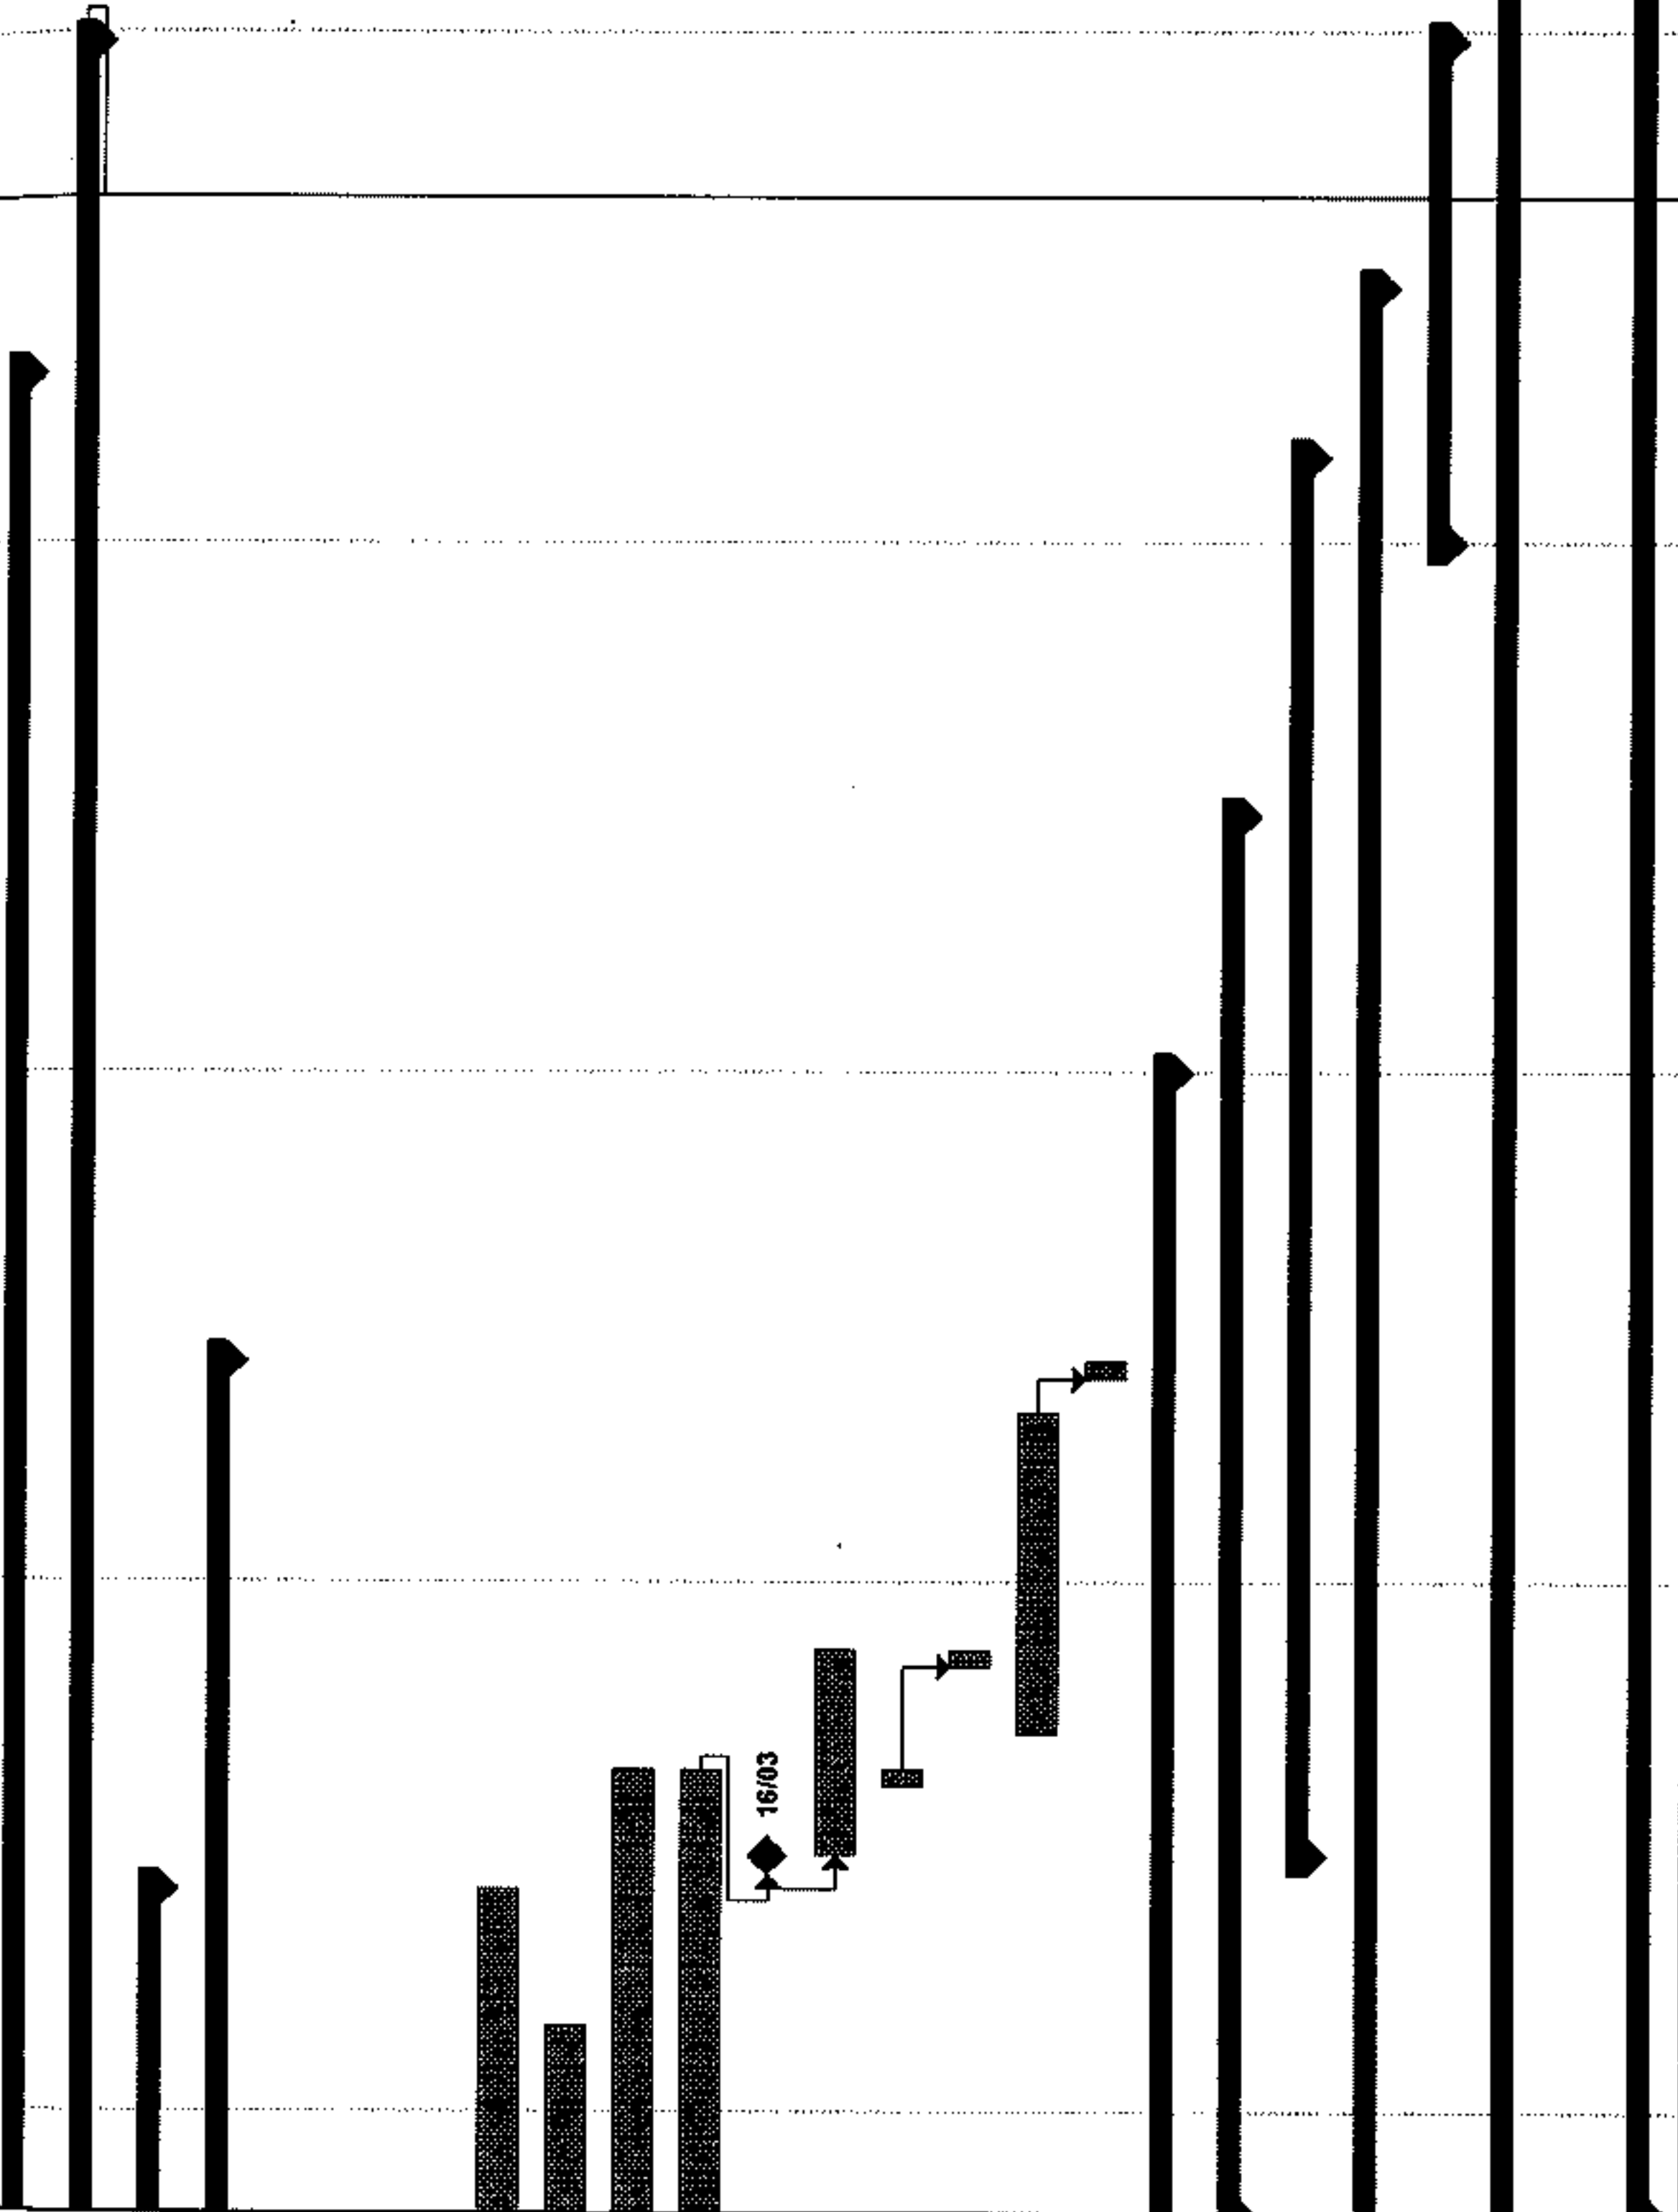


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31


23/02

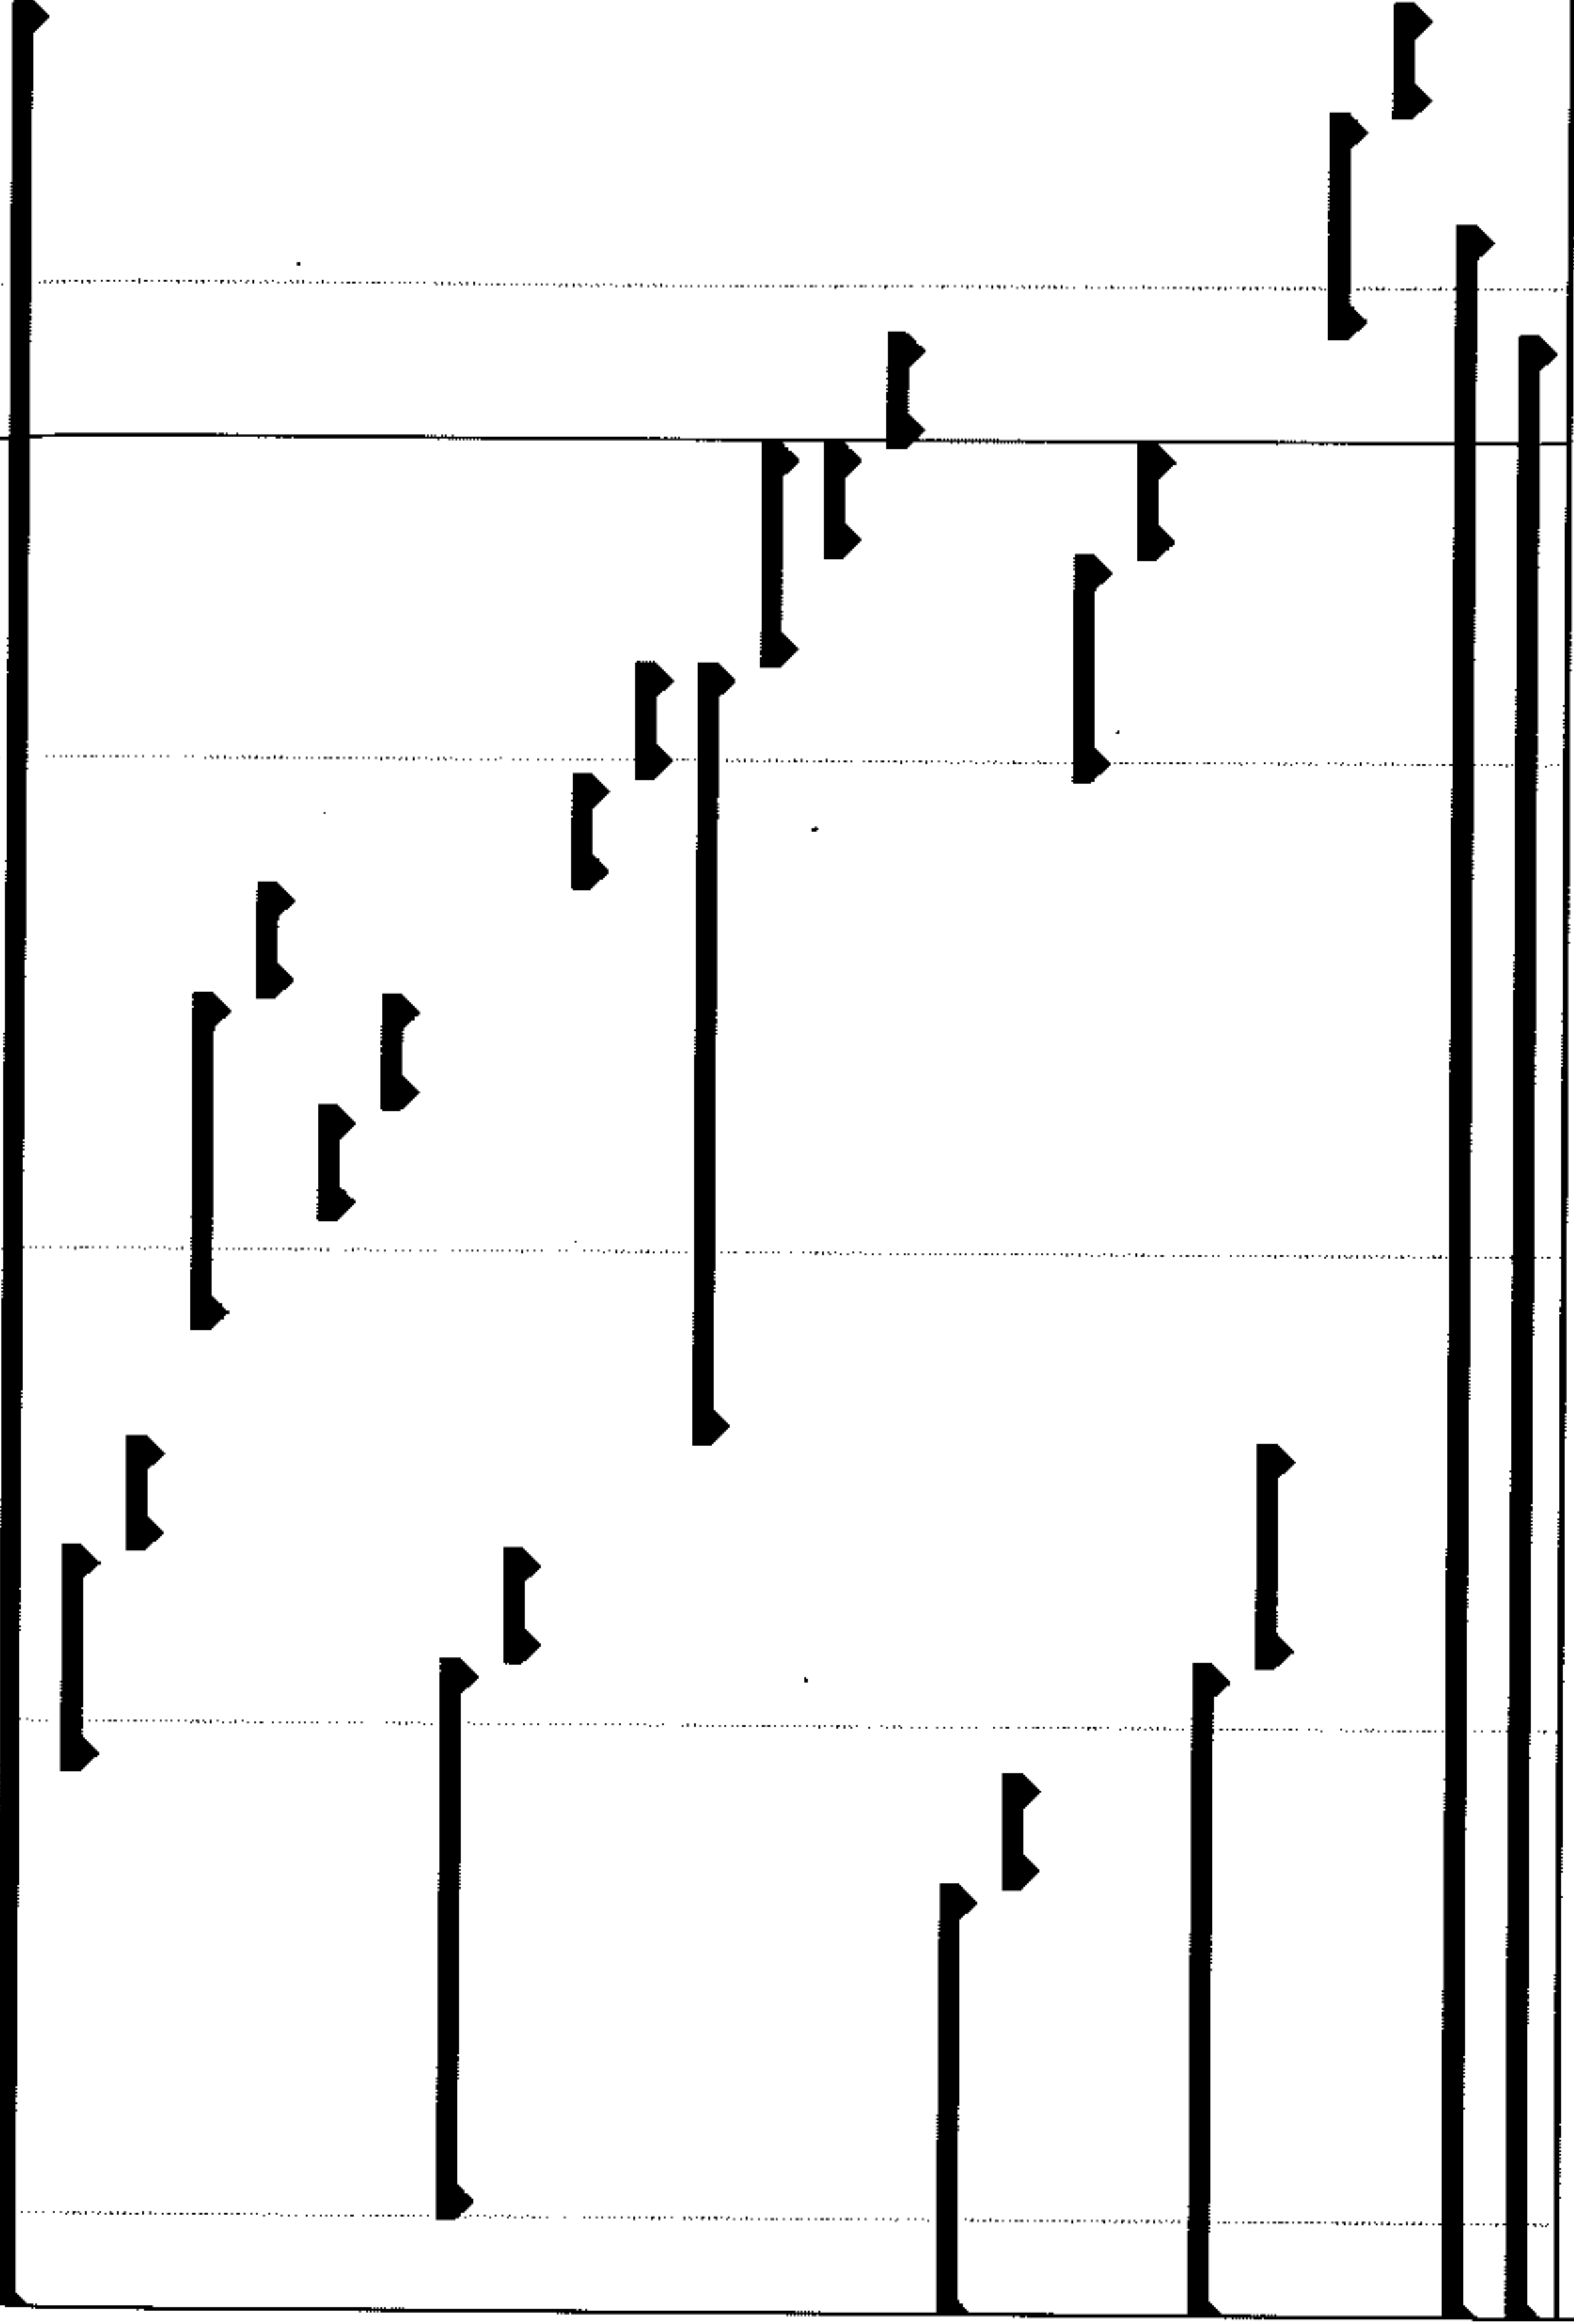



W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31

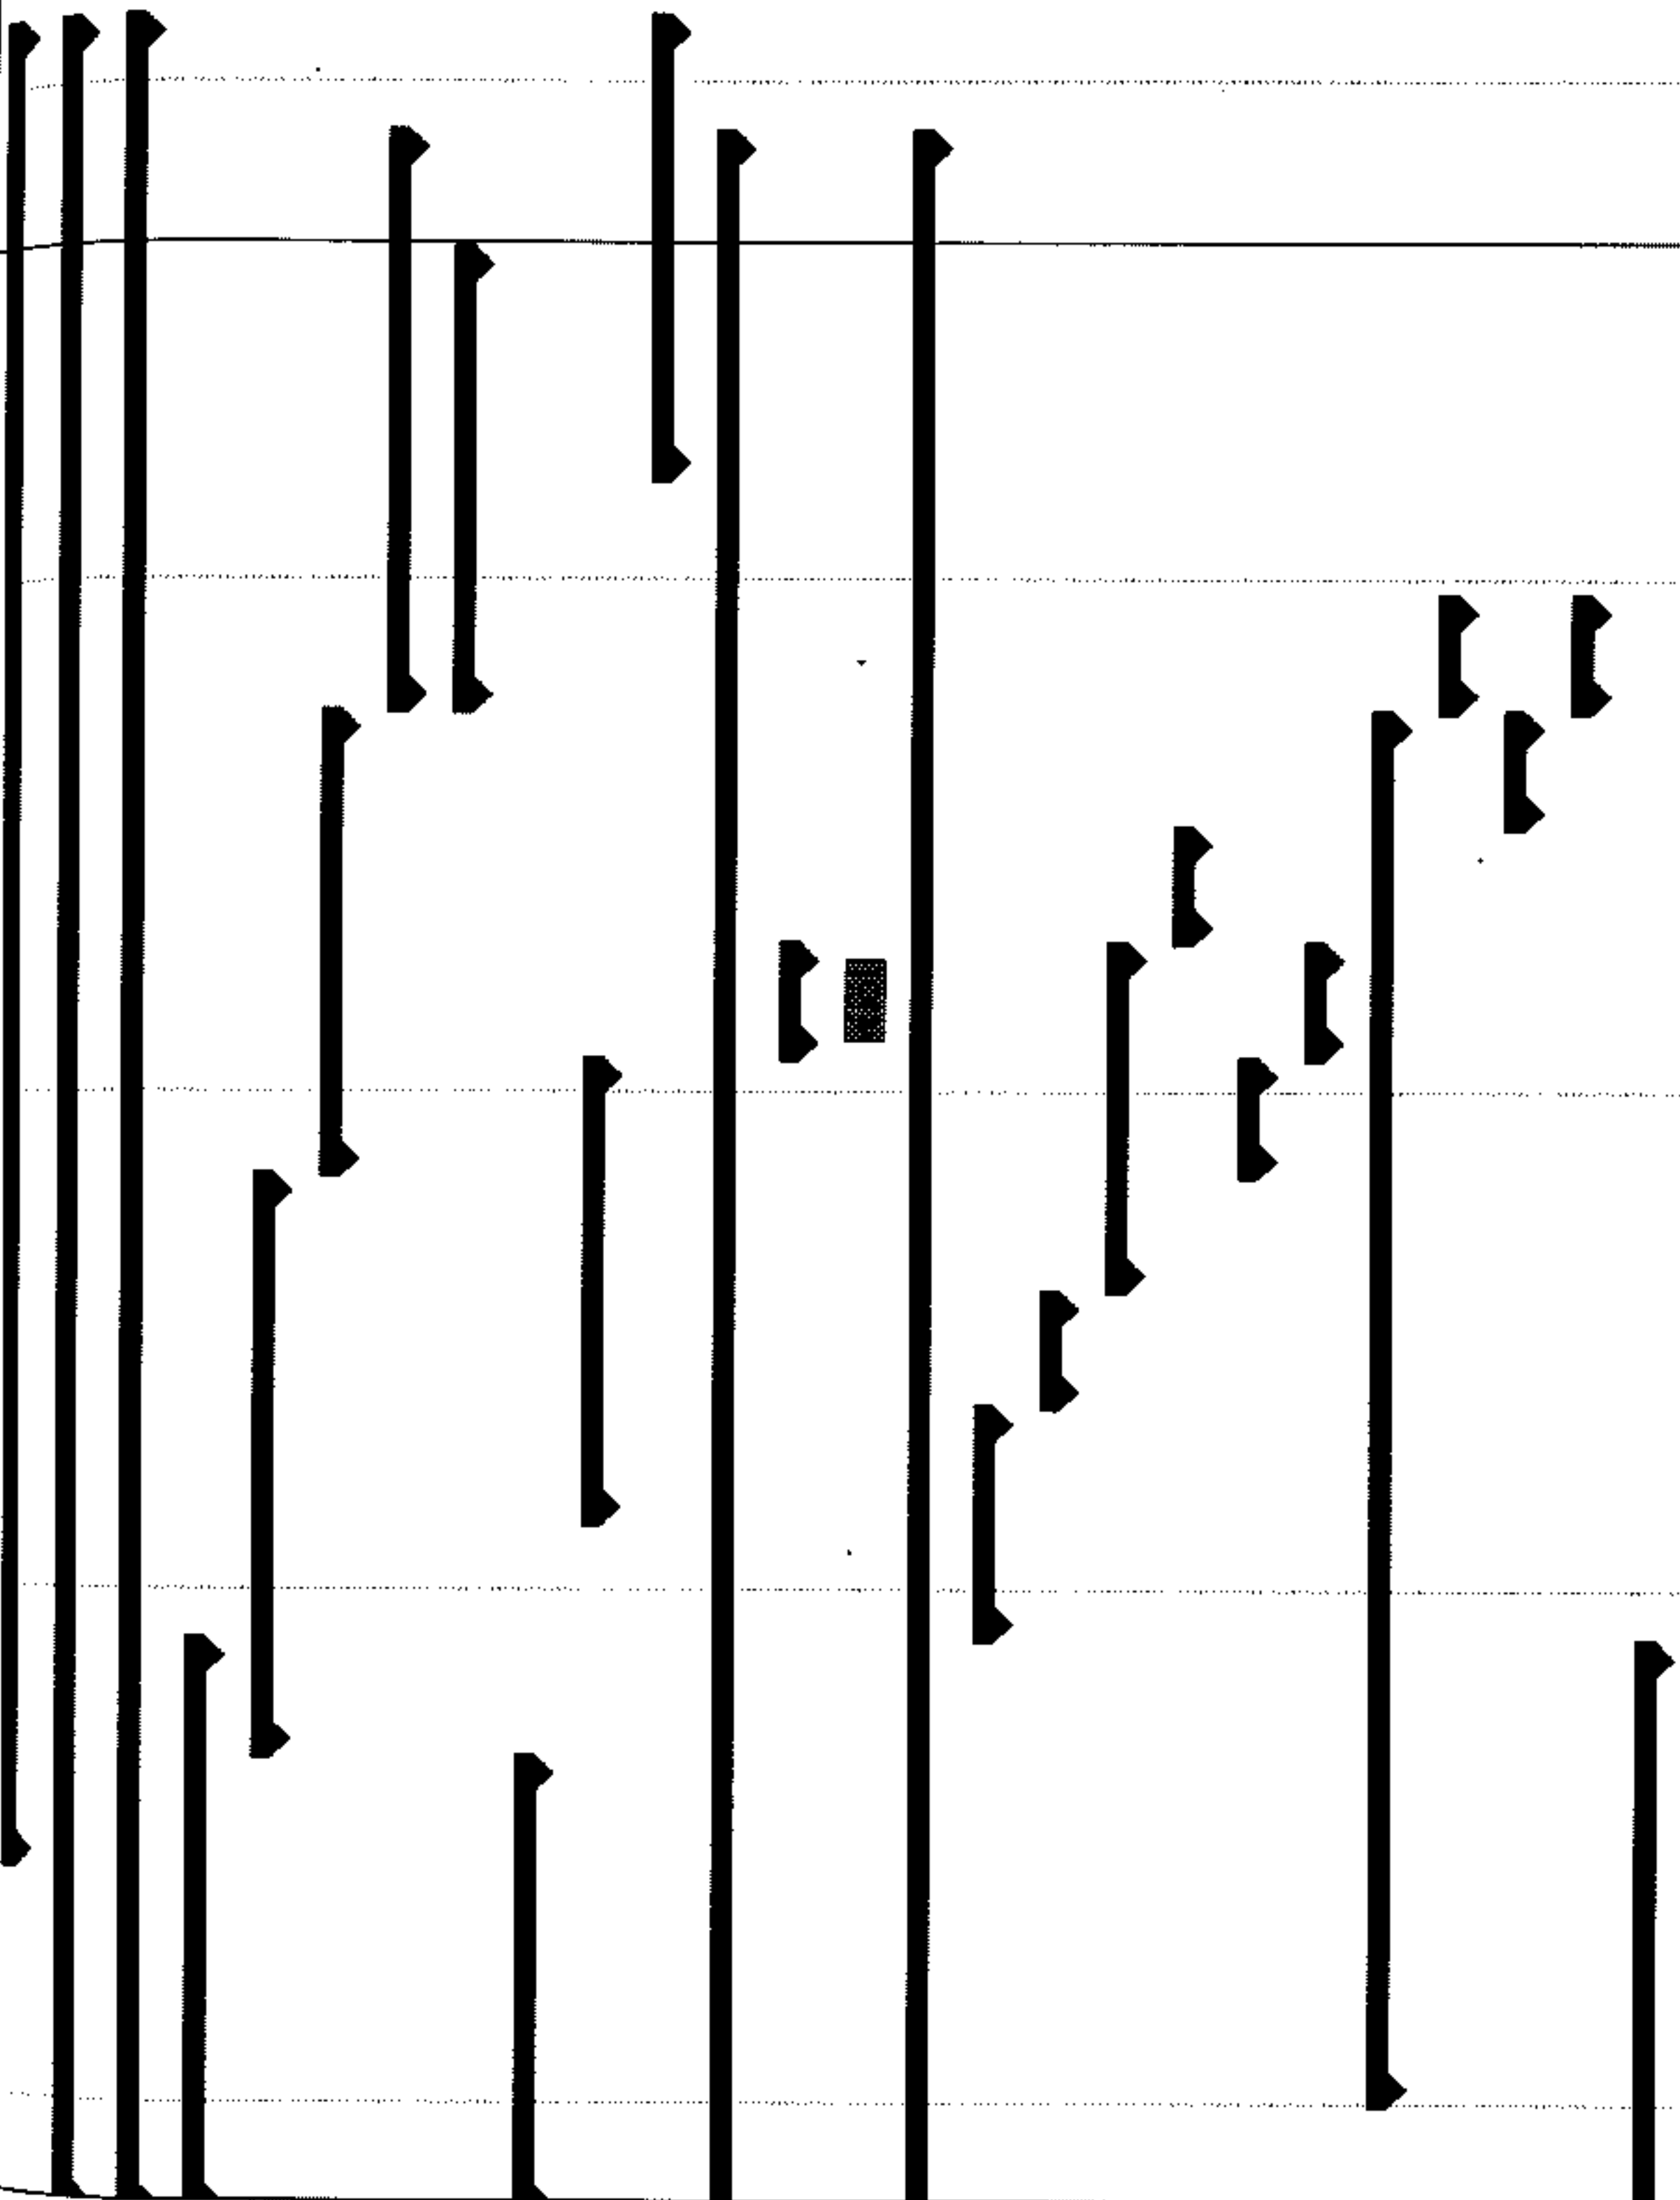

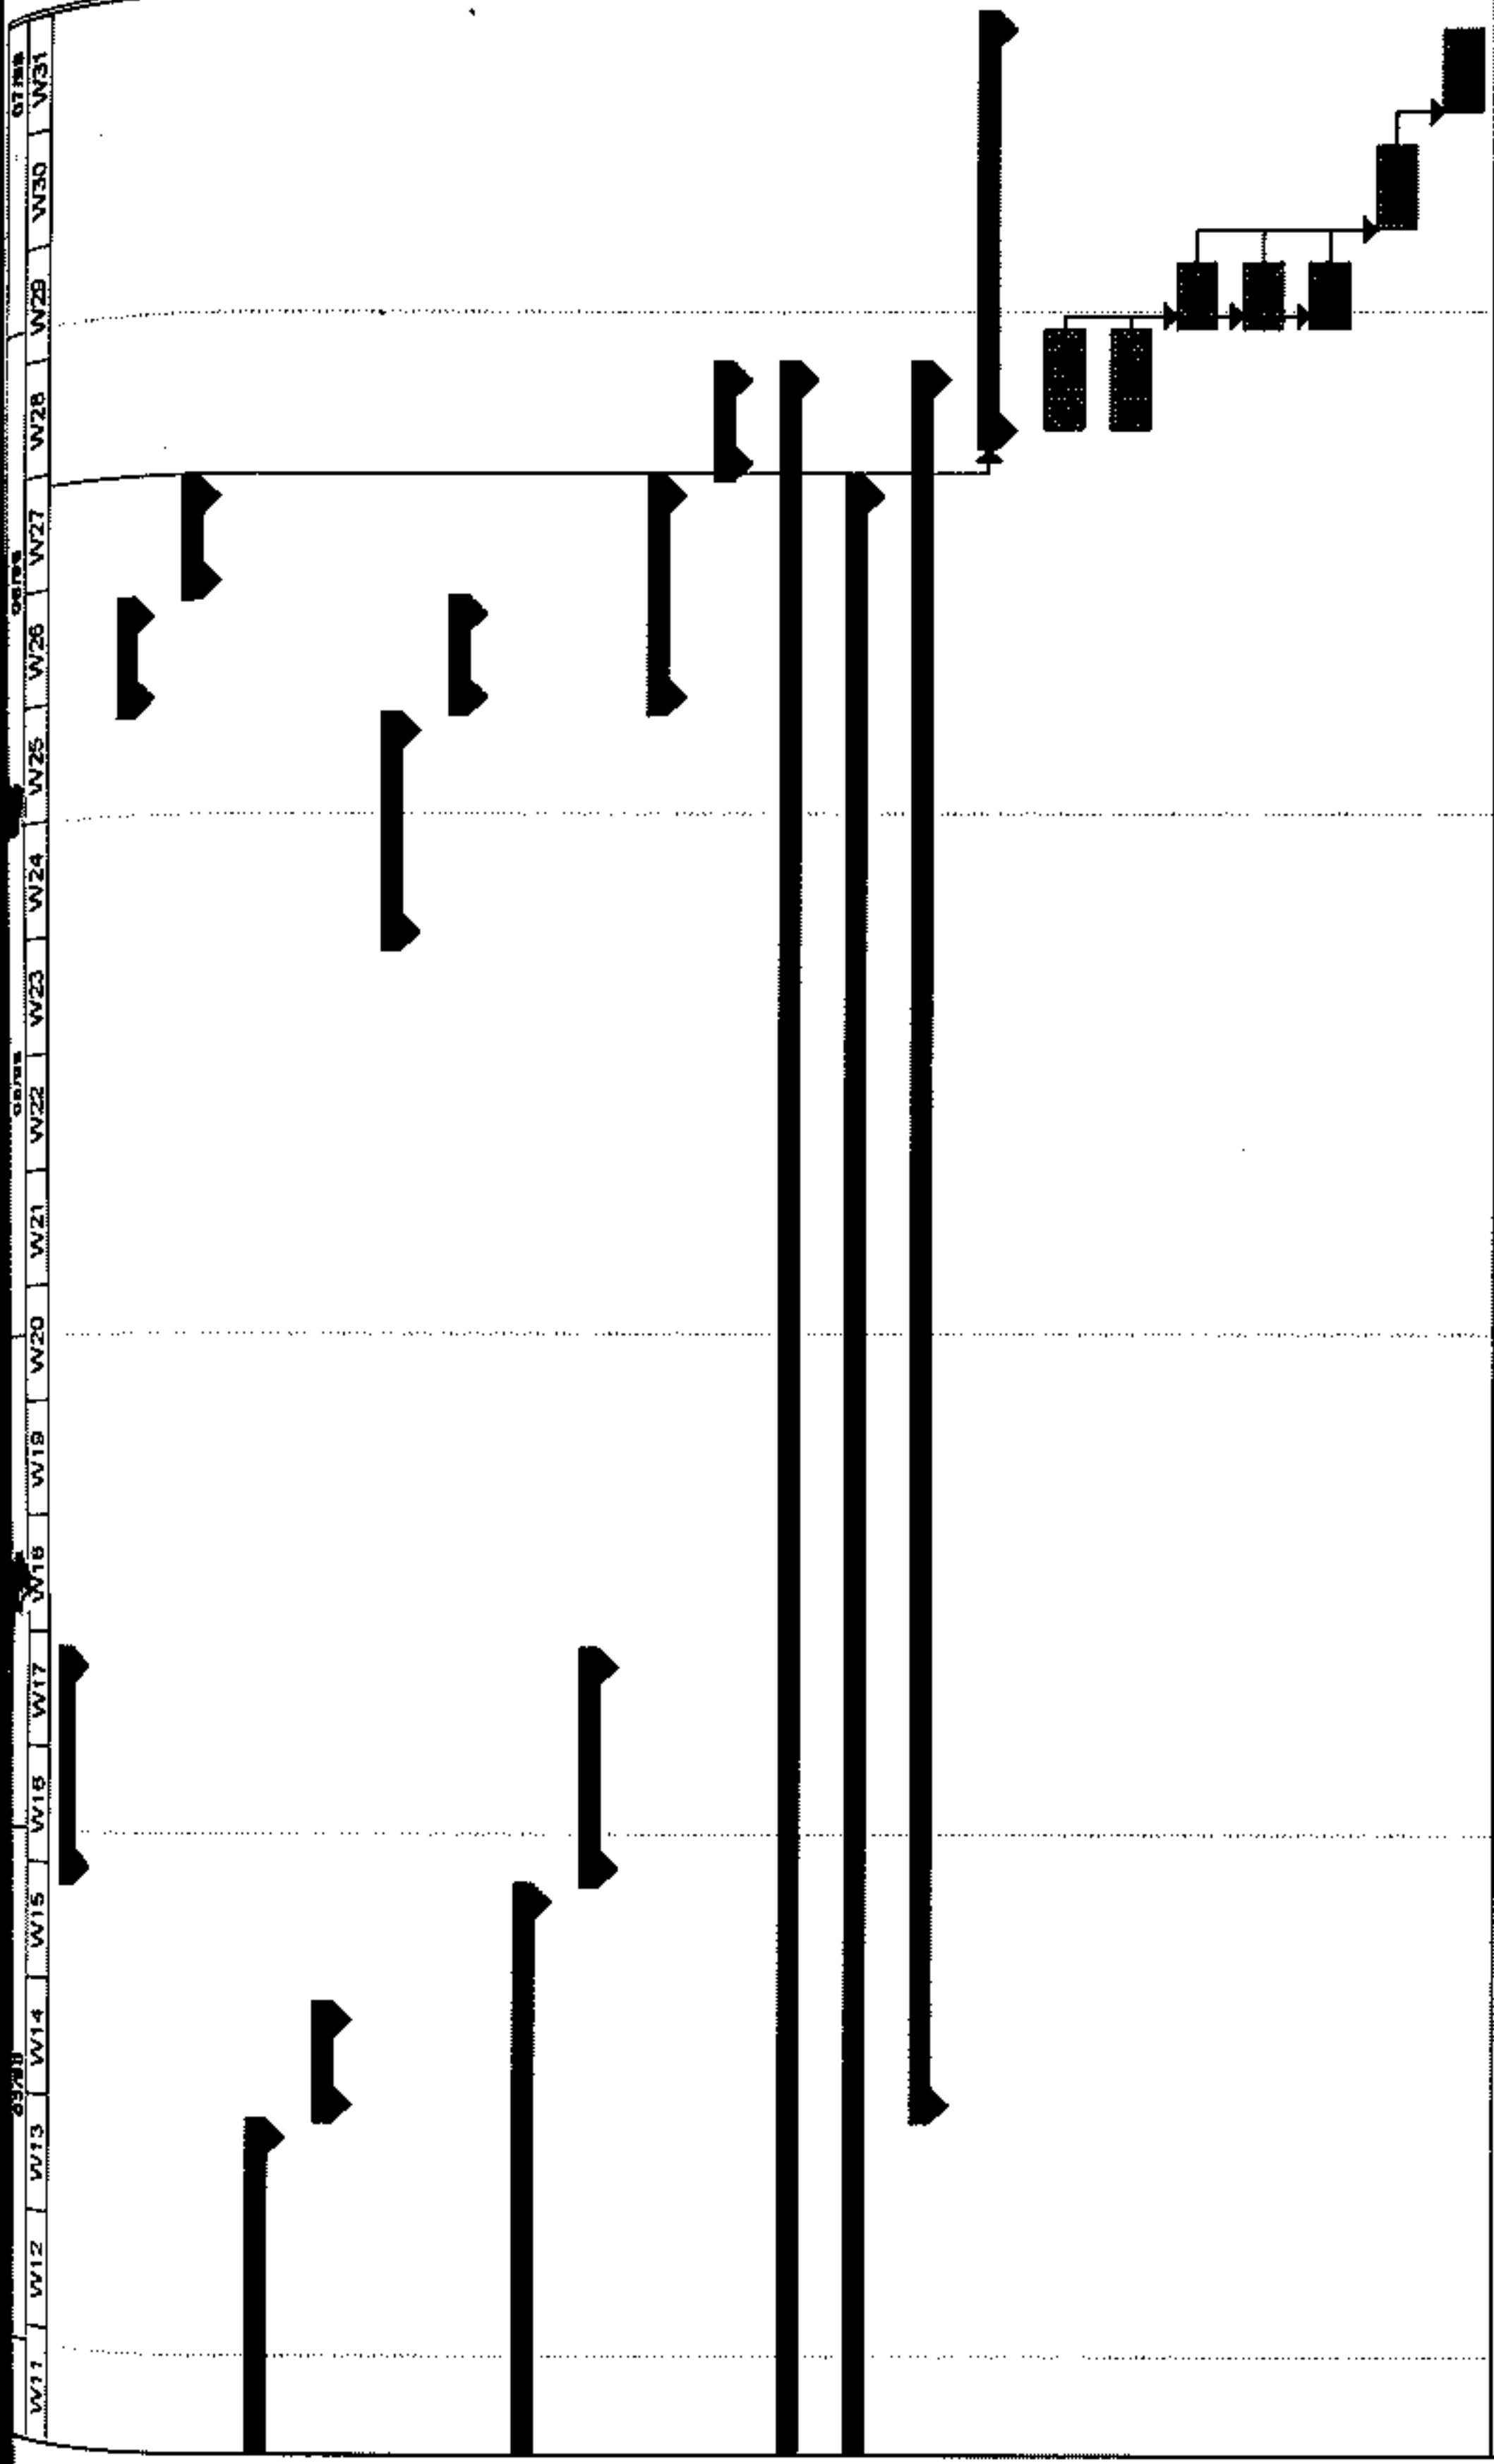

Project:  
Date: 26/12/97

Task  
Progress  
Milestone



Summary  
Rolled Up Task  
Rolled Up Milestone




Rolled Up Progress



ID	Task Name	Start	Finish	Responsible
1	Corte Suprema de Justicia de la Nación	19/12/97	05/08/98	Unisys/CSJN
2	Etapas I - Definición y Planificación	19/12/97	04/02/98	Unisys/CSJN
9	Etapas II - Desarrollo de las actividades	19/12/97	17/07/98	Unisys/CSJN
10	Instalación	19/12/97	30/06/98	Unisys/CSJN
546	Solución Documental	19/12/97	10/06/98	Unisys/CSJN
767	Migración	19/12/97	30/06/98	Unisys/CSJN
768	Análisis y Acuerdos generales	19/12/97	13/03/98	
769	Inventario de Sistemas	19/12/97	04/03/98	CSJN - Unisys
770	Entrega Doc. Inventario	04/03/98	04/03/98	Unisys
771	Aceptación Doc. Inventario	05/03/98	06/03/98	CSJN
772	Acuerdos de Migración	02/02/98	25/02/98	CSJN - Unisys
773	Entrega Doc. Acuerdos	26/02/98	26/02/98	Unisys
774	Aceptación Doc. Acuerdos	26/02/98	27/02/98	CSJN
775	Plan gen. de Pruebas	23/02/98	10/03/98	CSJN - Unisys
776	Entrega Doc. Plan Pruebas	11/03/98	11/03/98	Unisys
777	Aceptación Doc. Pruebas	11/03/98	13/03/98	CSJN
778	Migración y Pruebas Fase 1	19/12/97	13/04/98	
779	Preparación entrega	19/12/97	23/12/97	CSJN
780	Entrega Sistemas a migrar	23/12/97	23/12/97	CSJN
781	Análisis Sistemas recibidos	29/12/97	20/02/98	Unisys
782	Migración Sistemas Fase 1	05/02/98	13/03/98	Unisys
783	Conversión de datos prueba	12/02/98	05/03/98	Unisys
784	Pruebas Internas	19/02/98	20/03/98	Unisys
785	Documentación	19/02/98	20/03/98	Unisys
786	Entrega Sistemas migrados	16/03/98	16/03/98	Unisys
787	Prueba de Sistemas	16/03/98	27/03/98	CSJN


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsable	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
788	Informe de Resultados 1	1d	20/03/98	20/03/98	CSJN										
789	Informe de Resultados 2	1d	27/03/98	27/03/98											
790	Prueba de Ajustes	15d	23/03/98	10/04/98	CSJN										
791	Acept. Sistemas Fase 1	1d	13/04/98	13/04/98	CSJN										
792	Migración y Pruebas Fase 2	69d	09/02/98	30/04/98											
793	Preparación entrega	3d	09/02/98	11/02/98	CSJN										
794	Entrega Sistemas a migrar	0d	11/02/98	11/02/98	CSJN										
796	Análisis Sistemas recibidos	20d	17/02/98	16/03/98	Unisys										
798	Migración Sistemas Fase 1	28,5d	25/02/98	06/04/98	Unisys										
797	Conversión de datos prueba	18,5d	04/03/98	30/03/98	Unisys										
798	Pruebas Internas	23,5d	11/03/98	13/04/98	Unisys										
799	Documentación	23,5d	11/03/98	13/04/98	Unisys										
800	Entrega Sistemas migrados	0d	06/04/98	06/04/98	Unisys										
801	Prueba de Sistemas	10d	05/04/98	20/04/98	CSJN										
802	Informe de Resultados 1	1d	13/04/98	13/04/98	CSJN										
803	Informe de Resultados 2	1d	20/04/98	21/04/98											
804	Prueba de Ajustes 1	12d	14/04/98	29/04/98	CSJN										
806	Acept. Sistemas Fase 2	1d	30/04/98	30/04/98	CSJN										
806	Migración y Pruebas Fase 3	60d	23/02/98	15/06/98											
807	Preparación entrega	3d	23/02/98	25/02/98	CSJN										
808	Entrega Sistemas a migrar	0d	25/02/98	25/02/98	CSJN										
809	Análisis Sistemas recibidos	19,5d	03/03/98	30/03/98	Unisys										
810	Migración Sistemas Fase 1	28,5d	11/03/98	20/04/98	Unisys										
811	Conversión de datos prueba	18,5d	18/03/98	13/04/98	Unisys										
812	Pruebas Internas	23,5d	25/03/98	27/04/98	Unisys										
813	Documentación	23,5d	25/03/98	27/04/98	Unisys										

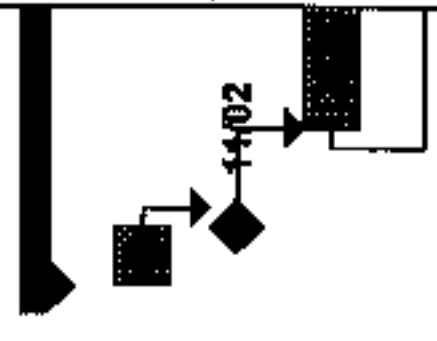


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
814	Entrega Sistemas migrados	0d	20/04/98	20/04/98	Unisys										
815	Prueba de Sistemas	10d	20/04/98	04/05/98	CSJN										
816	Informe de Resultados 1	1d	27/04/98	27/04/98	CSJN										
817	Informe de Resultados 2	1d	04/05/98	05/05/98											
818	Prueba de Ajustes	13d	28/04/98	14/05/98	CSJN										
819	Acept. Sistemas Fase 3	1d	15/05/98	15/05/98	CSJN										
820	Migración y Pruebas Fase 4	60d	16/03/98	05/06/98											
821	Preparación entrega	3d	16/03/98	18/03/98	CSJN										
822	Entrega Sistemas a migrar	0d	18/03/98	18/03/98	CSJN										
823	Análisis Sistemas recibidos	19,5d	24/03/98	20/04/98	Unisys										
824	Migración Sistemas Fase 1	28,5d	01/04/98	11/05/98	Unisys										
825	Conversión de datos prueba	18,5d	08/04/98	04/05/98	Unisys										
826	Pruebas Internas	23,5d	15/04/98	18/05/98	Unisys										
827	Documentación	23,5d	15/04/98	18/05/98	Unisys										
828	Entrega Sistemas migrados	0d	11/05/98	11/05/98	Unisys										
829	Prueba de Sistemas	10d	11/05/98	25/05/98	CSJN										
830	Informe de Resultados 1	1d	18/05/98	18/05/98	CSJN										
831	Informe de Resultados 2	1d	25/05/98	26/05/98											
832	Prueba de Ajustes	13d	19/05/98	04/06/98	CSJN										
833	Acept. Sistemas Fase 4	1d	05/06/98	05/06/98	CSJN										
834	Actualización de Sistemas	105d	19/12/97	16/06/98											
835	Actualización Fase 1	45d	14/04/98	15/06/98	CSJN										
836	Actualización Fase 2	32d	01/05/98	15/06/98	CSJN										
837	Actualización Fase 3	20,5d	18/05/98	15/06/98	CSJN										
838	Actualización Fase 4	5,5d	08/06/98	15/06/98	CSJN										
839	Soporte Actualización (Asist. Técnica)	1d	19/12/97	19/12/97	Unisys										


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
840	Prueba Integral del Sistema	21,6d	01/06/98	30/06/98											
841	Preparación de paquetes	4,5d	08/06/98	12/06/98											
842	Aceptación de paquetes	0,5d	12/06/98	12/06/98	CSJN										
843	Plan de Pruebas Integrales	6,5d	01/06/98	09/06/98	CSJN - Unisys										
844	Entrega Plan de Pruebas	1d	10/06/98	10/06/98	Unisys										
845	Aceptación Plan de Pruebas	1,5d	11/06/98	12/06/98	CSJN										
846	Pruebas Integrales	4,5d	15/06/98	19/06/98	CSJN										
847	Informe de Resultados	1d	19/06/98	19/06/98	CSJN										
848	Ajustes finales	2,5d	22/06/98	24/06/98	Unisys										
849	Prueba de Ajustes	1,5d	25/06/98	26/06/98	CSJN										
850	Entrega Diccionario de Datos	1d	29/06/98	29/06/98	Unisys										
851	Aceptación Sistema integral	1,5d	29/06/98	30/06/98	CSJN										
852	Capacitación	128d	22/12/97	17/07/98	Unisys/CSJN										
1130	Etapas III - Puesta en Marcha	18d	13/07/98	06/08/98	Unisys/CSJN										

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

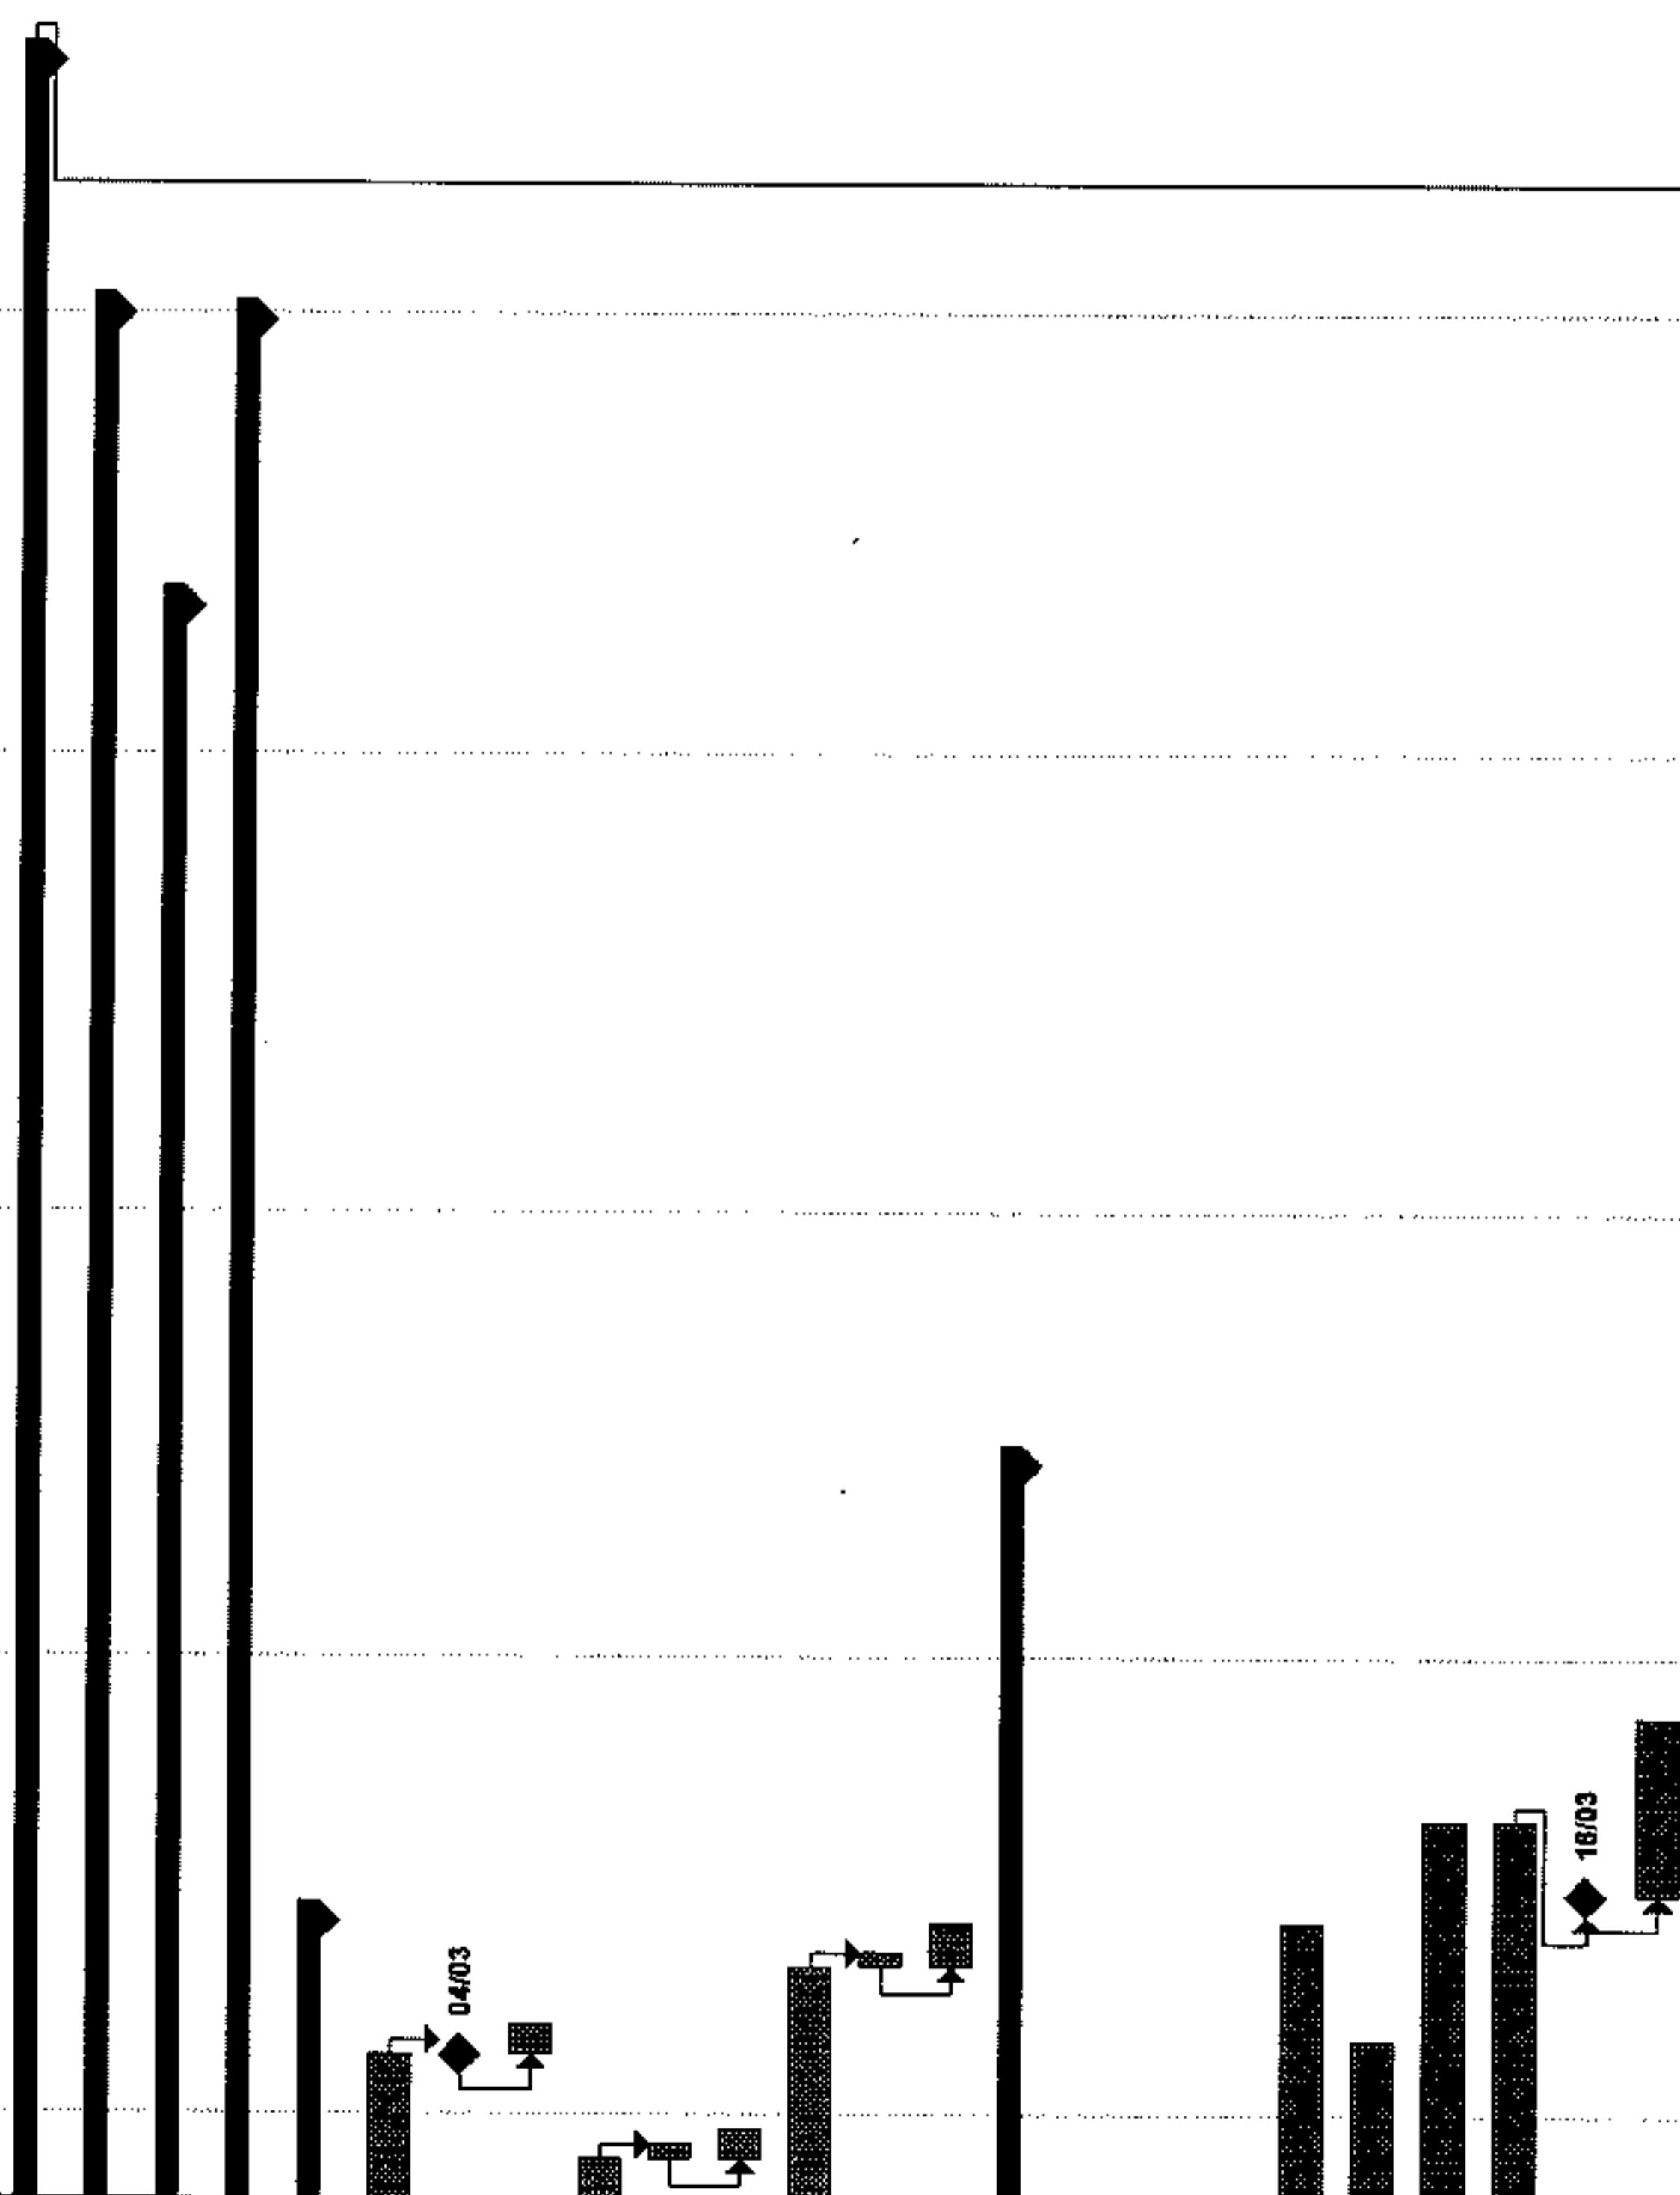



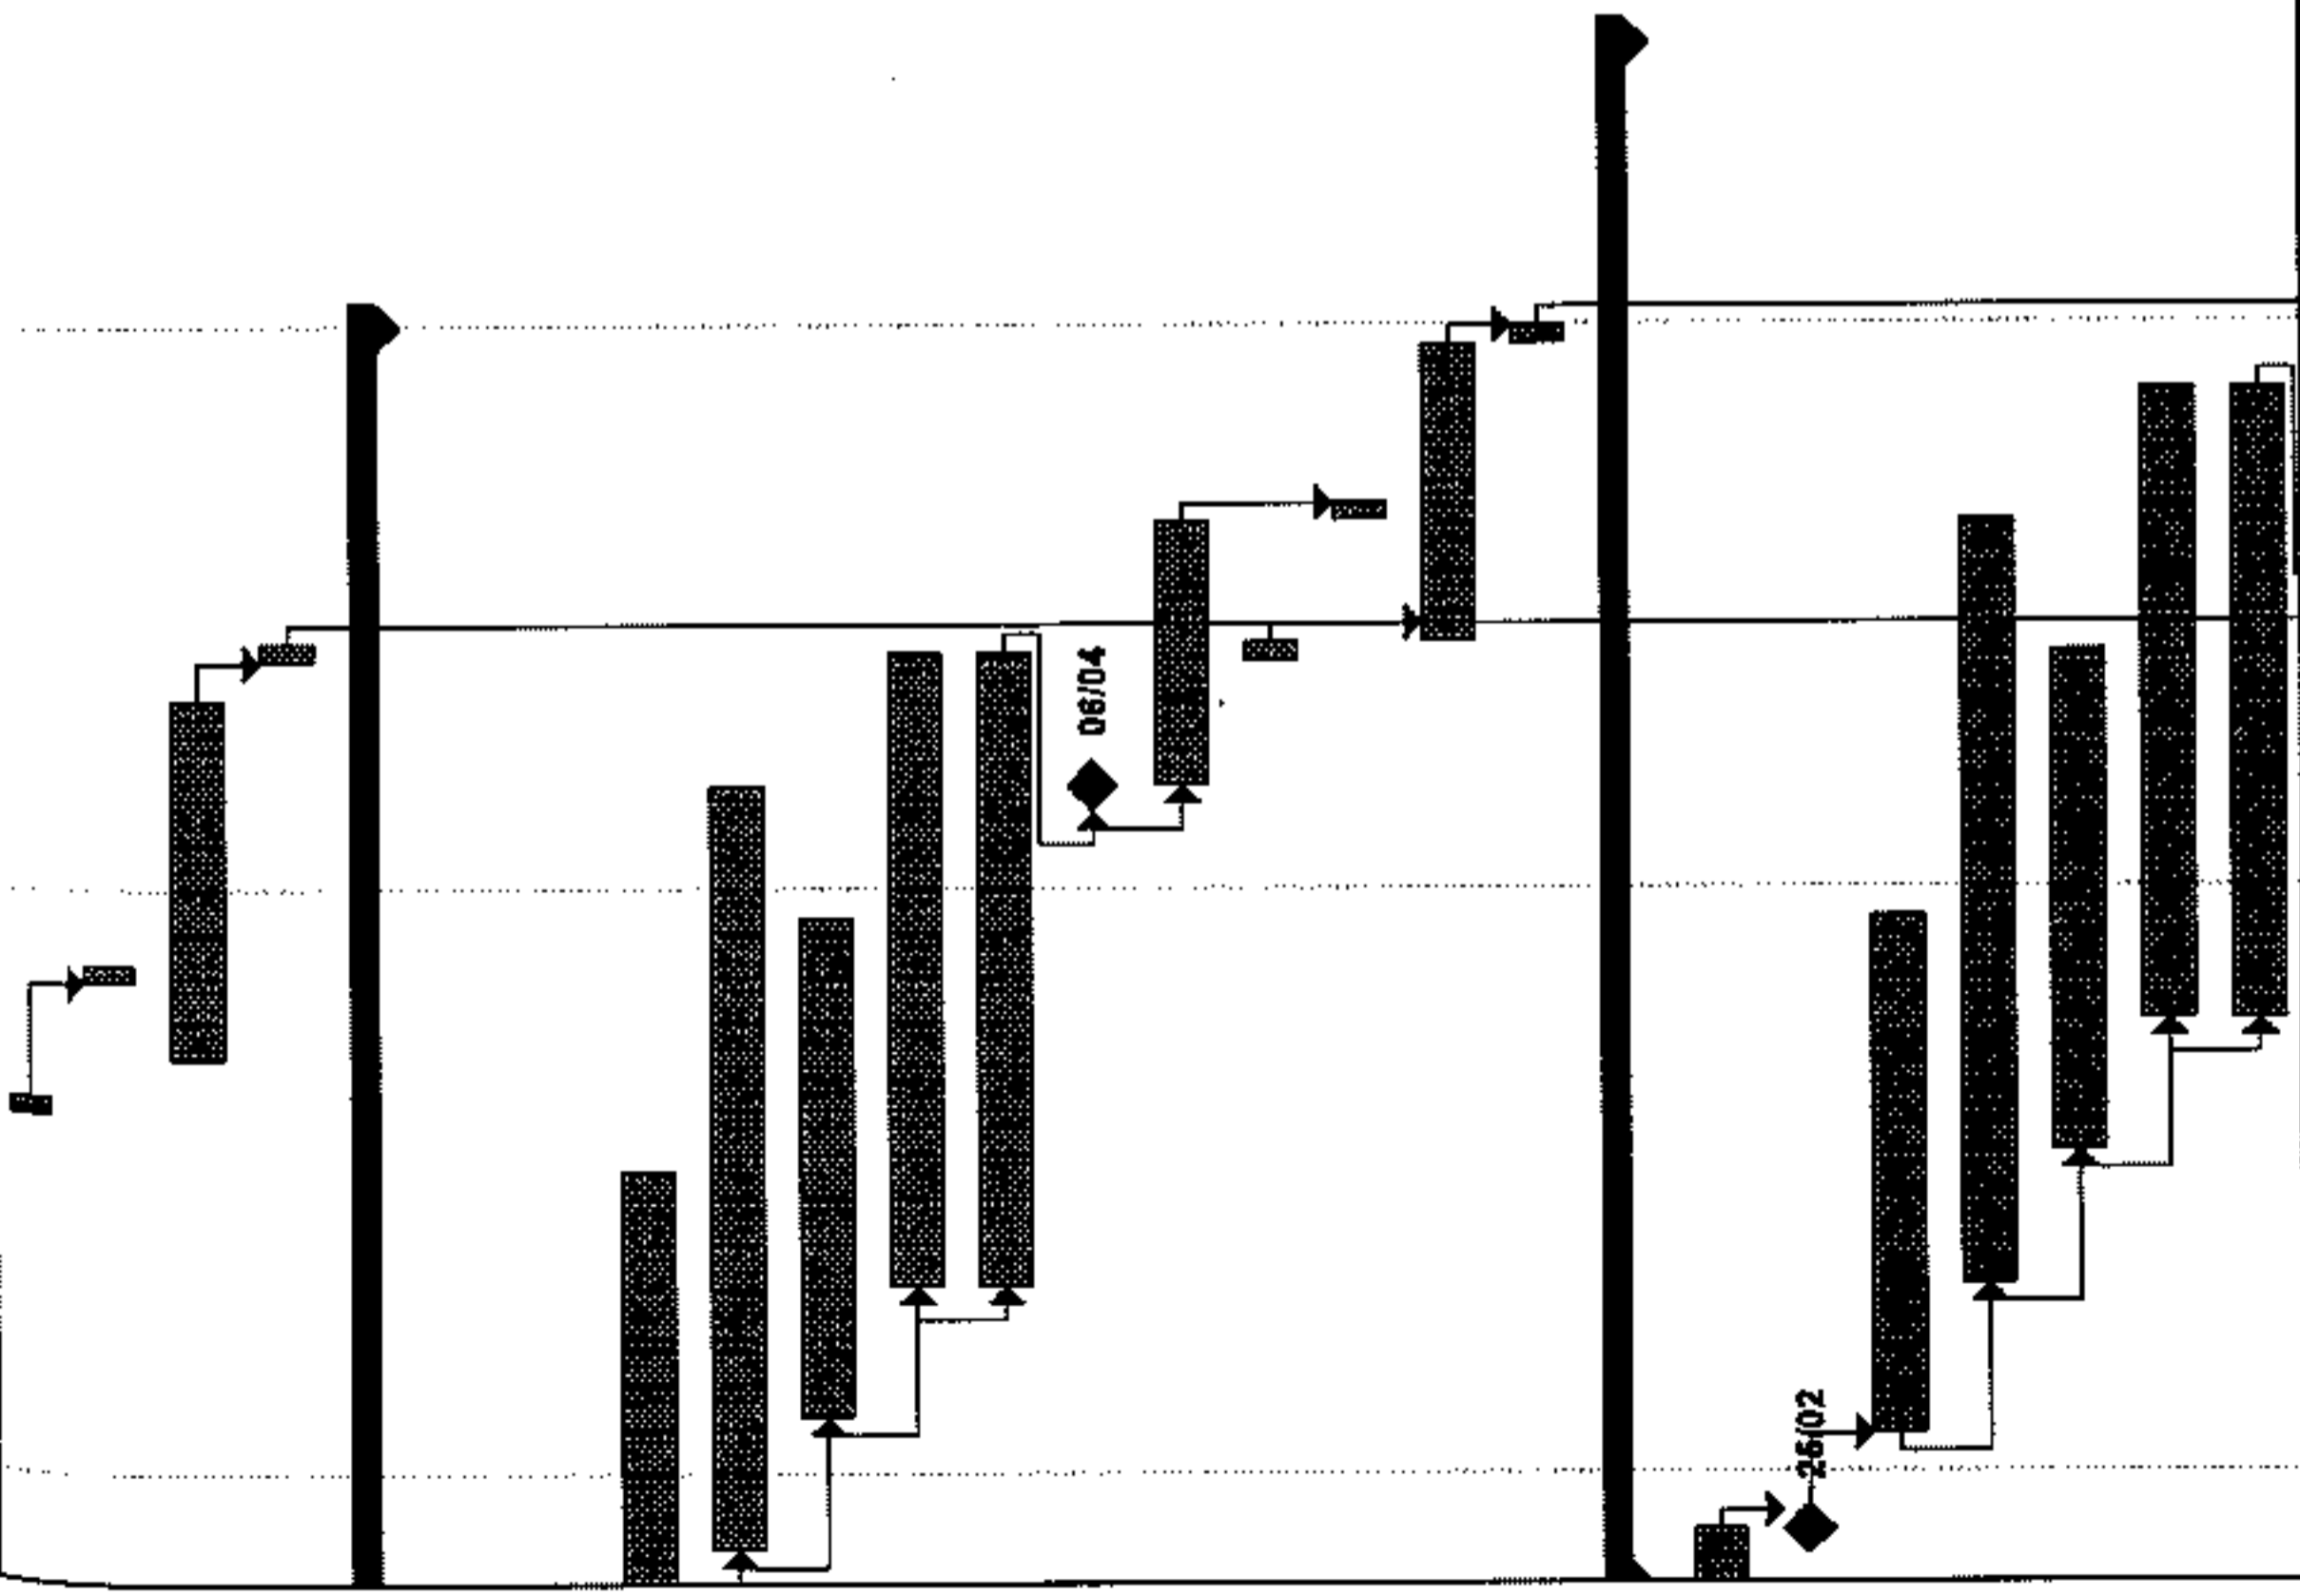

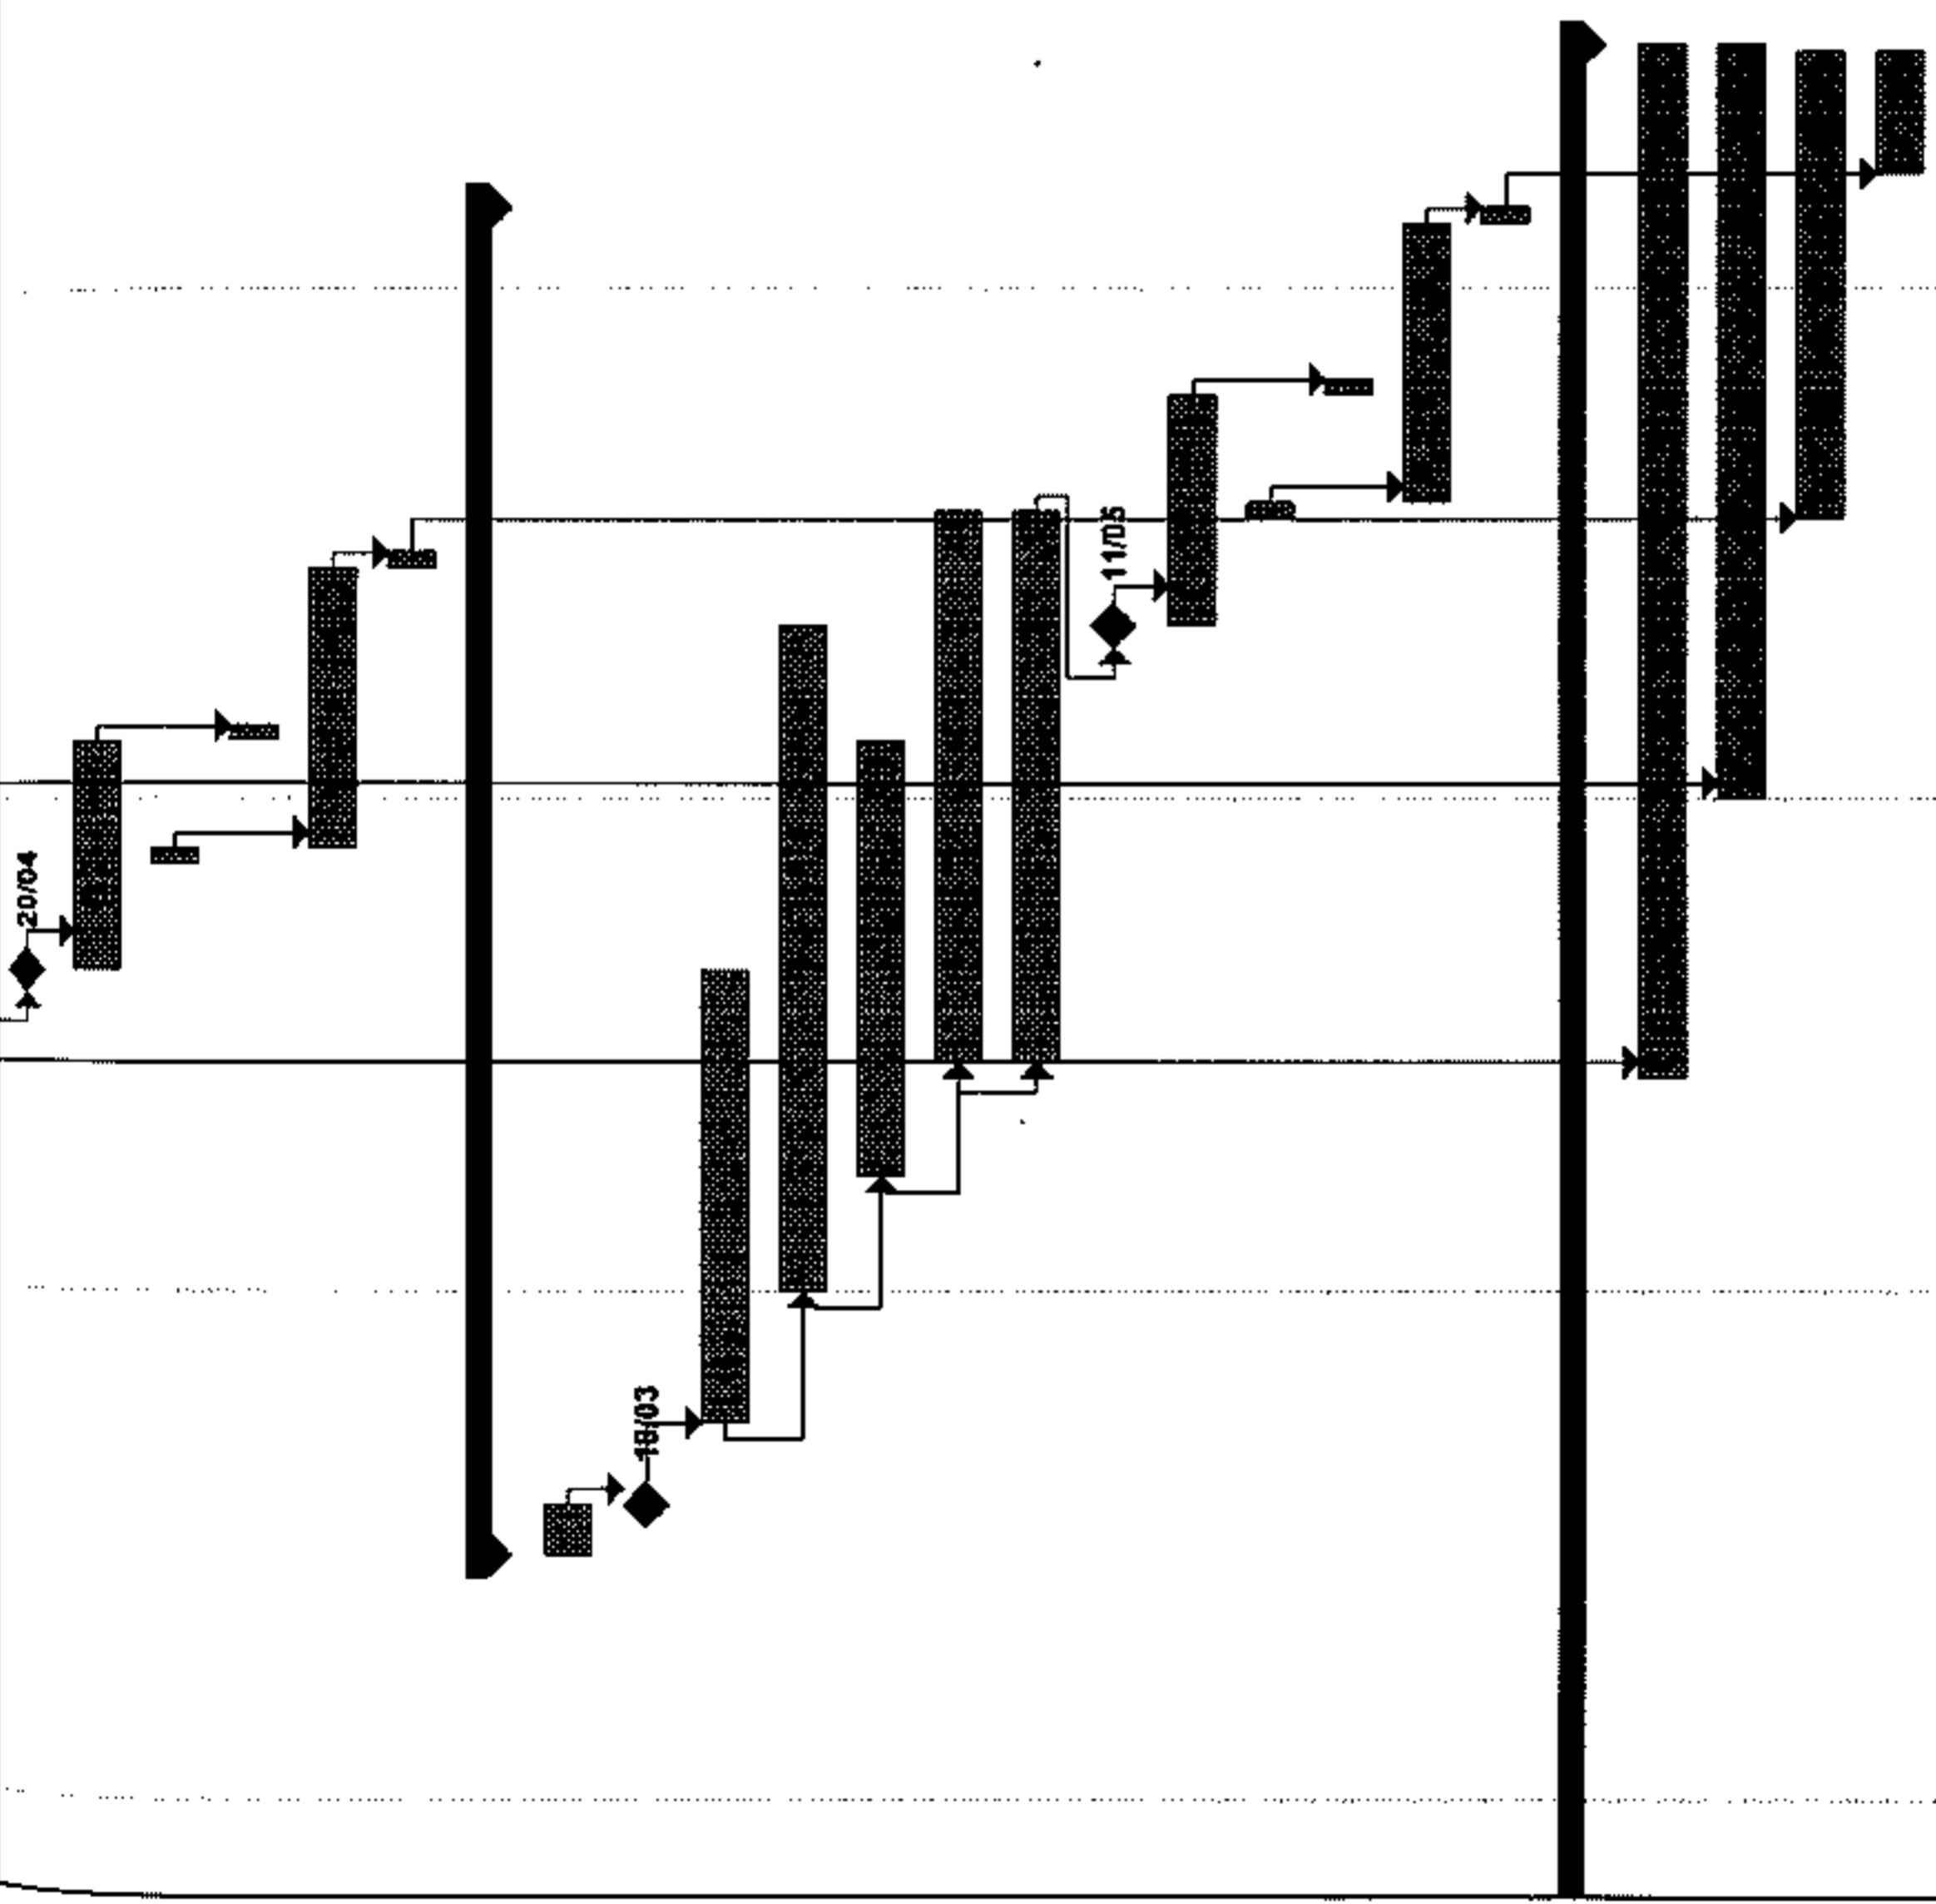

ID	Task Name	Duratic	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
1	Corfe Suprema de Justicia de la Nación	142d	19/12/97	05/08/98	Unisys/CSJN										
2	Etapla I - Definición y Planificación	12d	19/12/97	04/02/98	Unisys/CSJN										
9	Etapla II - Desarrollo de las actividades	129d	19/12/97	17/07/98	Unisys/CSJN										
10	Instalación	116d	19/12/97	30/06/98	Unisys/CSJN										
546	Solución Documental	102d	19/12/97	10/06/98	Unisys/CSJN										
767	Migración	115,6d	19/12/97	30/06/98	Unisys/CSJN										
852	Capacitación	128d	22/12/97	17/07/98	Unisys/CSJN										
853	inicio	0w	22/12/97	22/12/97	Unisys										
854	Capacitación usuarios (Grupos 2 y 4)	105d	23/02/98	17/07/98	Unisys										
855	Inicio	0w	23/02/98	23/02/98											
856	Interior/La Plata/San Martín	105d	23/02/98	17/07/98											
857	Jujuy-PC's	10d	30/03/98	10/04/98	30										
858	grupos 1 y 2	5d	30/03/98	03/04/98											
859	grupo 3	5d	06/04/98	10/04/98											
860	Jujuy - BRS/Search	5d	13/04/98	17/04/98											
861	Grupo 1	5d	13/04/98	17/04/98											
862	Paraná - PC's	15d	27/04/98	15/05/98	50										
863	grupos 1 y 2	5d	27/04/98	01/05/98											
864	grupos 3 y 4	5d	04/05/98	08/05/98											
865	grupo 5	5d	11/05/98	15/05/98											
866	Parana - BRS/Search	6d	18/05/98	22/05/98											
867	Grupo 1	5d	18/05/98	22/05/98											
868	Catamarca - PC's	6d	04/05/98	08/05/98	20										
869	grupos 1 y 2	5d	04/05/98	08/05/98											
870	Catamarca - BRS/Search	6d	11/05/98	15/05/98											
871	Grupo 1	5d	11/05/98	15/05/98											

22/12

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
872	San Martin (Bz. As) PC's	25d	02/03/98	03/04/98	90										
873	grupos 1 y 2	5d	02/03/98	06/03/98											
874	grupos 3 y 4	5d	09/03/98	13/03/98											
875	grupos 5 y 6	5d	16/03/98	20/03/98											
876	grupos 7 y 8	5d	23/03/98	27/03/98											
877	grupo 9	5d	30/03/98	03/04/98											
878	grupos 1 y 2	5d	02/03/98	06/03/98											
879	grupos 3 y 4	5d	09/03/98	13/03/98											
880	grupos 5 y 6	5d	16/03/98	20/03/98											
881	grupos 7 y 8	5d	23/03/98	27/03/98											
882	grupo 9	5d	30/03/98	03/04/98											
883	San Martin - BRS/Search	5d	06/04/98	10/04/98											
884	Grupo 1 y 2	5d	06/04/98	10/04/98											
885	Salta PC's	5d	25/05/98	29/05/98	20										
886	grupos 1 y 2	5d	25/05/98	29/05/98											
887	Salta BRS/Search	5d	01/06/98	05/06/98											
888	Grupo 1	5d	01/06/98	05/06/98											
889	La Plata PC's	35d	20/04/98	05/06/98	130										
890	grupos 1 y 2	5d	20/04/98	24/04/98											
891	grupos 3 y 4	5d	27/04/98	01/05/98											
892	grupos 5 y 6	5d	04/05/98	08/05/98											
893	grupos 7 y 8	5d	11/05/98	15/05/98											
894	grupos 9 y 10	5d	18/05/98	22/05/98											
895	grupos 11 y 12	5d	25/05/98	29/05/98											
896	grupo 13	5d	01/06/98	05/06/98											
897	La Plata BRS/Search	10d	08/06/98	19/06/98											

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
898	Grupo 1 y 2	5d	08/06/98	12/06/98											
899	Grupo 3	5d	15/06/98	19/06/98											
900	La Rioja PC's	5d	15/06/98	19/06/98	20										
901	grupos 1 y 2	5d	15/06/98	19/06/98											
902	La Rioja BRS/Search	5d	22/06/98	26/06/98											
903	Grupo 1	5d	22/06/98	26/06/98											
904	Tucumán PC's	20d	23/02/98	20/03/98	80										
905	grupos 1 y 2	5d	23/02/98	27/02/98											
906	grupos 3 y 4	5d	02/03/98	06/03/98											
907	grupos 5 y 6	5d	09/03/98	13/03/98											
908	grupos 7 y 8	5d	16/03/98	20/03/98											
909	Tucuman BRS/Search	5d	23/03/98	27/03/98											
910	Grupo 1	5d	23/03/98	27/03/98											
911	Santa Fé PC's	10d	01/06/98	12/06/98	40										
912	grupo 1 y 2	5d	01/06/98	05/06/98											
913	grupo 3 y 4	5d	08/06/98	12/06/98											
914	Santa Fé BRS/Search	5d	15/06/98	19/06/98											
915	Grupo 1	5d	15/06/98	19/06/98											
916	Córdoba PC's	30d	23/02/98	03/04/98	120										
917	grupos 1 y 2	5d	23/02/98	27/02/98											
918	grupos 3 y 4	5d	02/03/98	06/03/98											
919	grupos 5 y 6	5d	09/03/98	13/03/98											
920	grupos 7 y 8	5d	16/03/98	20/03/98											
921	grupos 9 y 10	5d	23/03/98	27/03/98											
922	grupos 11 y 12	5d	30/03/98	03/04/98											
923	Cordoba BRS/Search	10d	06/04/98	17/04/98											

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
924	Grupo 1 y 2	5d	06/04/98	10/04/98											
925	Grupo 3	5d	13/04/98	17/04/98											
926	Santiago del Estero PC's	10d	29/06/98	10/07/98	30										
927	grupos 1 y 2	5d	29/06/98	03/07/98											
928	grupo 3	5d	06/07/98	10/07/98											
929	S. del Estero BRS/Search	5d	13/07/98	17/07/98											
930	Grupo 1	5d	13/07/98	17/07/98											
931	CAPITAL	96d	23/02/98	03/07/98											
932	PC's	90d	23/02/98	26/06/98											
933	Grupos 1 a 16	5d	23/02/98	27/02/98											
934	Grupos 17 a 32	5d	02/03/98	06/03/98											
935	Grupos 33 A 48	5d	09/03/98	13/03/98											
936	Grupos 49 a 64	5d	16/03/98	20/03/98											
937	Grupos 65 a 80	5d	23/03/98	27/03/98											
938	Grupos 81 a 96	5d	30/03/98	03/04/98											
939	Grupos 97 a 112	5d	06/04/98	10/04/98											
940	Grupos 113 a 128	5d	13/04/98	17/04/98											
941	Grupos 129 a 144	5d	20/04/98	24/04/98											
942	Grupos 145 a 160	5d	27/04/98	01/05/98											
943	Grupos 161 a 176	5d	04/05/98	08/05/98											
944	Grupos 177 a 192	5d	11/05/98	15/05/98											
945	Grupos 193 a 208	5d	18/05/98	22/05/98											
946	Grupos 209 a 224	5d	25/05/98	29/05/98											
947	Grupos 225 a 240	5d	01/06/98	05/06/98											
948	Grupos 241 a 256	5d	08/06/98	12/06/98											
949	Grupos 257 a 272	5d	15/06/98	19/06/98											

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
950	Grupos 273 a 287	5d	22/06/98	28/06/98											
951	BRS/Search	80d	16/03/98	03/07/98											
952	Grupos 1 a 8	5d	16/03/98	20/03/98											
953	Grupos 9 a 16	5d	23/03/98	27/03/98											
954	Grupos 17 a 24	5d	30/03/98	03/04/98											
955	Grupos 25 a 32	5d	06/04/98	10/04/98											
956	Grupos 33 a 40	5d	13/04/98	17/04/98											
957	Grupos 41 a 48	5d	20/04/98	24/04/98											
958	Grupos 49 a 56	5d	27/04/98	01/05/98											
959	Grupos 57 a 64	5d	04/05/98	08/05/98											
960	Grupos 65 a 72	5d	11/05/98	15/05/98											
961	Grupos 73 a 80	5d	18/05/98	22/05/98											
962	Grupos 81 a 88	5d	25/05/98	29/05/98											
963	Grupos 89 a 96	5d	01/06/98	05/06/98											
964	Grupos 97 a 104	5d	08/06/98	12/06/98											
965	Grupos 105 a 112	5d	15/06/98	19/06/98											
966	Grupos 113 a 120	5d	22/06/98	26/06/98											
967	Grupos 121 a 128	5d	29/06/98	03/07/98											
968	Grupos 129 a 133	5d	29/06/98	03/07/98											
969	Capacitación - Grupo I	96d	23/02/98	03/07/98											
970	Personal de Sistemas	96d	23/02/98	03/07/98											
971	Grupo A - Buenos Aires	26d	23/02/98	27/03/98											
972	Introducción Unix	5d	23/02/98	27/02/98											
973	Administración Unix	5d	02/03/98	06/03/98											
974	Base de Datos I	5d	09/03/98	13/03/98											
975	Base de Datos II	5d	16/03/98	20/03/98											

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
976	Comunicaciones y redes	5d	23/03/98	27/03/98											
977	Grupo B - Buenos Aires	26d	23/03/98	24/04/98											
978	Introduccion Unix	5d	23/03/98	27/03/98											
979	Administracion Unix	5d	30/03/98	03/04/98											
980	Base de Datos I	5d	06/04/98	10/04/98											
981	Base de Datos II	5d	13/04/98	17/04/98											
982	Comunicaciones y redes	5d	20/04/98	24/04/98											
983	La Plata	20d	27/04/98	22/05/98											
984	Introduccion Unix	5d	27/04/98	01/05/98											
985	Administracion Unix	5d	04/05/98	08/05/98											
986	Base de Datos I	5d	11/05/98	15/05/98											
987	Base de Datos II	5d	18/05/98	22/05/98											
988	Grupo C-Buenos Aires	26d	25/05/98	26/06/98											
989	Introduccion Unix	5d	25/05/98	29/05/98											
990	Administracion Unix	5d	01/06/98	05/06/98											
991	Base de Datos I	5d	08/06/98	12/06/98											
992	Base de Datos II	5d	15/06/98	19/06/98											
993	Comunicaciones y redes	5d	22/06/98	26/06/98											
994	Jujuy	20d	26/06/98	19/06/98											
995	Introduccion Unix	5d	25/05/98	29/05/98											
996	Administracion Unix	5d	01/06/98	05/06/98											
997	Base de Datos I	5d	08/06/98	12/06/98											
998	Base de Datos II	5d	15/06/98	19/06/98											
999	Paraná	20d	23/02/98	20/03/98											
1000	Introduccion Unix	5d	23/02/98	27/02/98											
1001	Administracion Unix	5d	02/03/98	06/03/98											




ID	Task Name	Duratic	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11
1002	Base de Datos I	5d	09/03/98	13/03/98												
1003	Base de Datos II	5d	16/03/98	20/03/98												
1004	Tucuman	20d	06/04/98	01/05/98												
1005	Introduccion Unix	5d	06/04/98	10/04/98												
1006	Administracion Unix	5d	13/04/98	17/04/98												
1007	Base de Datos I	5d	20/04/98	24/04/98												
1008	Base de Datos II	5d	27/04/98	01/05/98												
1009	Córdoba	20d	08/06/98	03/07/98												
1010	Introduccion Unix	5d	08/06/98	12/06/98												
1011	Administracion Unix	5d	15/06/98	19/06/98												
1012	Base de Datos I	5d	22/06/98	26/06/98												
1013	Base de Datos II	5d	29/06/98	03/07/98												
1014	Capacitación -Grupo 3-	100d	09/02/98	26/06/98												
1016	Personal de Sistemas	5d	04/05/98	08/05/98												
1016	BRS/Search	5d	04/05/98	08/05/98												
1017	Interior/La Plata/San Martin	100d	09/02/98	26/06/98	Unisys											
1018	Jujuy-PC's	10d	30/03/98	10/04/98	Unisys											
1019	grupos 1 y 2	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys											
1020	grupo 3	5d	06/04/98	10/04/98	Unisys											
1021	Jujuy - BRS/Search	6d	13/04/98	17/04/98	Unisys											
1022	Grupo 1	5d	13/04/98	17/04/98	Unisys											
1023	Paraná - PC's	16d	20/04/98	08/05/98	Unisys											
1024	grupos 1 y 2	5d	20/04/98	24/04/98	Unisys											
1025	grupos 3 y 4	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys											
1026	grupo 5	5d	04/05/98	08/05/98	Unisys											
1027	Parana - BRS/Search	5d	11/05/98	16/05/98	Unisys											

ID	Task Name	Charitic	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	WB	WB	W10	
1028	Grupo 1	5d	11/05/98	15/05/98	Unisys											
1029	Catamarca - PC's	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys											
1030	grupos 1 y 2	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys											
1031	Catamarca - BRS/Search	6d	04/05/98	08/05/98	Unisys											
1032	Grupo 1	5d	04/05/98	08/05/98	Unisys											
1033	San Martin (Bs. As) PC's	60d	02/03/98	22/05/98	Unisys											
1034	grupos 1 y 2	5d	02/03/98	06/03/98	Unisys											
1035	grupos 3 y 4	5d	09/03/98	13/03/98	Unisys											
1036	grupos 5 y 6	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys											
1037	grupos 7 y 8	5d	23/03/98	27/03/98	Unisys											
1038	grupo 9	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys											
1039	grupos 1 y 2	5d	20/04/98	24/04/98	Unisys											
1040	grupos 3 y 4	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys											
1041	grupos 5 y 6	5d	04/05/98	08/05/98	Unisys											
1042	grupos 7 y 8	5d	11/05/98	15/05/98	Unisys											
1043	grupo 9	5d	18/05/98	22/05/98	Unisys											
1044	San Martin - BRS/Search	5d	26/05/98	29/05/98	Unisys											
1045	Grupo 1 y 2	5d	25/05/98	29/05/98	Unisys											
1046	Salta PC's	5d	18/06/98	22/06/98	Unisys											
1047	grupos 1 y 2	5d	18/05/98	22/05/98	Unisys											
1048	Salta BRS/Search	5d	26/06/98	29/06/98	Unisys											
1049	Grupo 1	5d	25/05/98	29/05/98	Unisys											
1050	La Plata PC's	36d	09/02/98	27/03/98	Unisys											
1051	grupos 1 y 2	5d	09/02/98	13/02/98	Unisys											
1052	grupos 3 y 4	5d	16/02/98	20/02/98	Unisys											
1053	grupos 5 y 6	5d	23/02/98	27/02/98	Unisys											


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
1054	grupos 7 y 8	5d	02/03/98	06/03/98	Unisys										
1055	grupos 9 y 10	5d	09/03/98	13/03/98	Unisys										
1056	grupos 11 y 12	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1057	grupo 13	5d	23/03/98	27/03/98	Unisys										
1058	La Plata BRS/Search	10d	30/03/98	10/04/98	Unisys										
1059	Grupo 1 y 2	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys										
1060	Grupo 3	5d	06/04/98	10/04/98	Unisys										
1061	La Rioja PC's	6d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1062	grupos 1 y 2	5d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1063	La Rioja BRS/Search	6d	15/06/98	19/06/98	Unisys										
1064	Grupo 1	5d	15/06/98	19/06/98	Unisys										
1065	Tucumán PC's	20d	16/02/98	13/03/98	Unisys										
1066	grupos 1 y 2	5d	16/02/98	20/02/98	Unisys										
1067	grupos 3 y 4	5d	23/02/98	27/02/98	Unisys										
1068	grupos 5 y 6	5d	02/03/98	06/03/98	Unisys										
1069	grupos 7 y 8	5d	09/03/98	13/03/98	Unisys										
1070	Tucuman BRS/Search	6d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1071	Grupo 1	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1072	Santa Fé PC's	10d	25/06/98	06/06/98	Unisys										
1073	grupo 1 y 2	5d	25/05/98	29/05/98	Unisys										
1074	grupo 3 y 4	5d	01/06/98	05/06/98	Unisys										
1075	Santa Fé BRS/Search	6d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1076	Grupo 1	5d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1077	Córdoba PC's	30d	16/02/98	27/03/98	Unisys										
1078	grupos 1 y 2	5d	16/02/98	20/02/98	Unisys										
1079	grupos 3 y 4	5d	23/02/98	27/02/98	Unisys										

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
1080	grupos 5 y 6	5d	02/03/98	06/03/98	Unisys										
1081	grupos 7 y 8	5d	09/03/98	13/03/98	Unisys										
1082	grupos 9 y 10	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1083	grupos 11 y 12	5d	23/03/98	27/03/98	Unisys										
1084	Cordoba BRS/Search	10d	30/03/98	16/04/98	Unisys										
1085	Grupo 1 y 2	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys										
1086	Grupo 3	5d	06/04/98	10/04/98	Unisys										
1087	Santiago del Estero PC's	10d	08/06/98	19/06/98	Unisys										
1088	grupos 1 y 2	5d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1088	grupo 3	5d	15/06/98	19/06/98	Unisys										
1090	S. del Estero BRS/Search	6d	22/06/98	26/06/98	Unisys										
1091	Grupo 1	5d	22/06/98	26/06/98	Unisys										
1092	CAPITAL	96d	16/02/98	26/06/98	Unisys										
1093	PC's	90d	16/02/98	19/06/98	Unisys										
1094	Grupos 1 a 16	5d	16/02/98	20/02/98	Unisys										
1095	Grupos 17 a 32	5d	23/02/98	27/02/98	Unisys										
1096	Grupos 33 A 48	5d	02/03/98	06/03/98	Unisys										
1097	Grupos 49 a 64	5d	09/03/98	13/03/98	Unisys										
1098	Grupos 65 a 80	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1099	Grupos 81 a 96	5d	23/03/98	27/03/98	Unisys										
1100	Grupos 97 a 112	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys										
1101	Grupos 113 a 128	5d	06/04/98	10/04/98	Unisys										
1102	Grupos 129 a 144	5d	13/04/98	17/04/98	Unisys										
1103	Grupos 145 a 160	5d	20/04/98	24/04/98	Unisys										
1104	Grupos 161 a 176	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys										
1106	Grupos 177 a 192	5d	04/05/98	08/05/98	Unisys										


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsible	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
1106	Grupos 193 a 208	5d	11/05/98	15/05/98	Unisys										
1107	Grupos 209 a 224	5d	18/05/98	22/05/98	Unisys										
1108	Grupos 225 a 240	5d	25/05/98	29/05/98	Unisys										
1109	Grupos 241 a 256	5d	01/06/98	05/06/98	Unisys										
1110	Grupos 257 a 272	5d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1111	Grupos 273 a 287	5d	15/06/98	19/06/98	Unisys										
1112	BRS/Search	76d	16/03/98	26/06/98	Unisys										
1113	Grupos 1 a 8	5d	16/03/98	20/03/98	Unisys										
1114	Grupos 9 a 16	5d	23/03/98	27/03/98	Unisys										
1115	Grupos 17 a 24	5d	30/03/98	03/04/98	Unisys										
1116	Grupos 25 a 32	5d	06/04/98	10/04/98	Unisys										
1117	Grupos 33 a 40	5d	13/04/98	17/04/98	Unisys										
1118	Grupos 41 a 48	5d	20/04/98	24/04/98	Unisys										
1119	Grupos 49 a 56	5d	27/04/98	01/05/98	Unisys										
1120	Grupos 57 a 64	5d	04/05/98	08/05/98	Unisys										
1121	Grupos 65 a 72	5d	11/05/98	15/05/98	Unisys										
1122	Grupos 73 a 80	5d	18/05/98	22/05/98	Unisys										
1123	Grupos 81 a 88	5d	25/05/98	29/05/98	Unisys										
1124	Grupos 89 a 96	5d	01/06/98	05/06/98	Unisys										
1125	Grupos 97 a 104	5d	08/06/98	12/06/98	Unisys										
1126	Grupos 105 a 112	5d	15/06/98	19/06/98	Unisys										
1127	Grupos 113 a 120	5d	22/06/98	26/06/98	Unisys										
1128	Grupos 121 a 128	5d	22/06/98	26/06/98	Unisys										
1129	Grupos 129 a 133	5d	22/06/98	26/06/98	Unisys										
1130	Etapa III - Puesta en Marcha	18d	13/07/98	05/08/98	Unisys/CSJN										

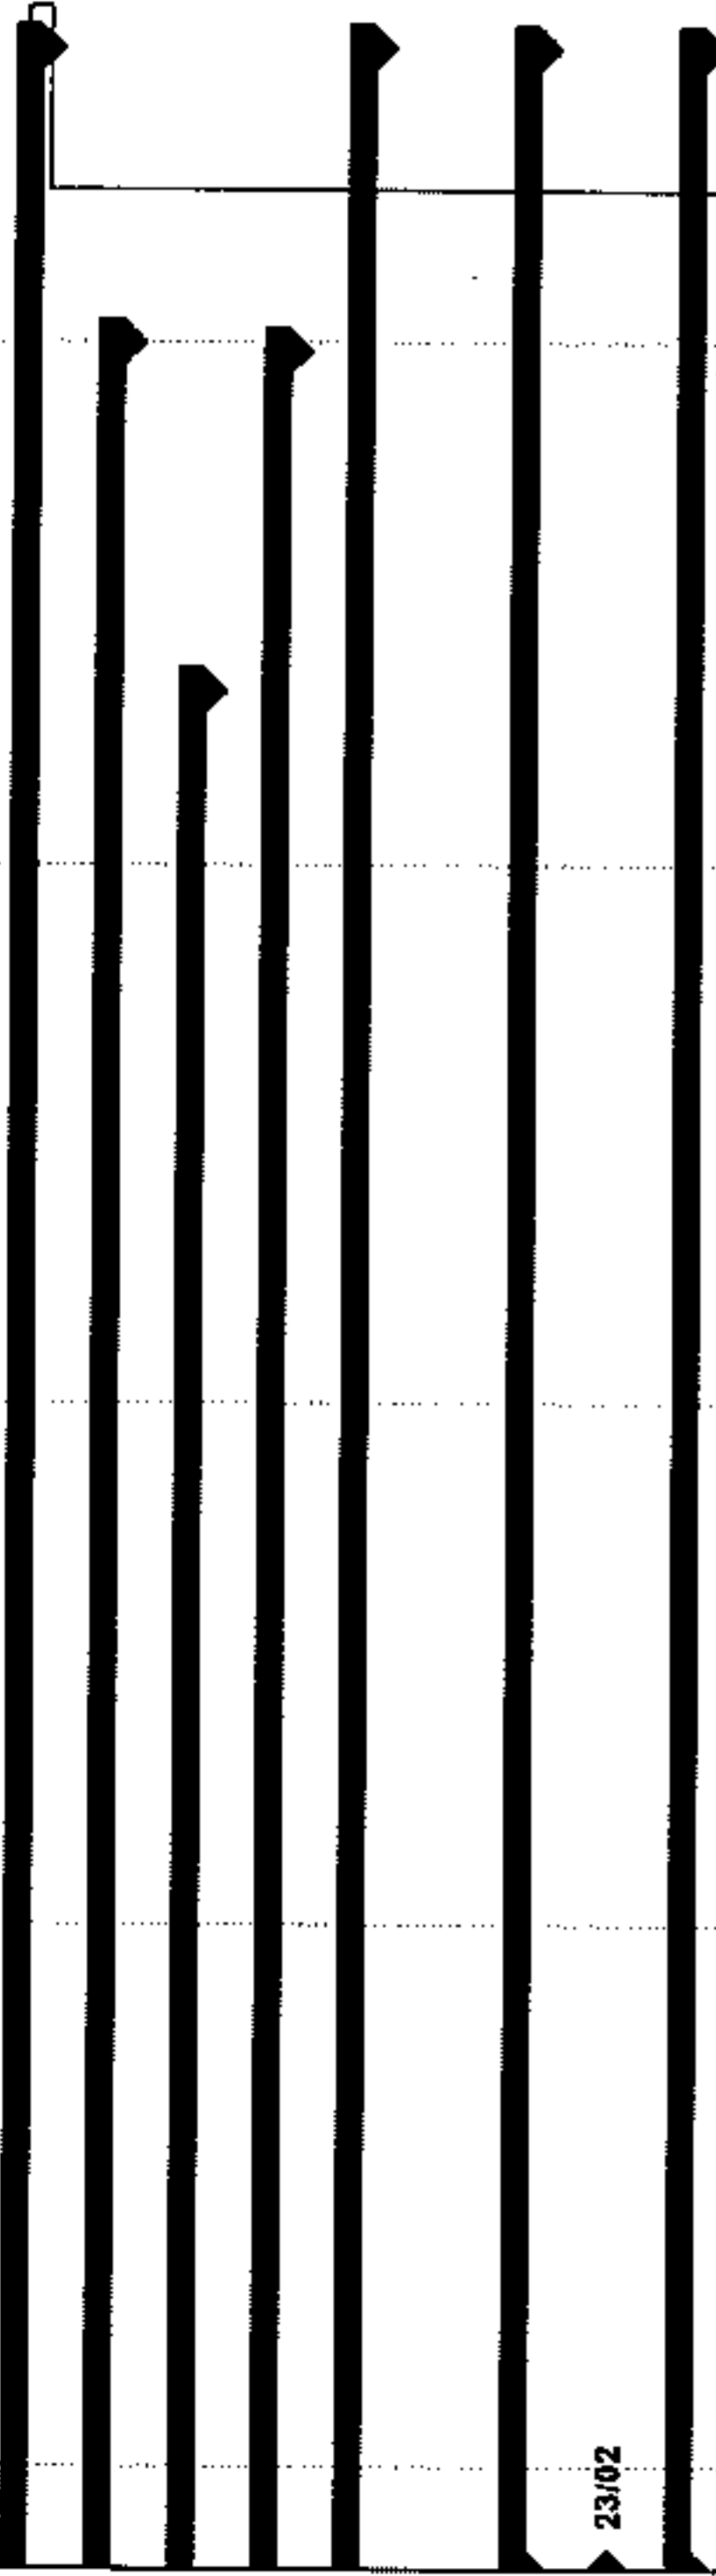





23/02

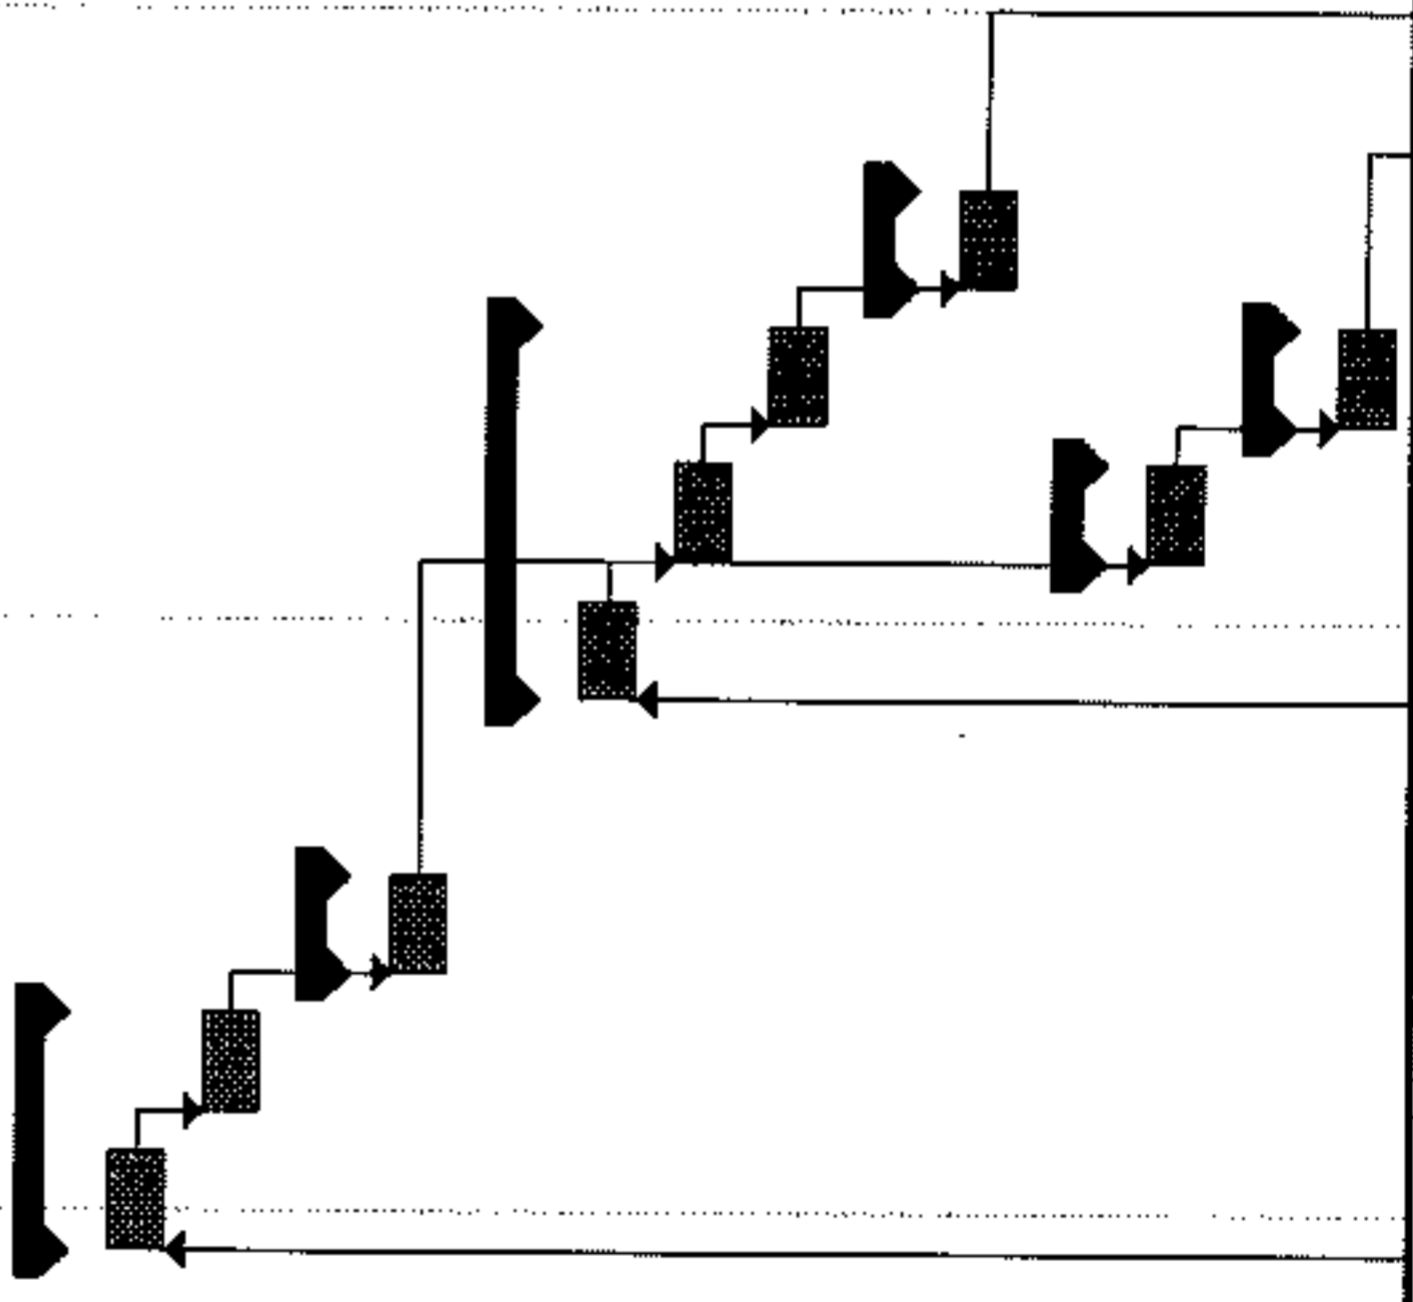

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

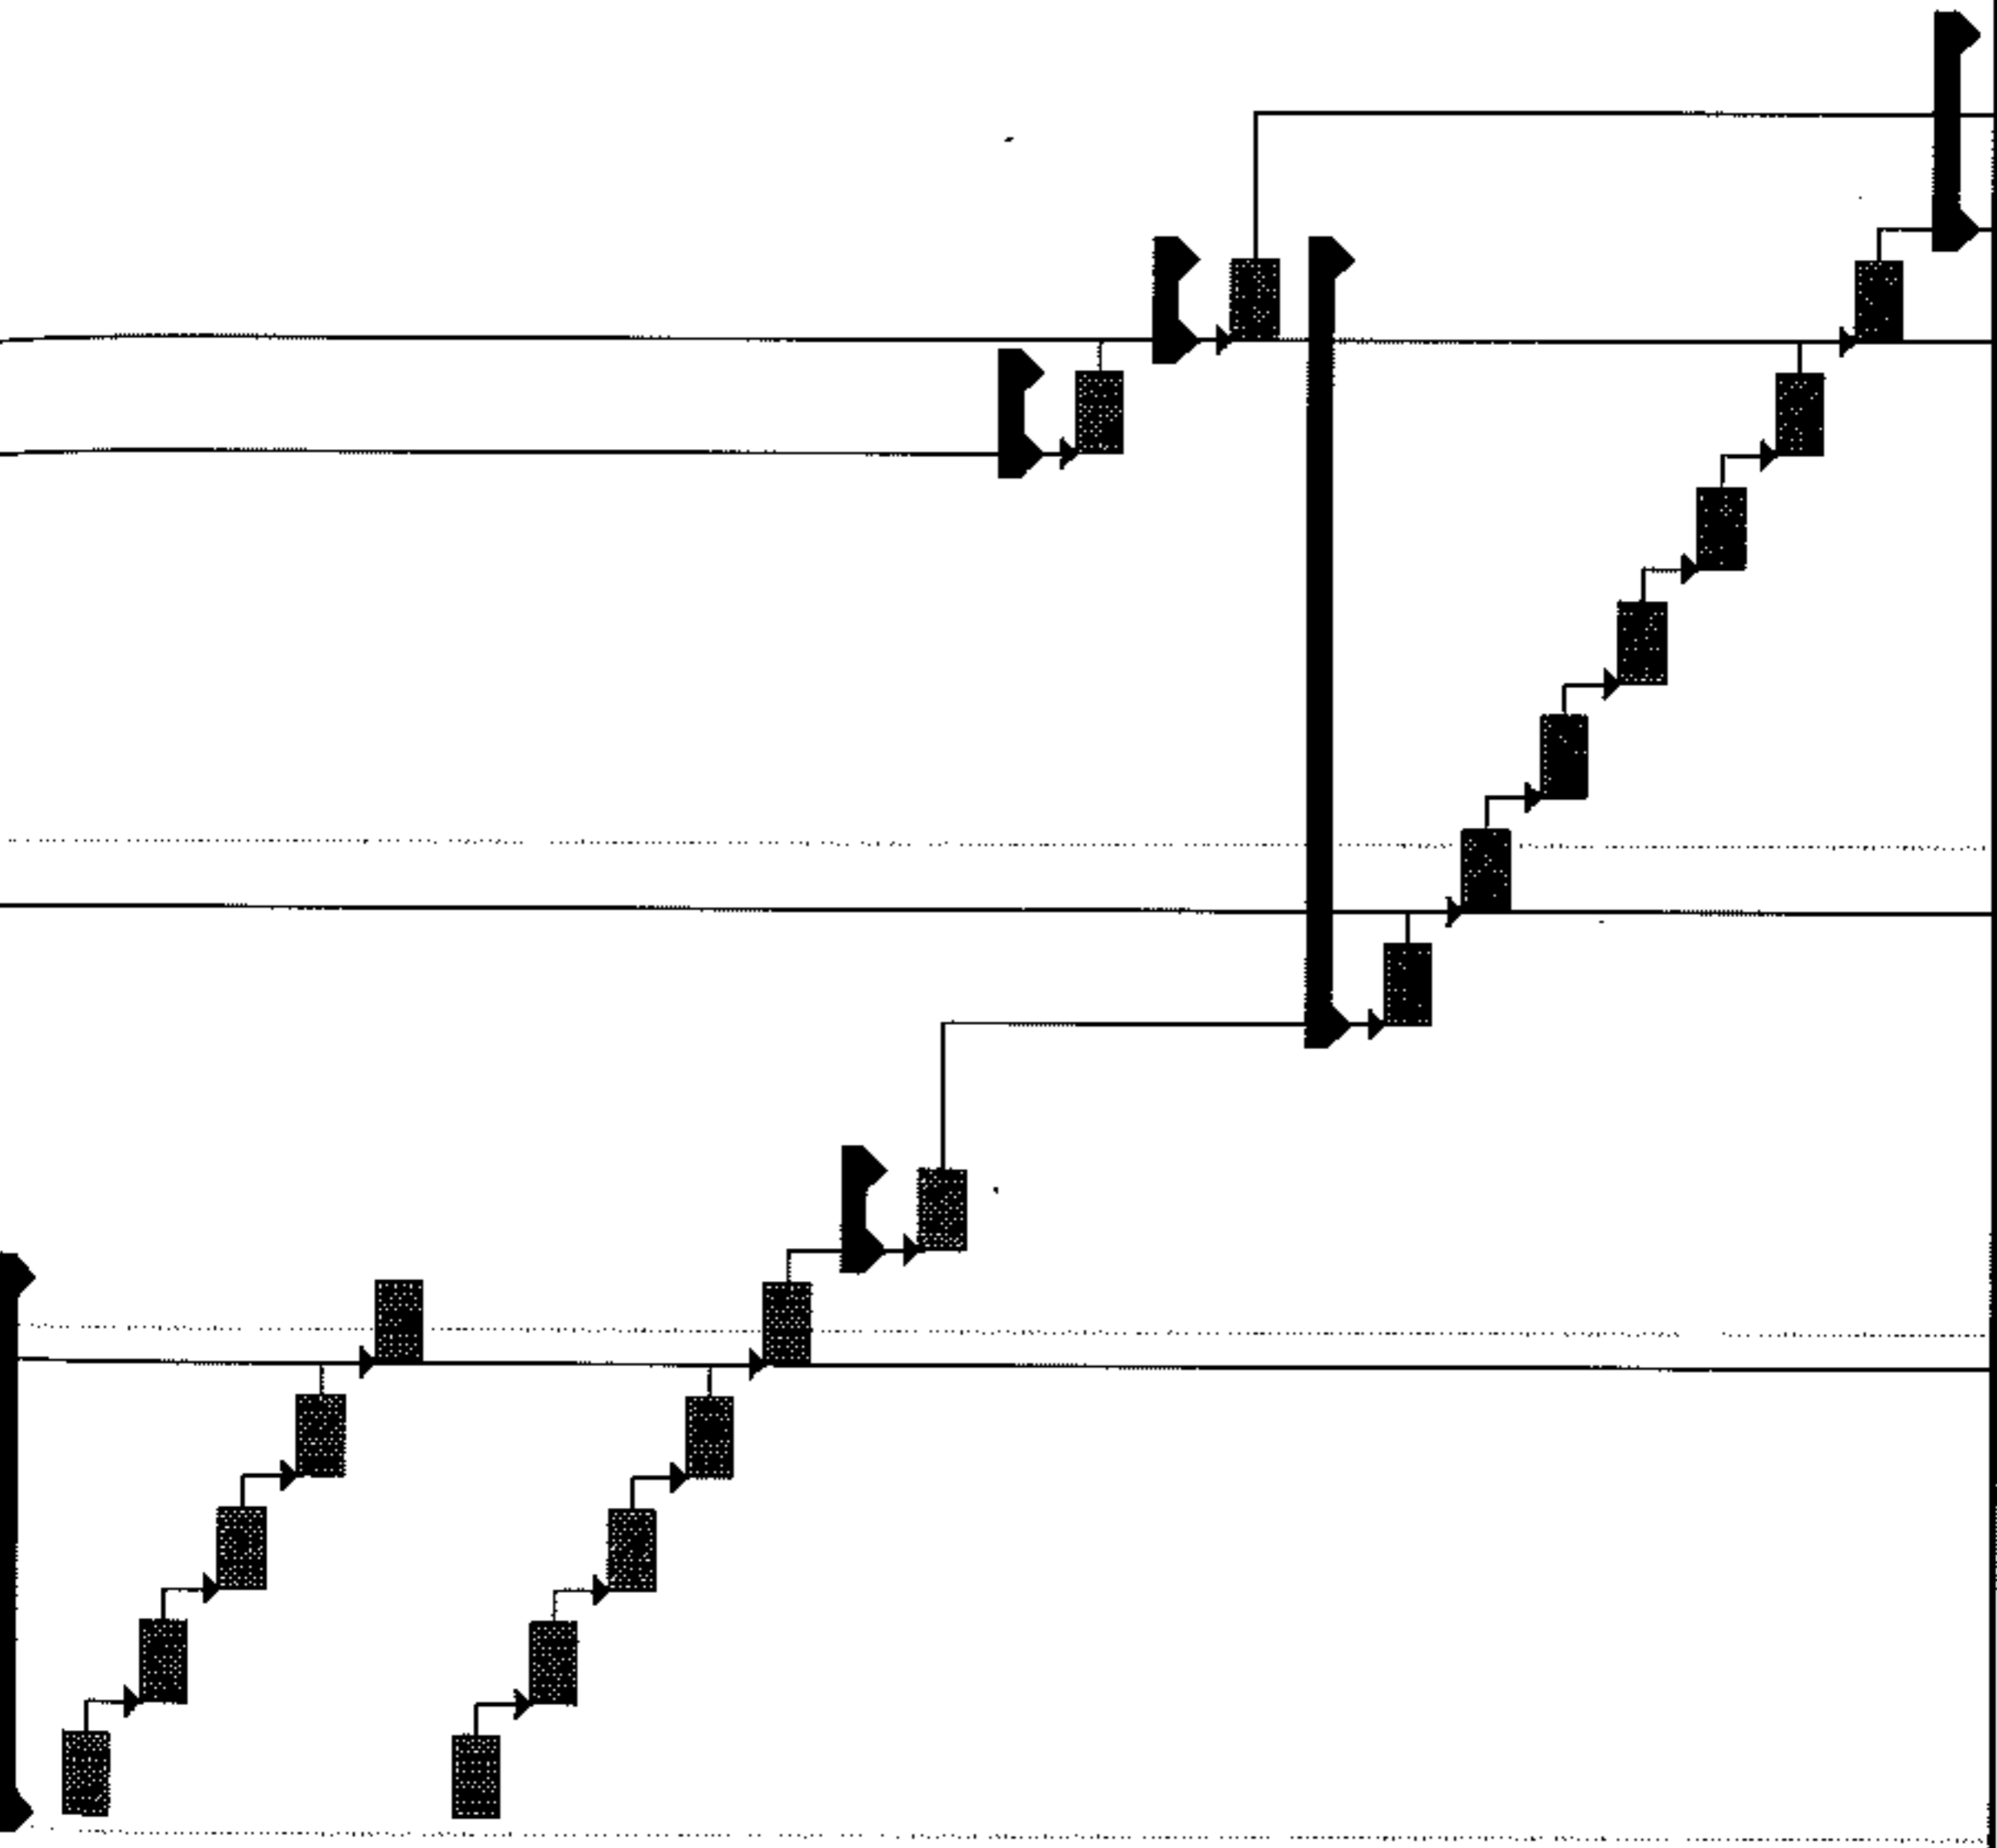


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

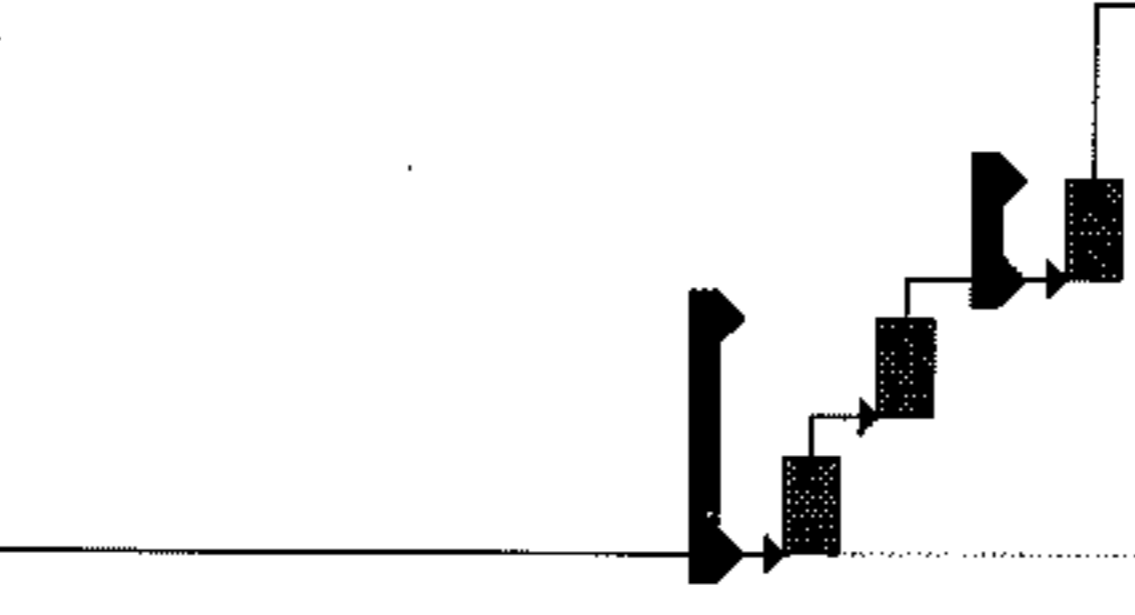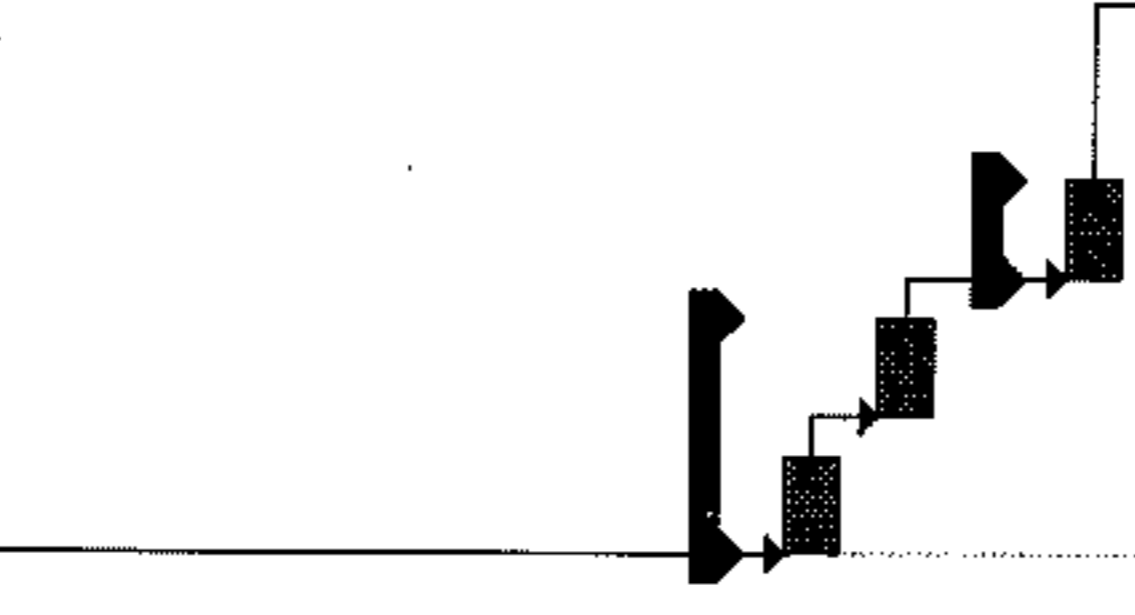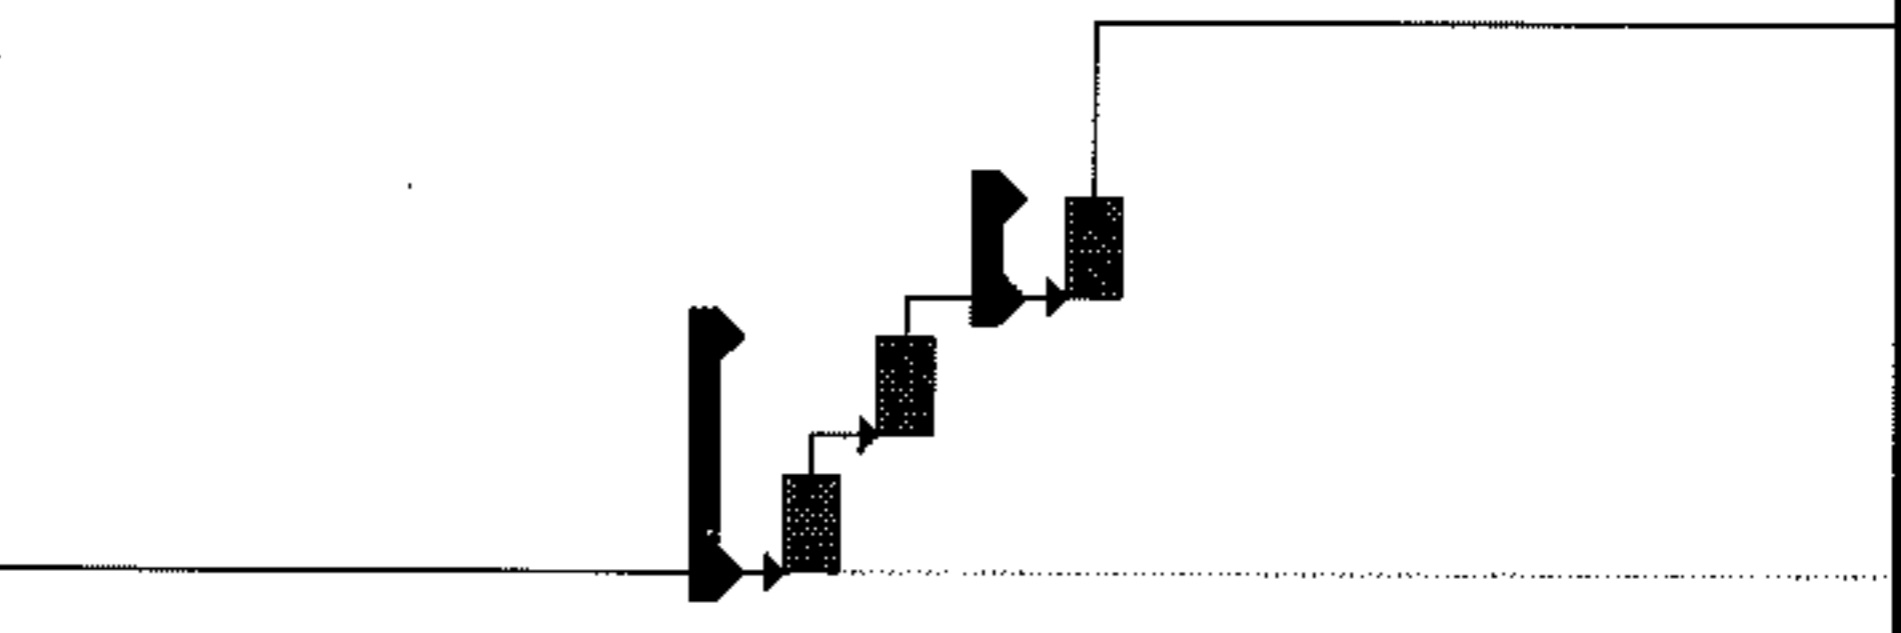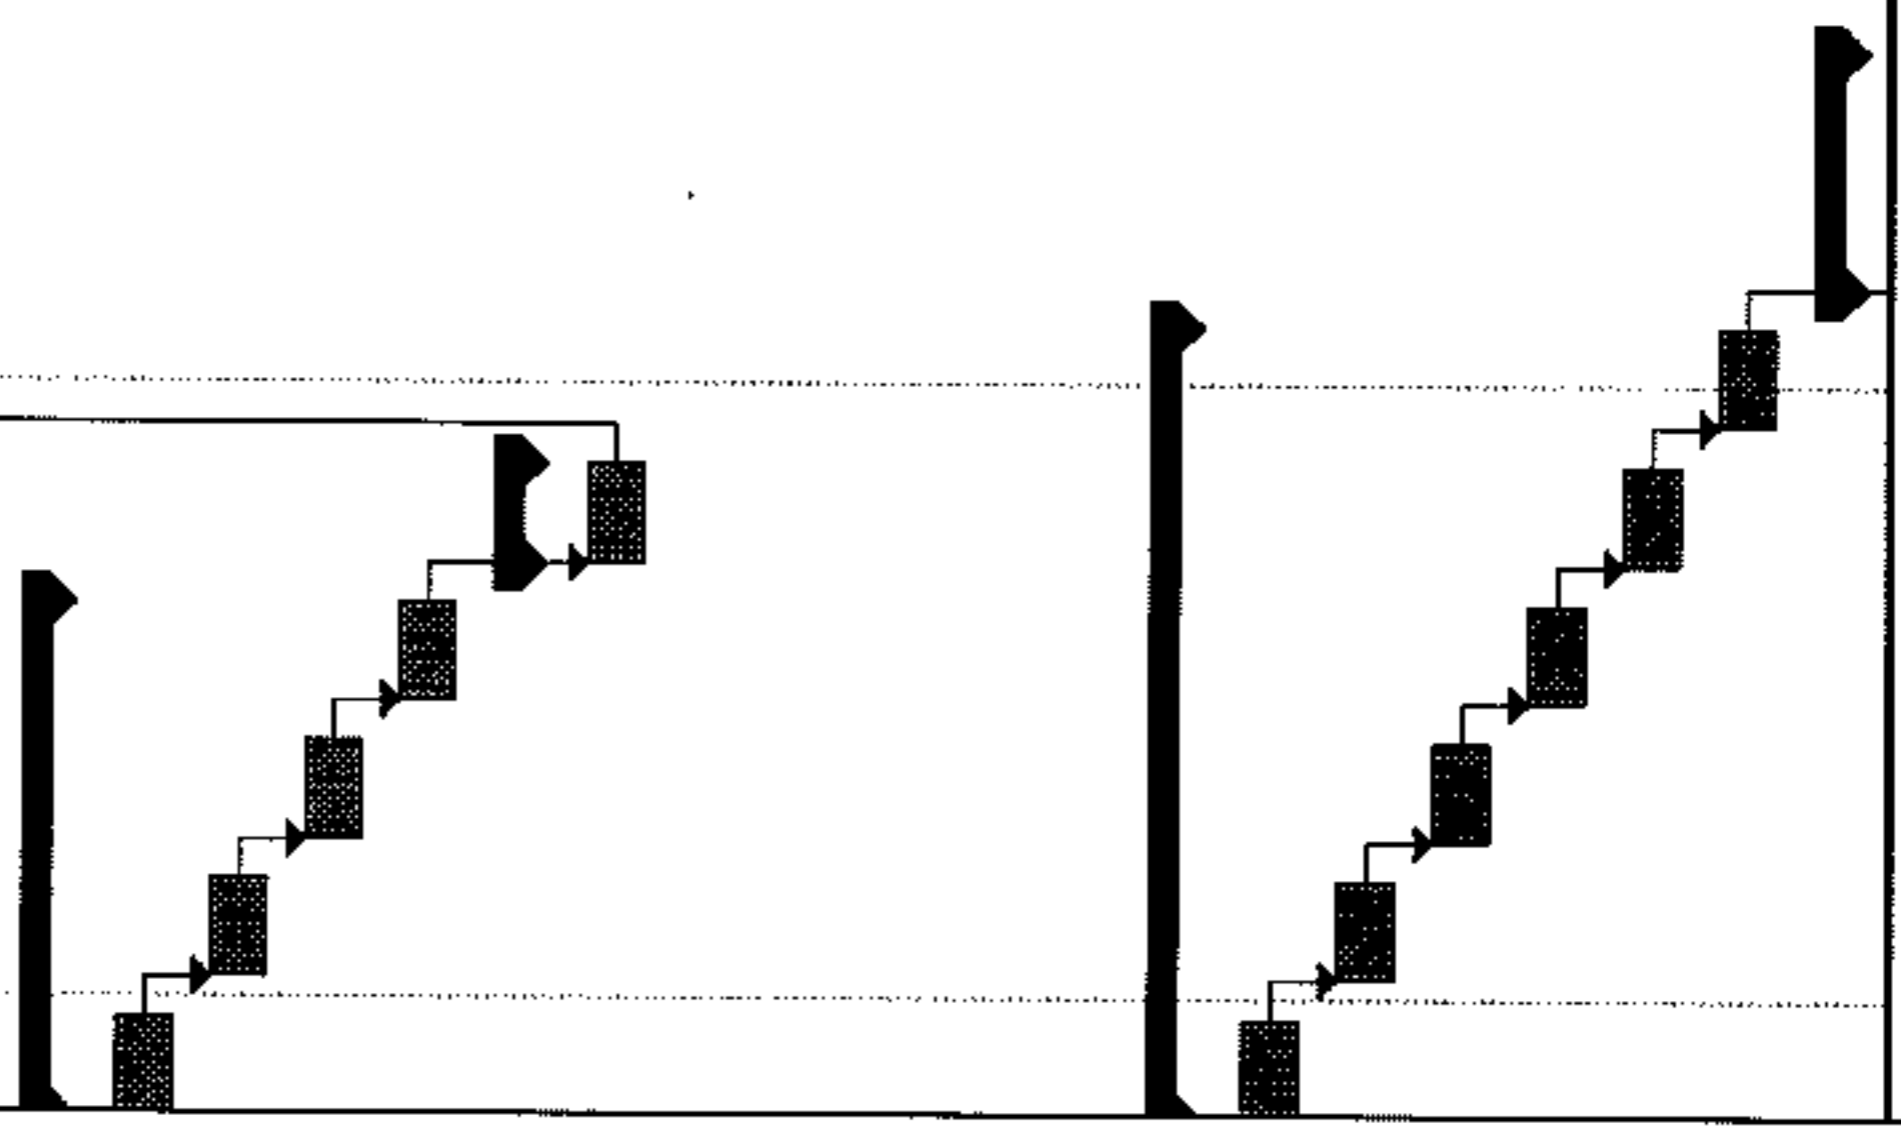





W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

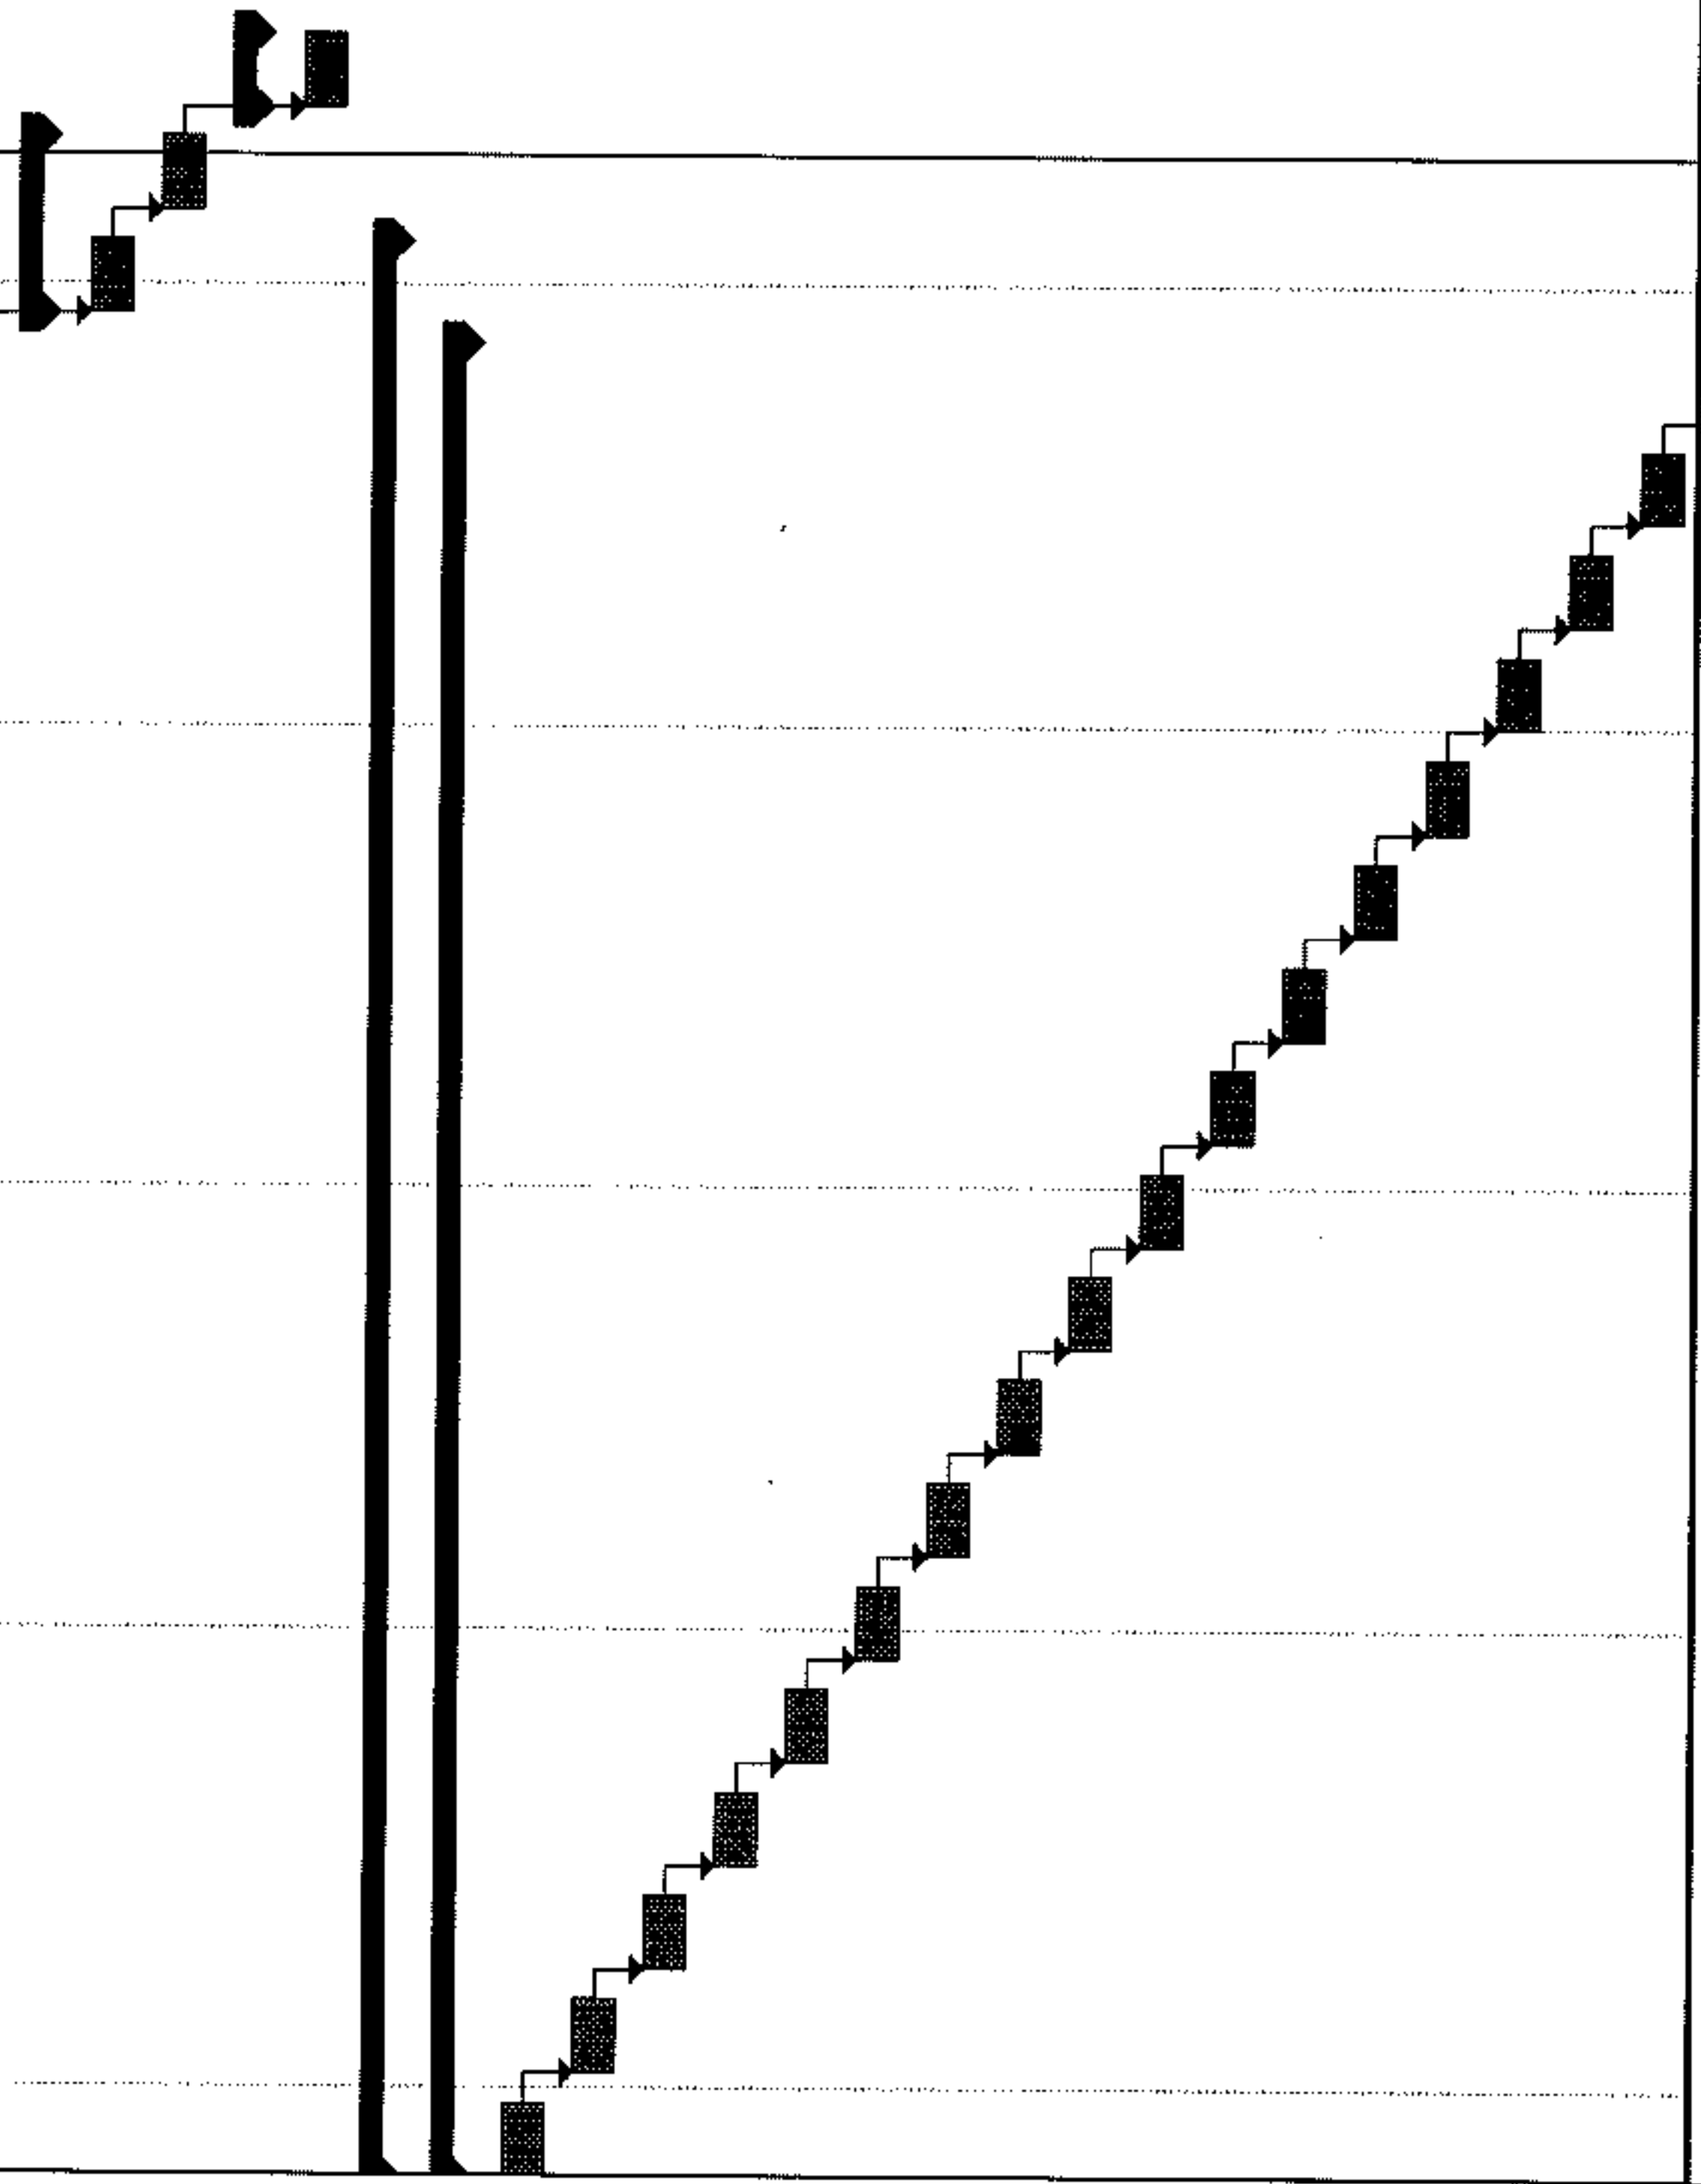


STAGE  
W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

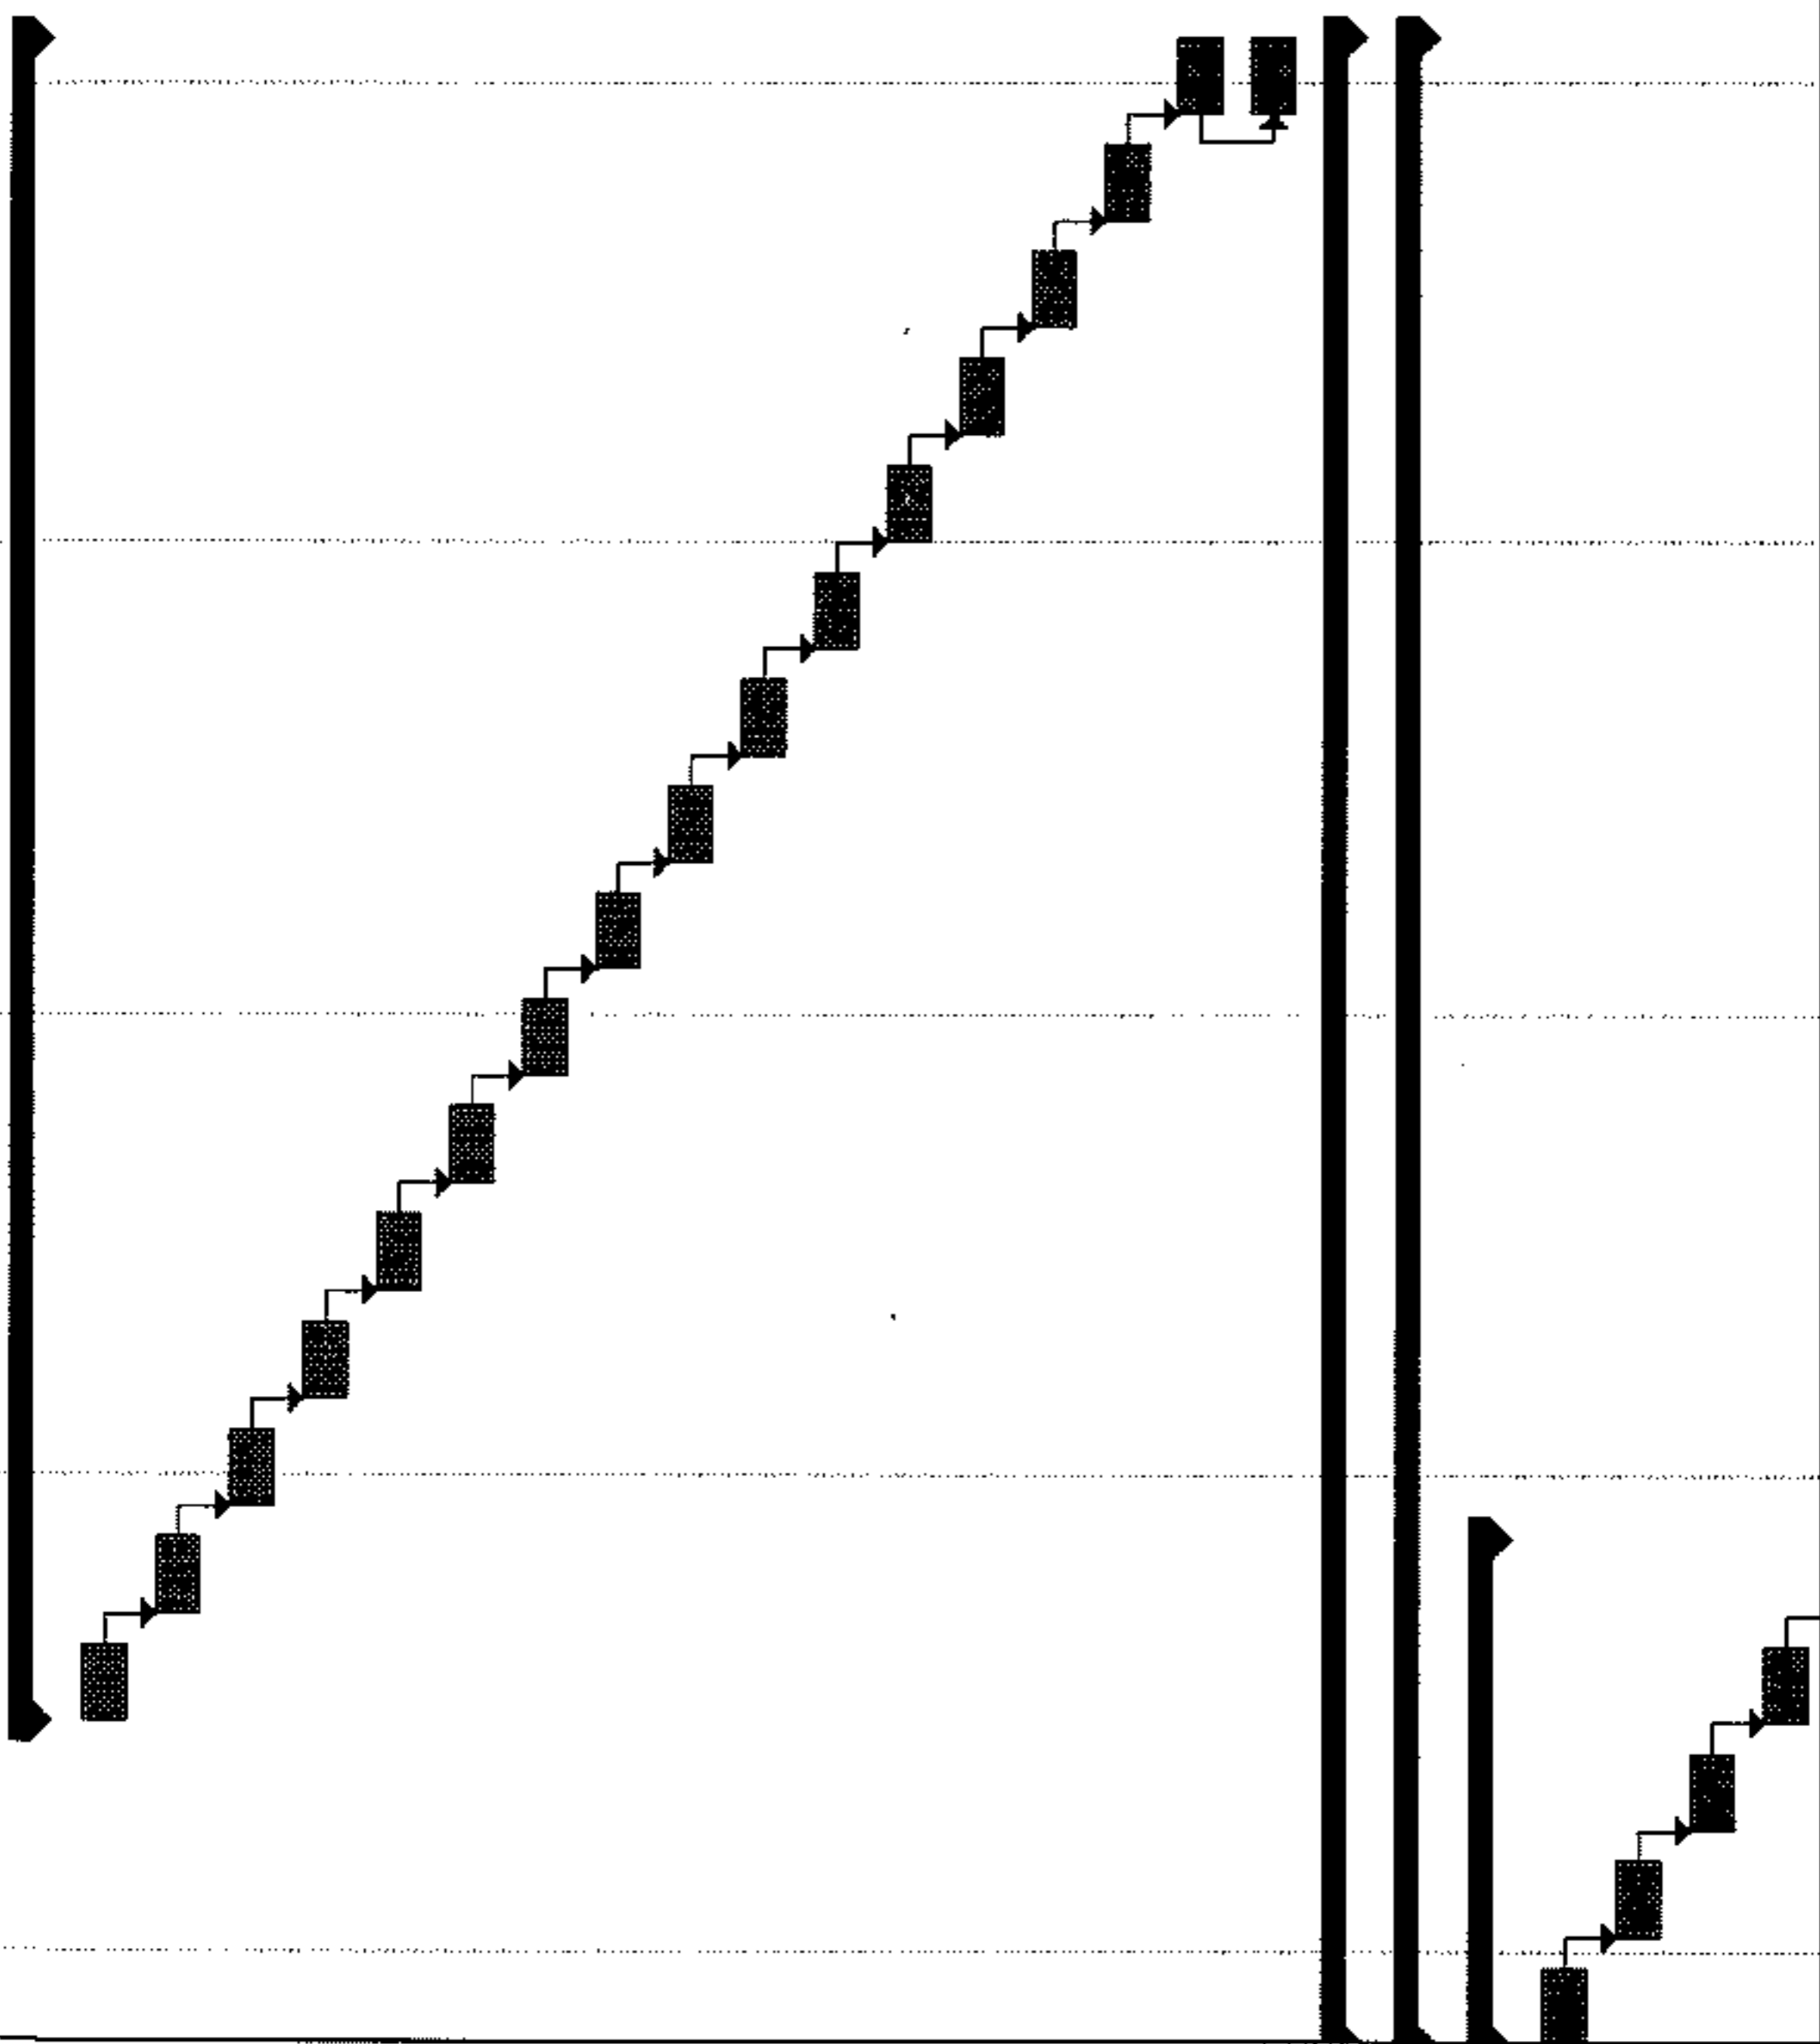

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

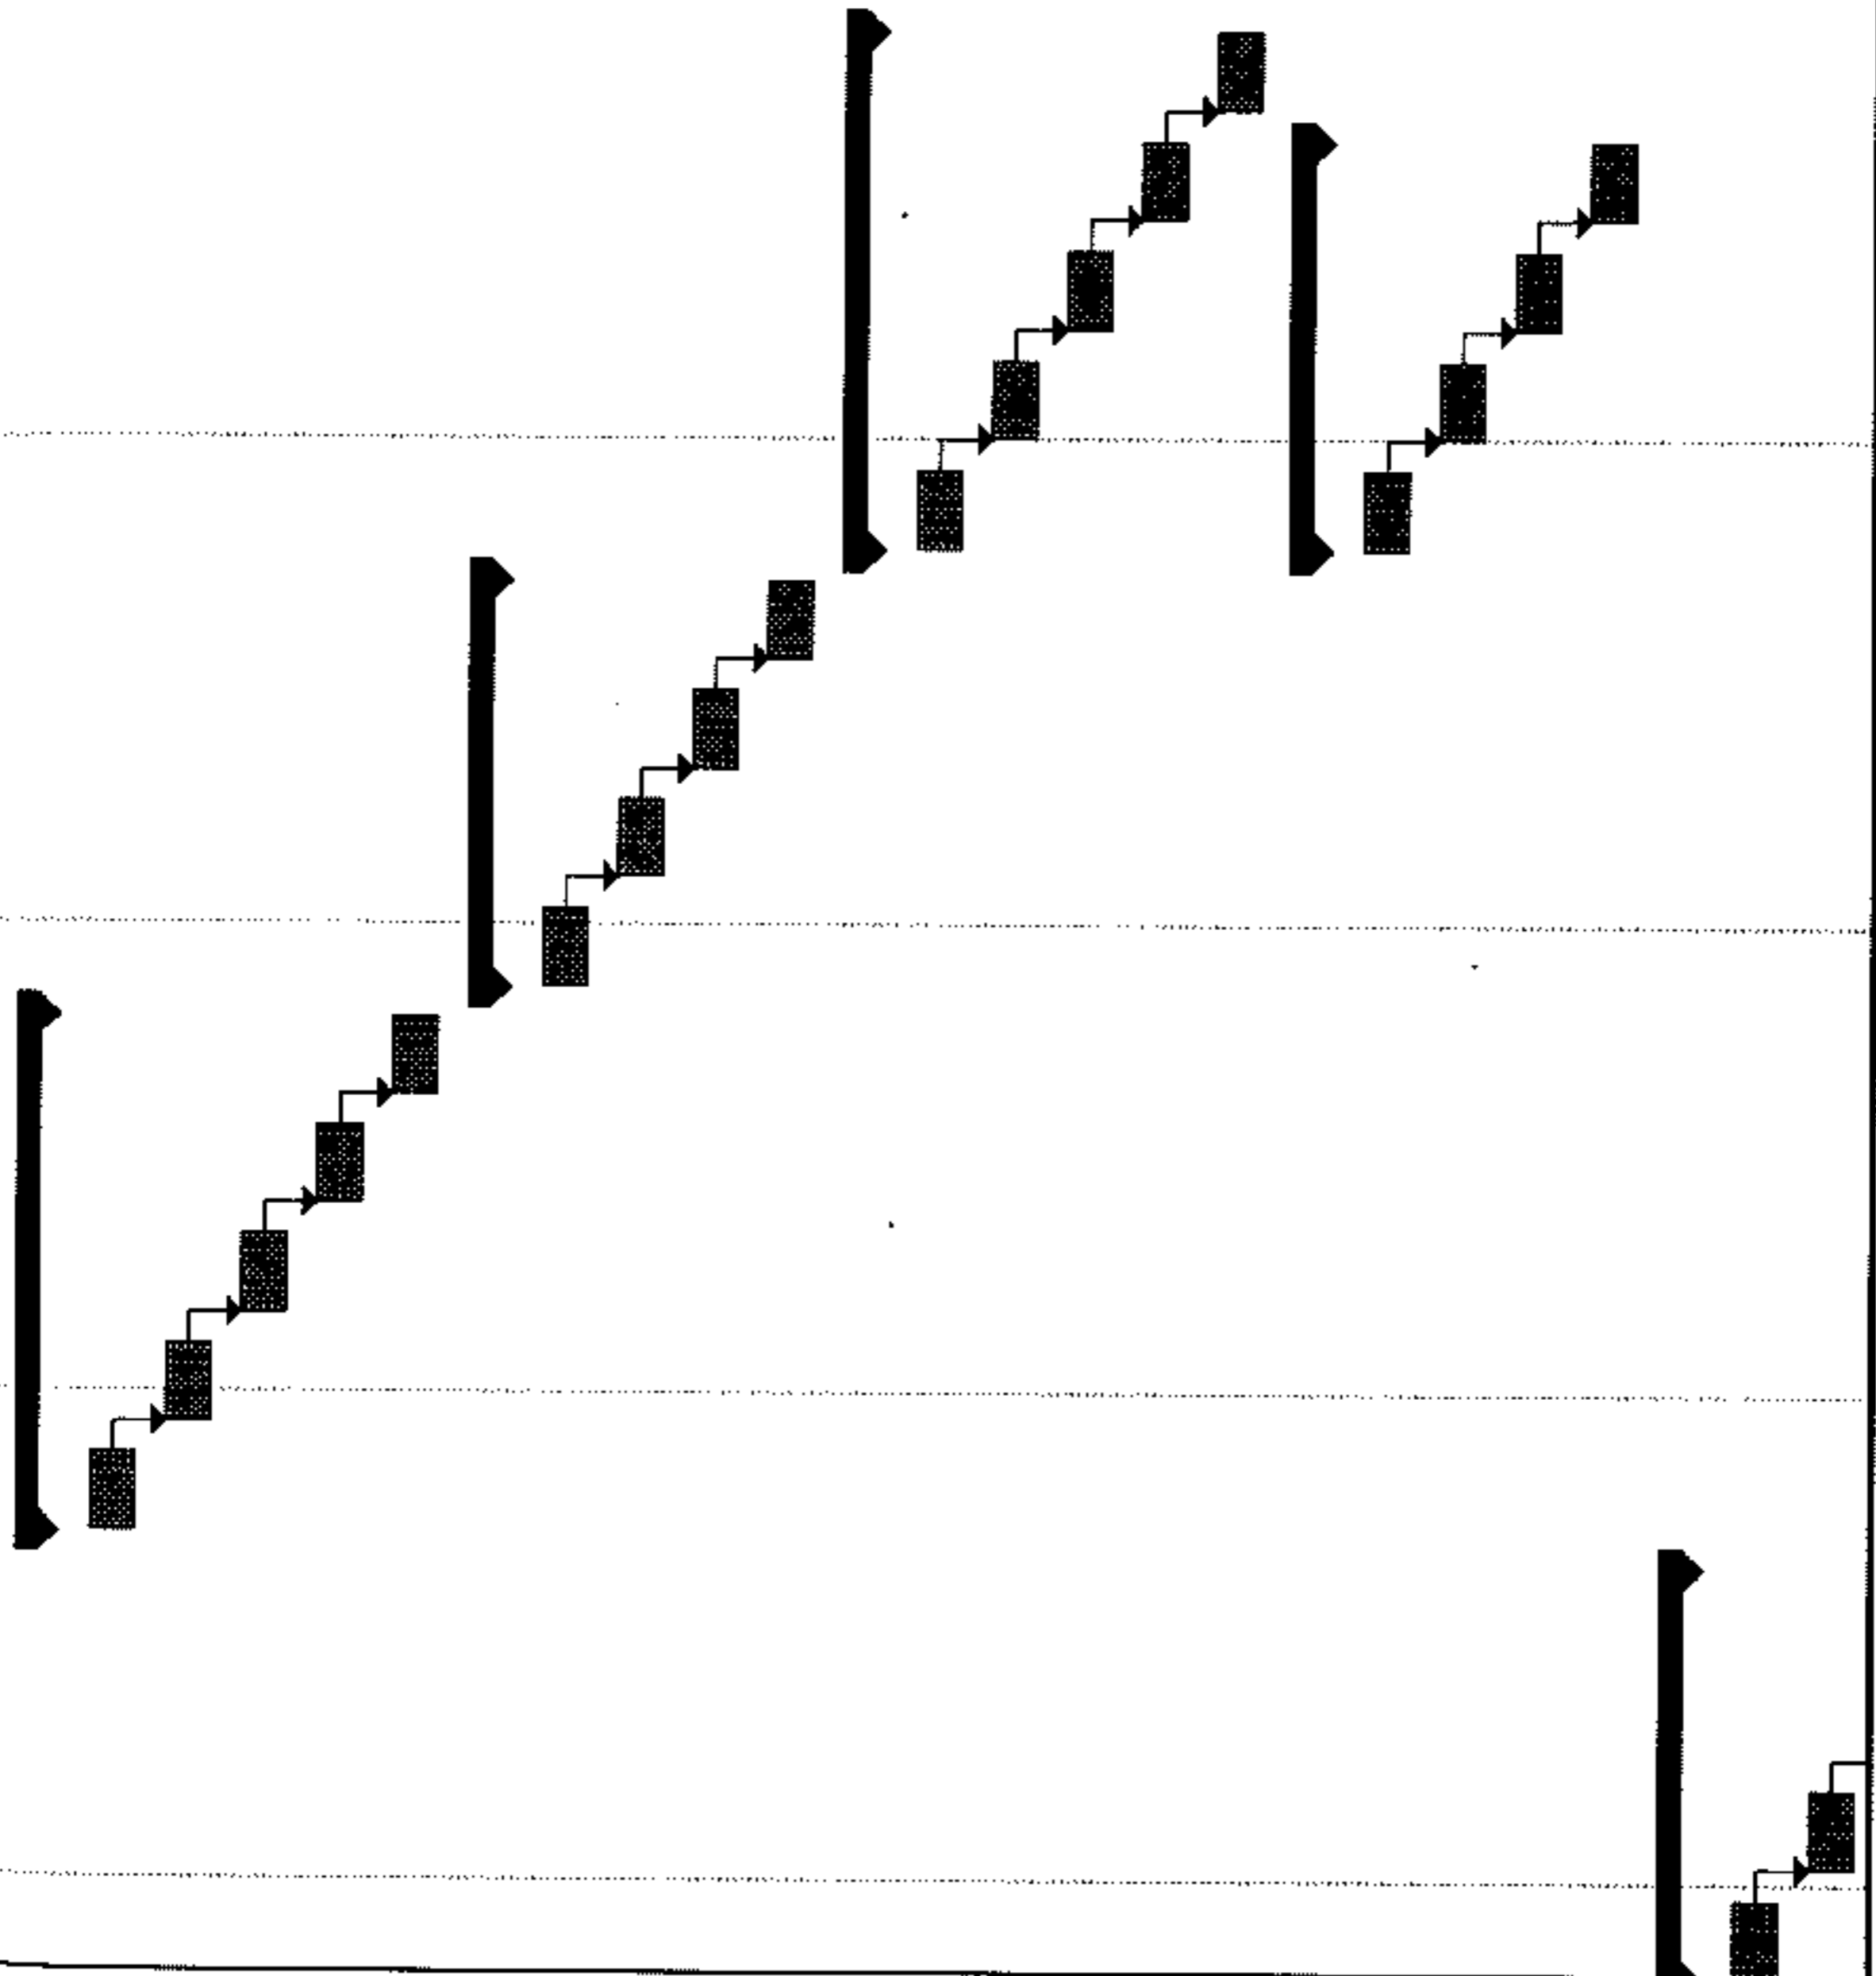


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

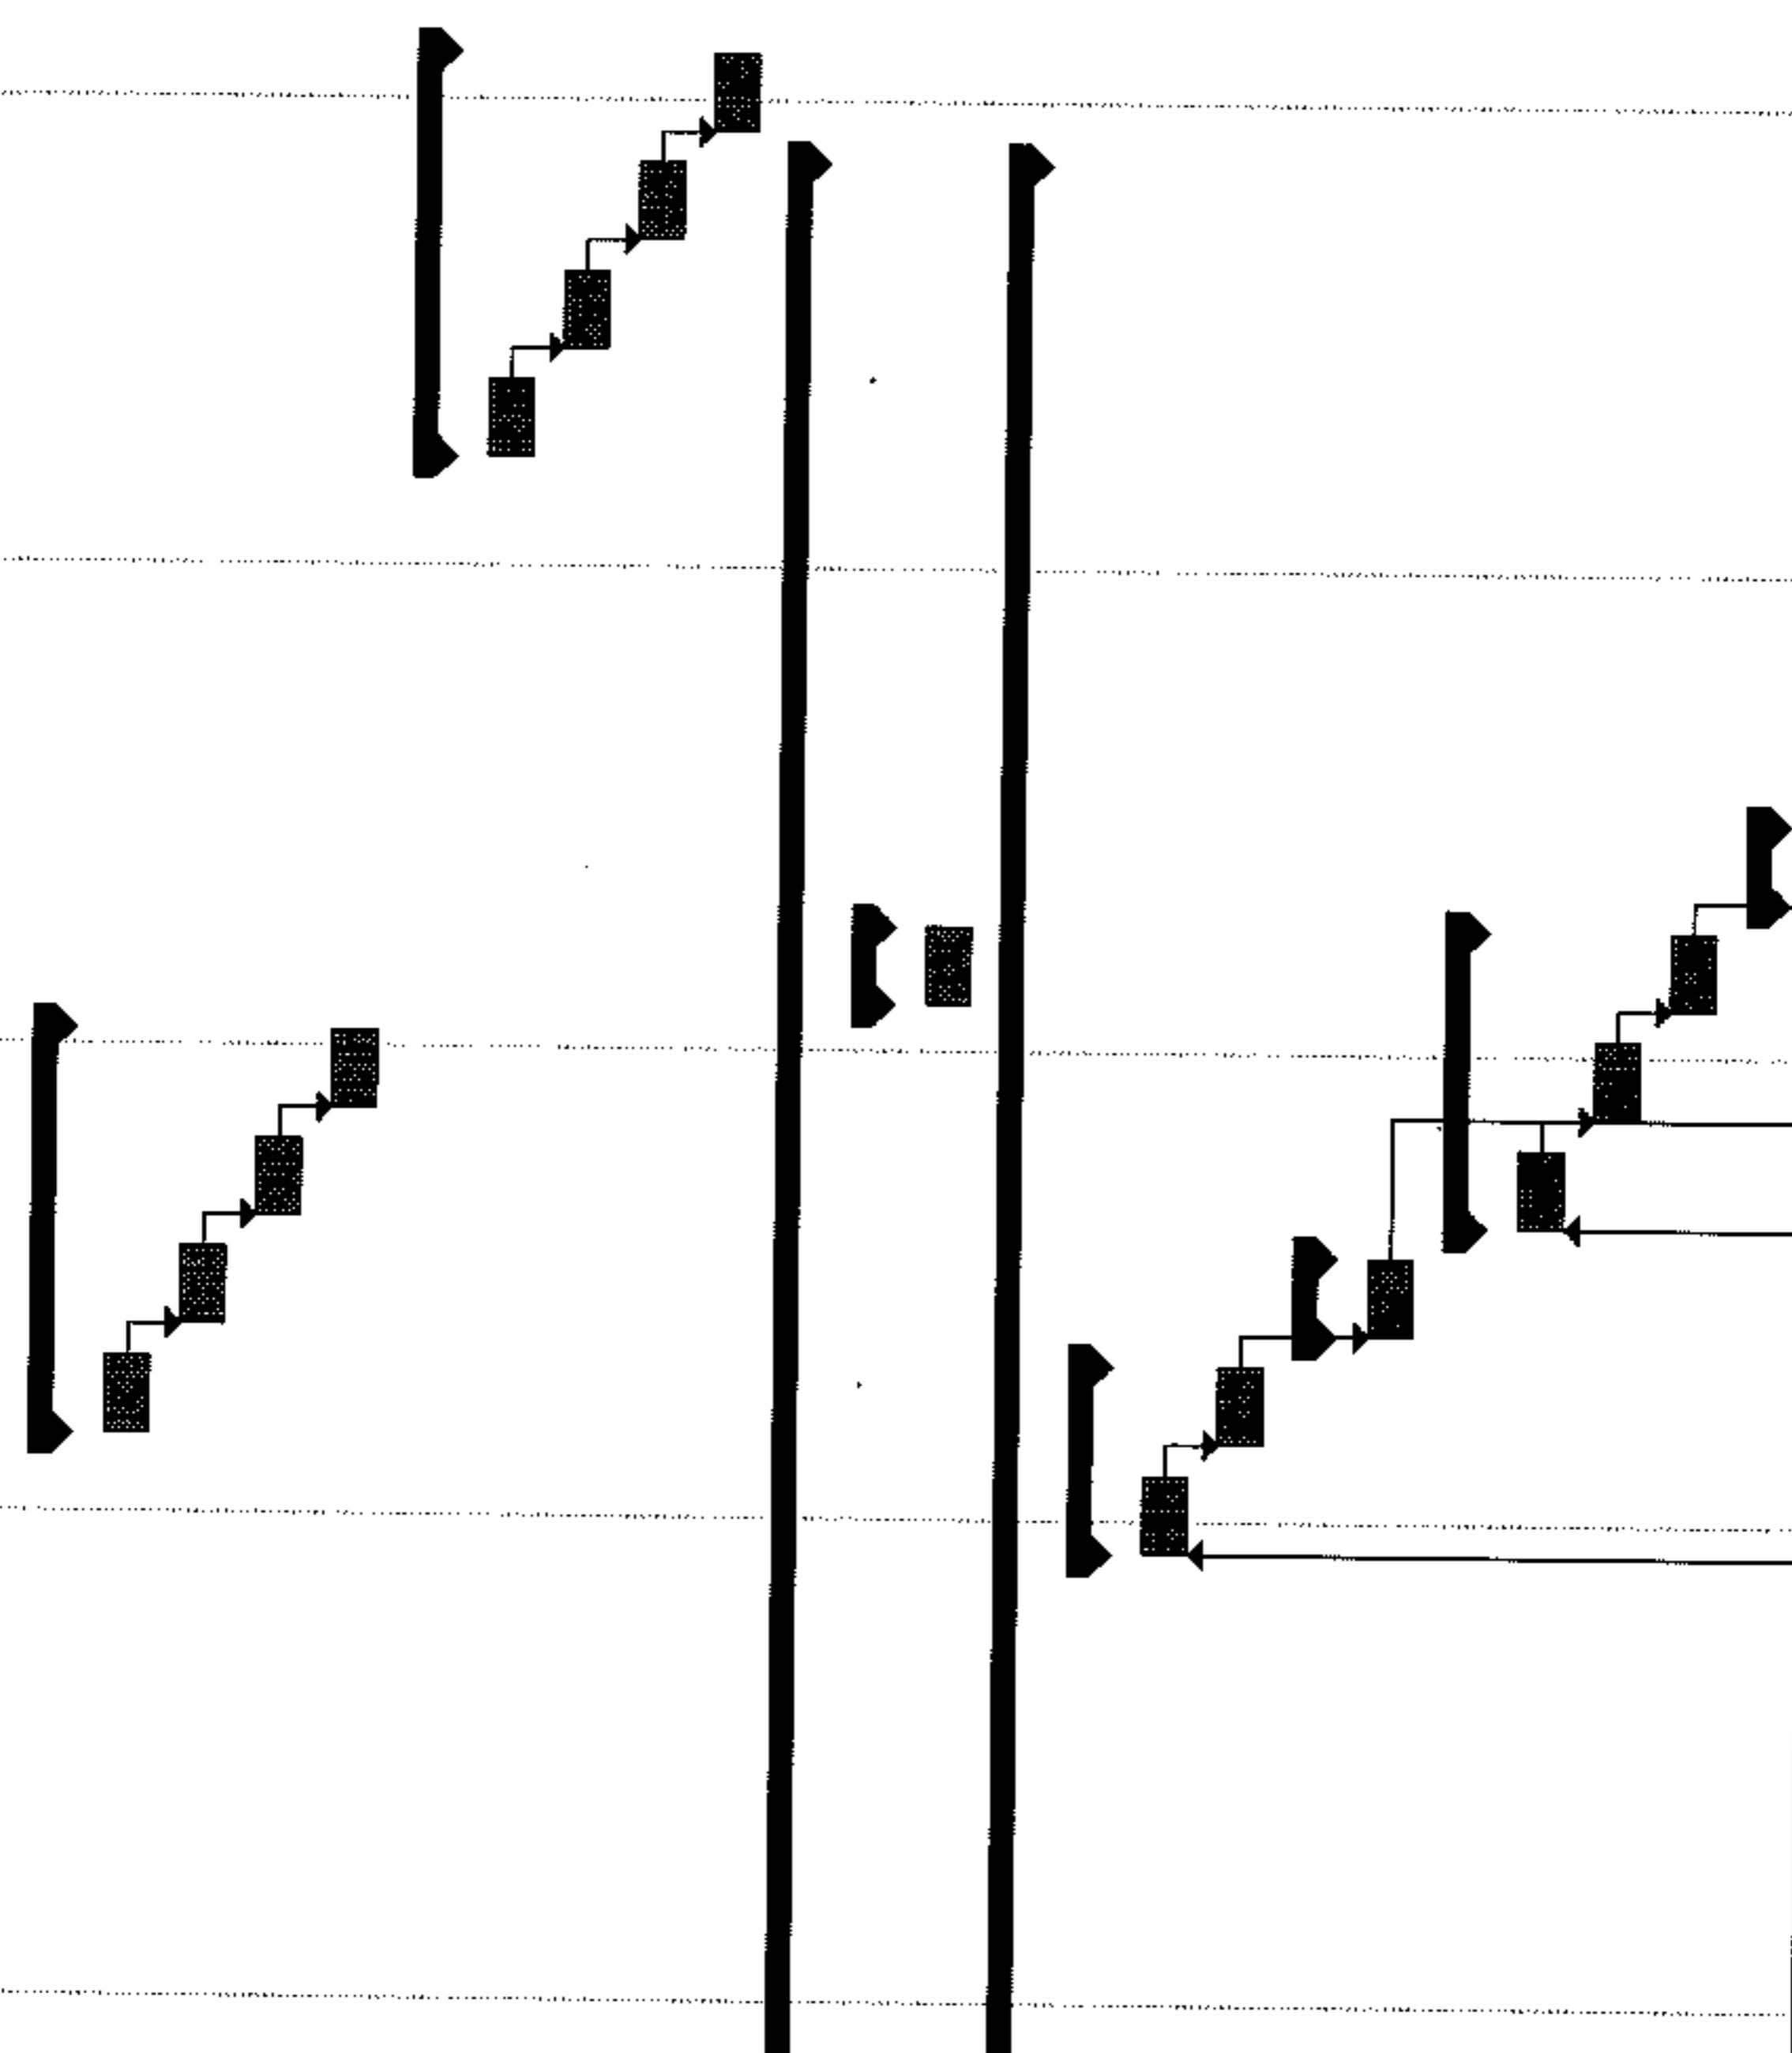


W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35




W35 W34 W33 W32 W31 W30 W29 W28 W27 W26 W25 W24 W23 W22 W21 W20 W19 W18 W17 W16 W15 W14 W13 W12 W11

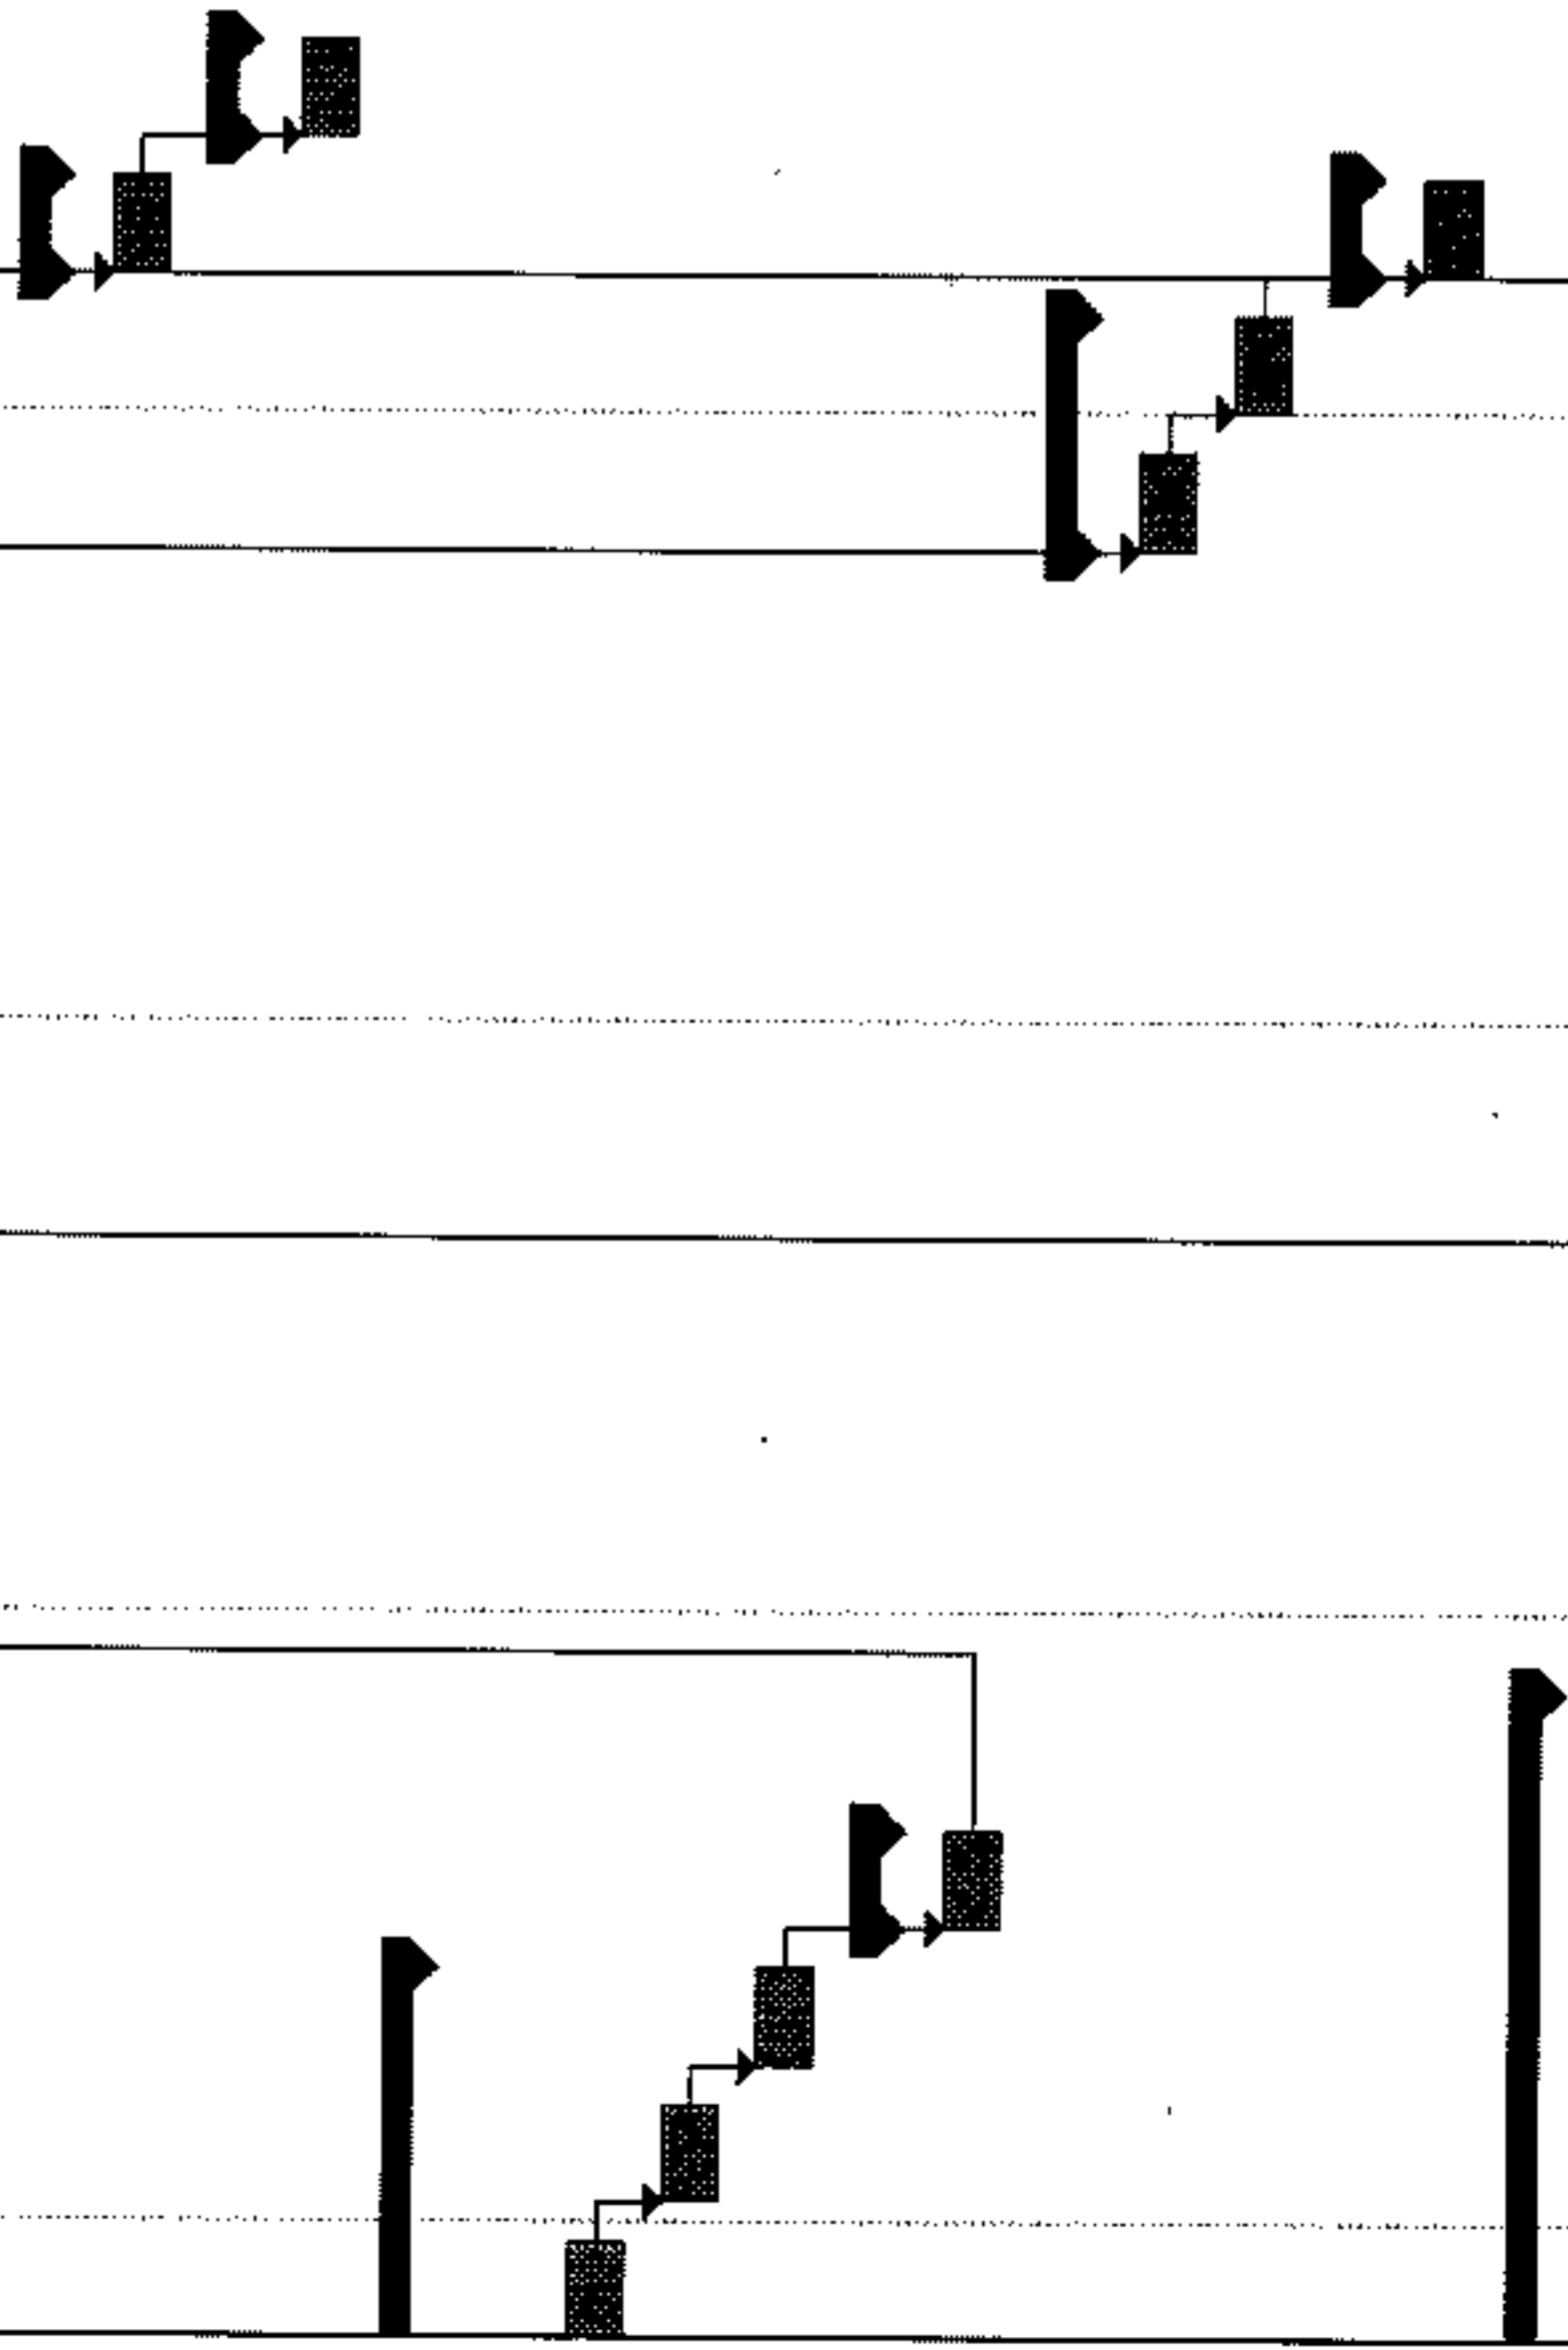

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

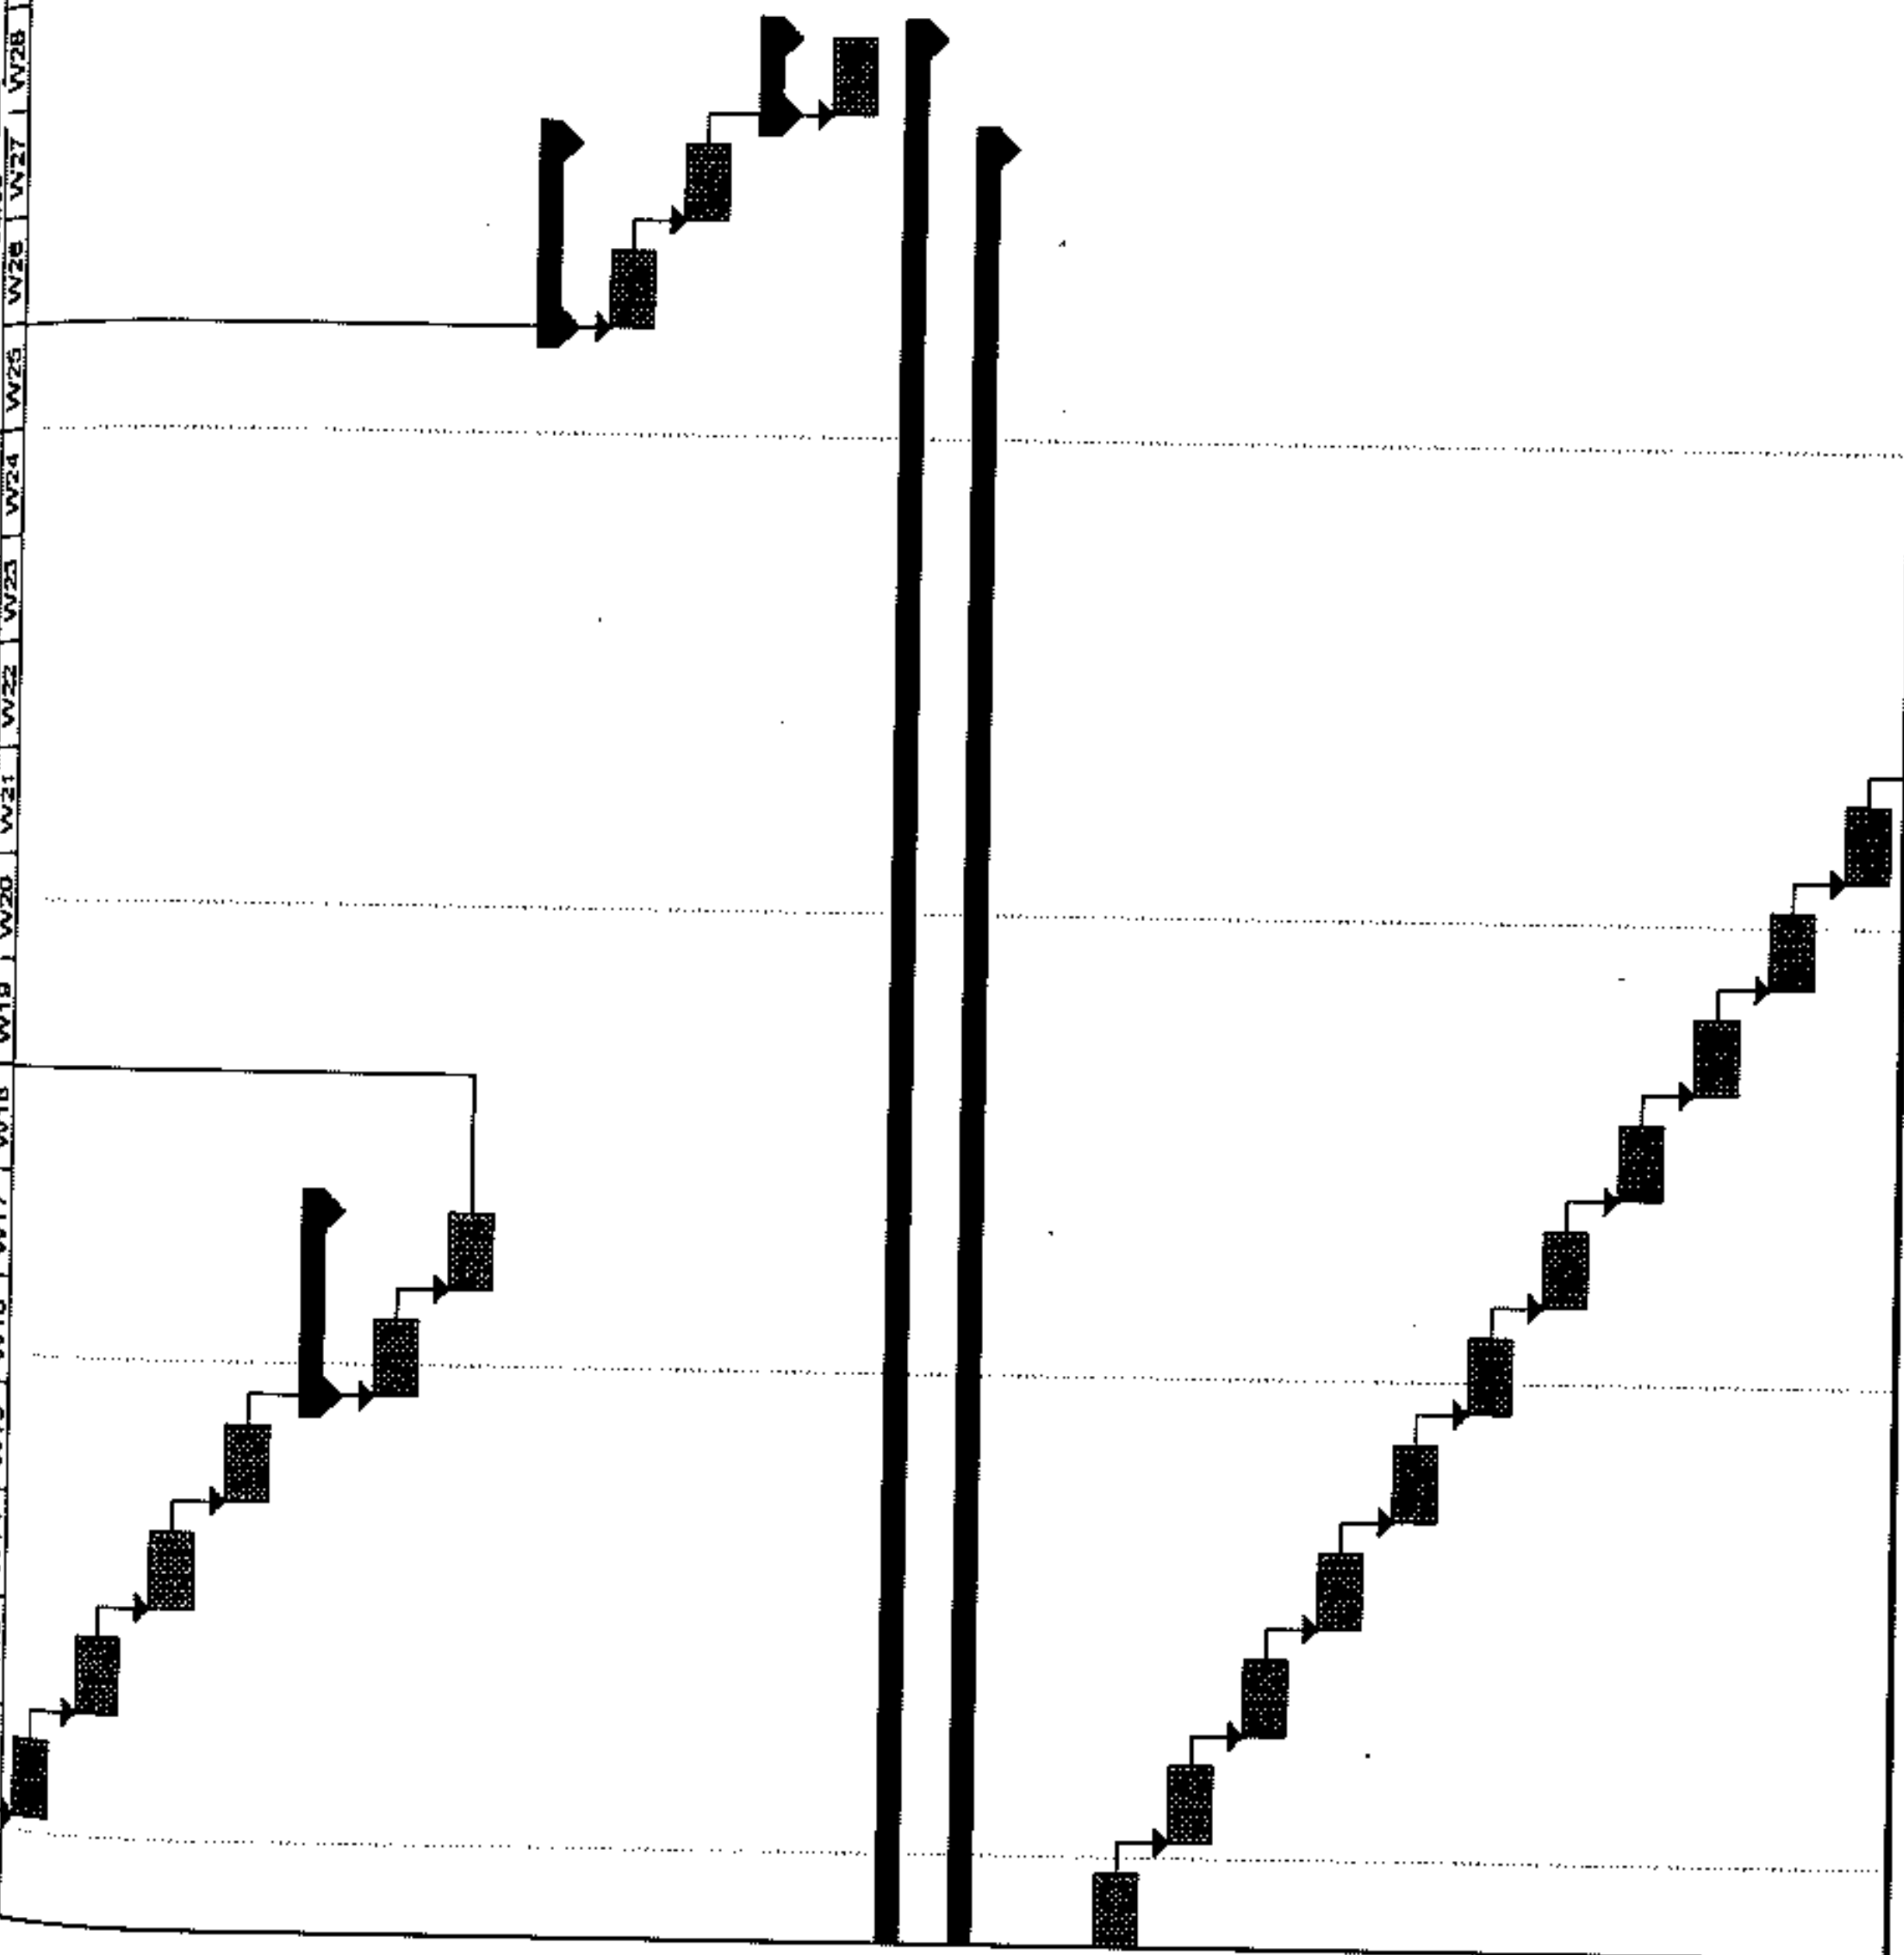

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35

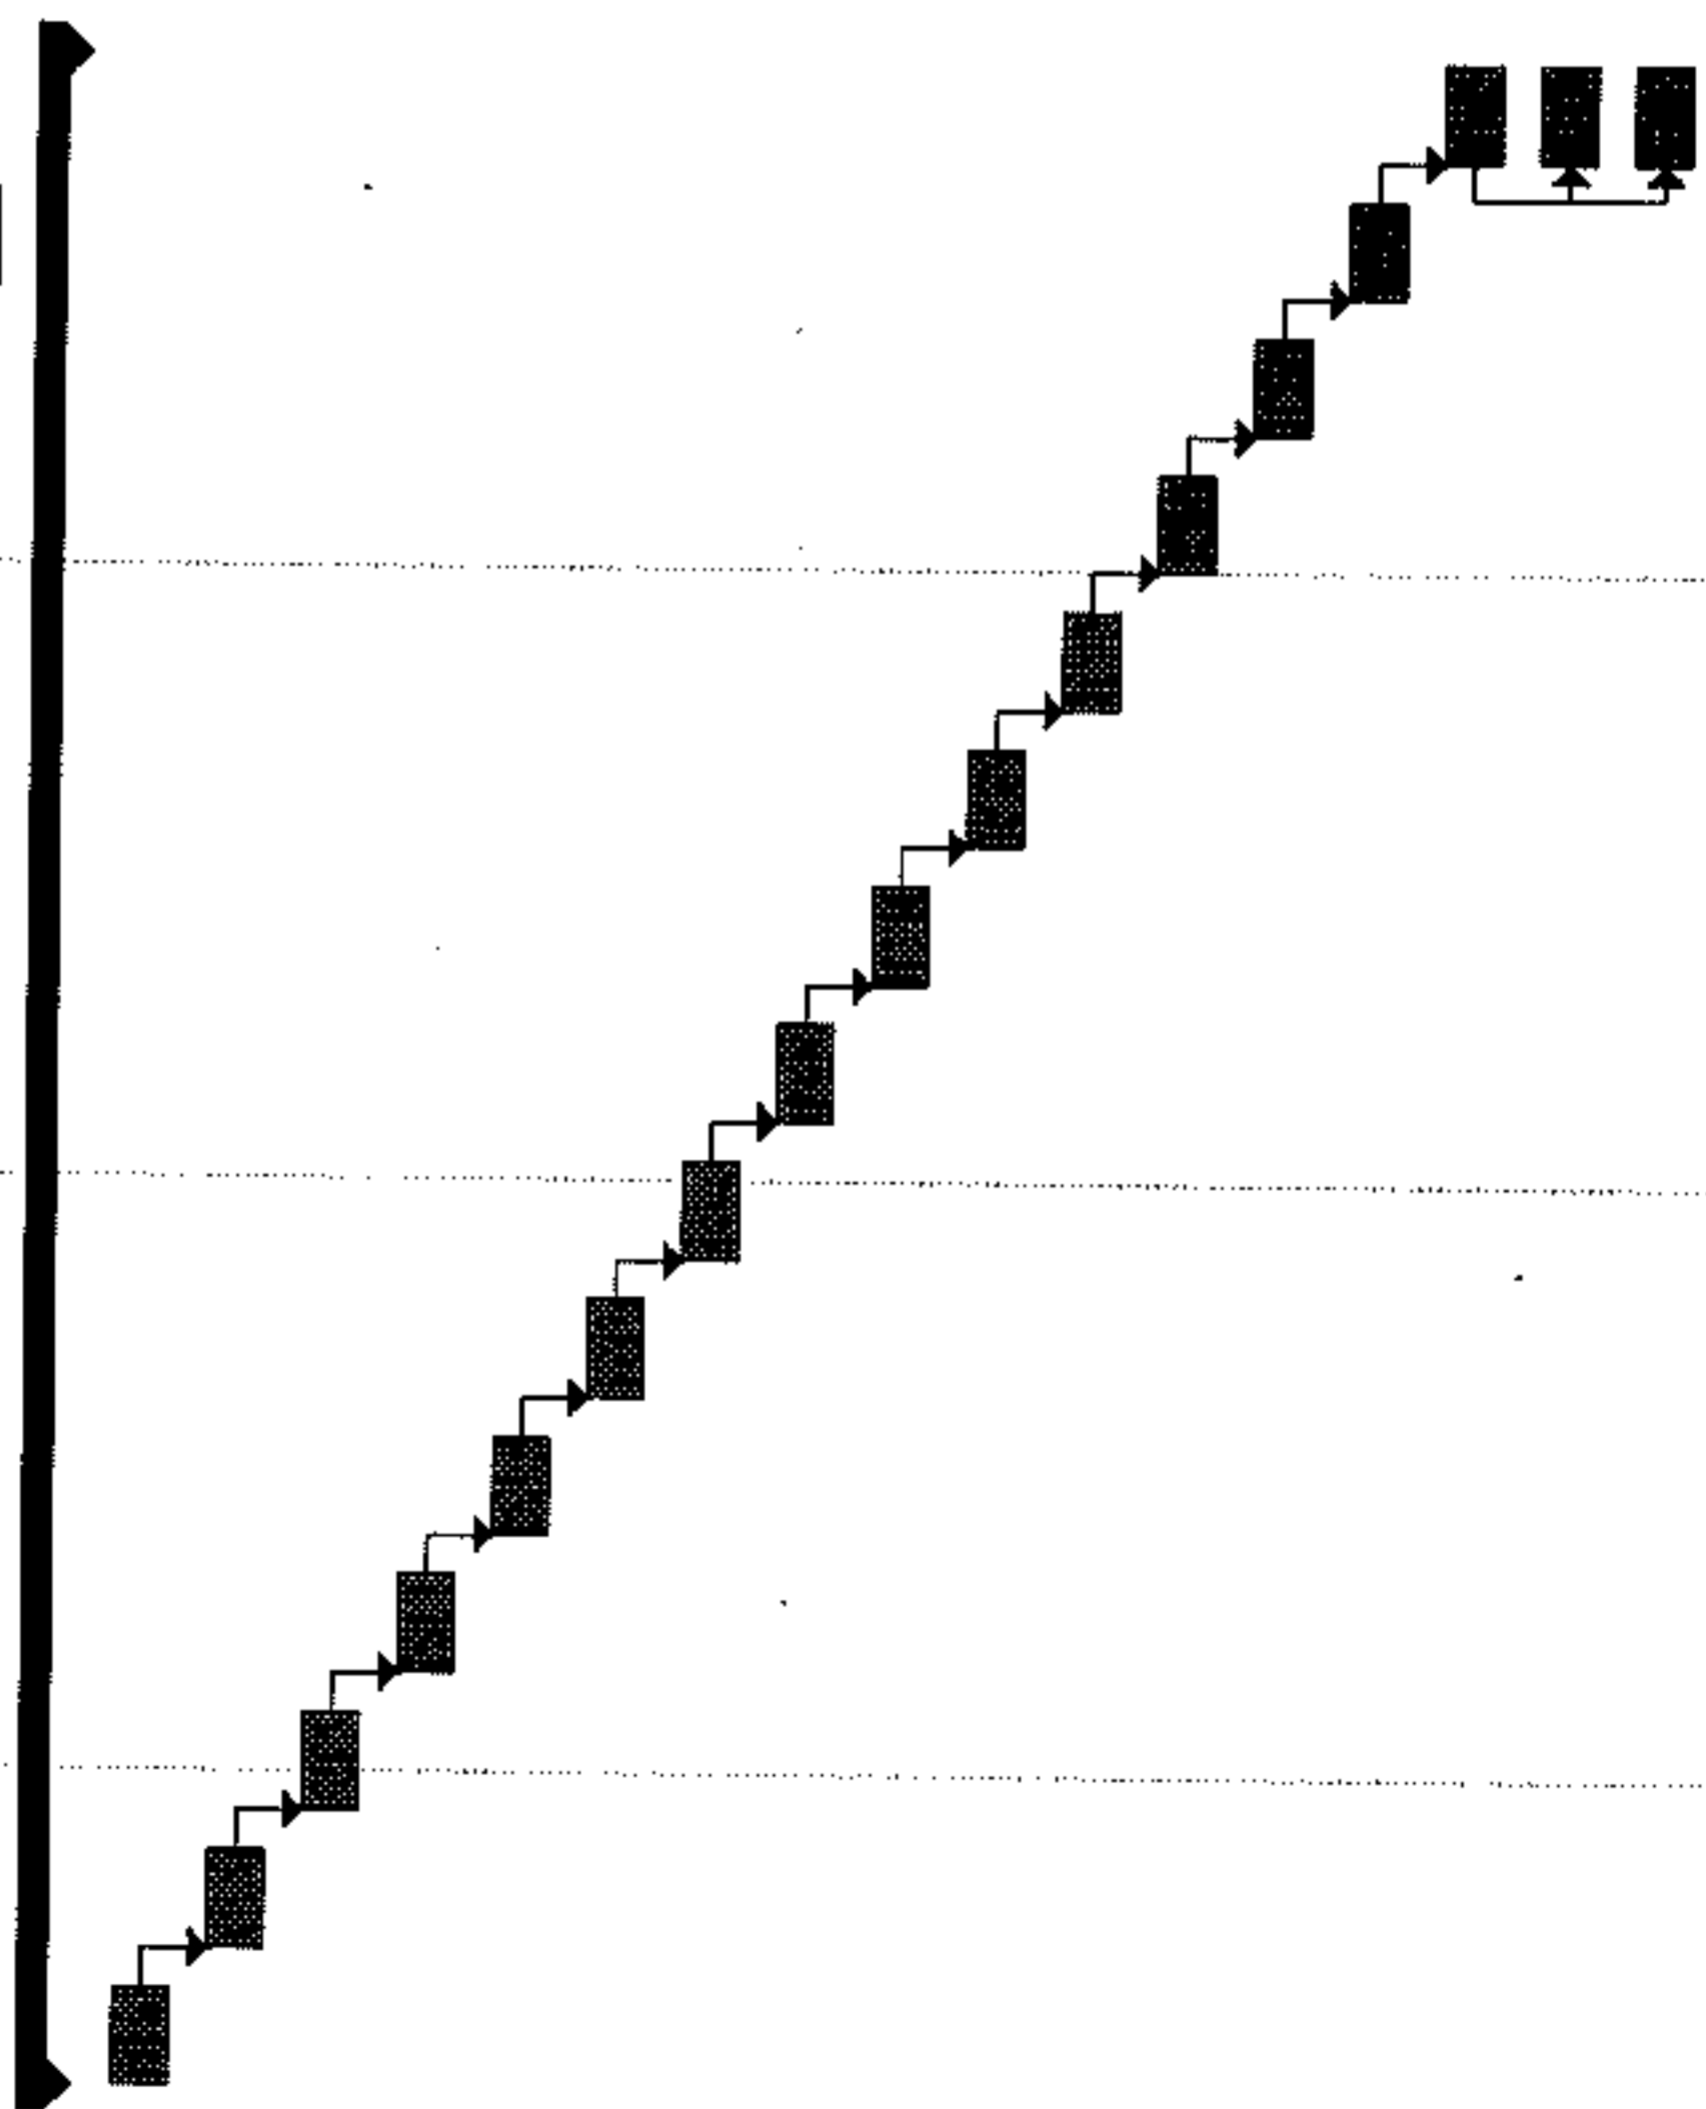



Project:  
Date: 26/12/97

Task



Summary



Progress



Rolled Up Task



Milestone



Rolled Up Milestone



Rolled Up Progress

